




T.C.
SIVAS
İL ÖZEL İDARESİ

20 FAALİYET 12 RAPORU

2012 YILI
FAALİYET RAPORU
İL GENEL MECLİSİ TOPLANTISI
MART 2013





**T.C.
SİVAS
İL ÖZEL İDARESİ**

20 12 FAALİYET RAPORU

AİT OLDUĞU DÖNEM
01.01.2012 - 31.12.2012

ADRES
Akdeğirmen Mah. M.Akif Ersoy Cad.

İLETİŞİM
Tel: (346) 223 01 16 - Faks: (346) 224 79 80

e-posta
sivas@sivasilozelidaresi.gov.tr

www.sivasilozelidaresi.gov.tr



Sunuş	1
I- GENEL BİLGİLER	2
A-Yetki Görev ve Sorumluluklar	3
B-Misyon , Vizyon, İlkeler, Değerler ve Politikalar	4
C-İl Genel Meclisi Faaliyetleri	8
İl Encümeni	10
BİMER	11
D-Özel İdare Bilgileri	13
1- Teşkilat Şeması	14
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	15
3- Bilişim Sistemleri	15
4- İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları	15
5- İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları	21
5-1.İl Özel İdaresine ait Gayrimenkuller	21
5-2. İl Özel İdaresi Makine Parkı	40
5-3. İştiraklerimiz	49
II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	50
A-MALİ BİLGİLER	51
B-PERFORMANS BİLGİLERİ	57
Sivas İl Özel İdaresinin Diğer Sektörler İçin Yaptığı 2012 Yılı Harcamaları.....	57
2- KIRSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI.....	58
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü.....	58
Merkez İlçe Faaliyetleri	69
Akıncılar İlçesi Faaliyetleri	71
Altınyayla İlçesi Faaliyetleri	71
Divriği İlçesi Faaliyetleri	72
Doğanşar İlçesi Faaliyetleri	73
Gemerek İlçesi Faaliyetleri	74
Gölova İlçesi Faaliyetleri	74
Gürün İlçesi Faaliyetleri	75
Hafik İlçesi Faaliyetleri	76
İmranlı İlçesi Faaliyetleri	77
Kangal İlçesi Faaliyetleri	78
Koyulhisar İlçesi Faaliyetleri	79
Suşehri İlçesi Faaliyetleri	80
Şarkışla İlçesi Faaliyetleri	81

Ulaş İlçesi Faaliyetleri	82
Yıldızeli İlçesi Faaliyetleri	83
Zara İlçesi Faaliyetleri	84
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü.....	87
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü.....	99
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri Müdürlüğü.....	105
HİZMET MÜDÜRLÜKLERİMİZ	119
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	119
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	131
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.....	134
Hukuk Muşavirliği	135
Bilgi İşlem Müdürlüğü	136
2012 Yılı Köydes Yatırım Projeleri.....	139
III-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	144
A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR	145
IV-ÖNERİ VE TEDBİRLER	146
A-ÖNERİLER B-TEDBİRLER	146
V-GÜVENCE BEYANLARI	147
Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı	148
Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı	149
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı	150



SUNUŞ

Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Yeni yapılanma sürecinde performans esaslı bütçeleme sistemi, kamu idarelerinin ana fonksiyonları ve bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin, belirlenmesini, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini, kullanılmasını, performans ölçümü yapılarak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşp, ulaşılmadığının değerlendirilmesi ve sonuçlarının raporlanması amaçlanmaktadır. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları performans programı, stratejik plan ve faaliyet raporudur.

Faaliyet raporu, genel anlamda idarenin harcama yetkisi verdiği ve ödenek kullandığı harcama yetkililerine ait faaliyetlerin bileşkesi olarak mali tablolar ve performans ölçütlerini, idarenin geleceğe dönük öngörülerini ortaya koyan ve 2012 yılı için faaliyet analizi yapan, hem de İl Özel İdaresinin mevcut durumu ile ileriye yönelik hizmet kalitesi ve alanını daha da artıracak konulara da yer veren önemli bir çalışmadır.

Sivas İl Özel İdaresinin 2012 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar ve yürüttüğü projeler hakkındaki bilgilerin kamuoyuna duyurulması İl Özel İdaresinin daha iyi tanıtılması ve kamu sektöründeki rolünün daha iyi kavranması açısından da yararlı olacaktır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 41. Maddesine uygun olarak hazırlanan hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlama noktasında önemli bir role sahip olan hedeflere ulaşmada, etkinlik, verimlilik ve ölçülebilirlik esaslarına göre hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporunun başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere, bu raporun hazırlanmasında ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen birim yöneticileri ve personelimize teşekkür eder, bu çalışmanın gelecek yıllara da ışık tutmasını temenni ederim.

Zübeyir KEMELEK
Vali

I- GENEL BİLGİLER

A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B.Misyon, Vizyon, İlkeler, Değerler ve Politikalar

C.İl Genel Meclisi Çalışmaları

D.İdareye İlişkin Bilgiler

1. Organizasyon Şeması

2. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

3. Bilişim Sistemi

4. İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları

5. İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları

I- GENEL BİLGİLER

A- İL ÖZEL İDERESİNİN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, İl Özel İdaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl Özel İdaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o İlin Valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.”

Anılan Kanunun 7. maddesinde de İl Özel İdaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

- b)** Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 - c)** Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 - d)** Borç almak ve bağış kabul etmek.
 - e)** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 - f)** Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
 - g)** Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
- İl Özel İdaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- İl Özel İdaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
- İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.”

B-İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU, VİZYONU İLKELERİ DEĞERLERİ VE POLİTİKALARI

Misyonumuz

Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içinde; hizmetlerin belli bir plan dahilinde ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak Sivas’ı Kültür ve Bilim Merkezi, Üreten, Yaşam kalitesinin arttığı, İç Anadolu Bölgesinin cazibe merkezi olan yeşil bir il yapmak, **Sivas İl Özel İdaresinin Misyonudur.**

Vizyonumuz

Sivas’ta yaşayan insanların, çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuştuğu, hizmetlerin daha süratli, kaliteli ve ekonomik olarak yerine getirilebildiği, sürekli gelişen ve değişen bir yönetim anlayışı ile kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişmesini tamamlamış Sivas’ı dünyada tanınan, bölgesinde cazibe merkezi olan bir il yapmak **Sivas İl Özel İdaresinin Vizyonudur.**

Temel İlke ve Değerlerimiz

Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve desteklenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalmak, kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uymak, kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen göstermek, İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik vermek, kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlamak, İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımların desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık vermek, kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliştirmek **Sivas İl Özel İdaresinin temel ilke ve değerlerini oluşturmaktadır.**

Temel Politikamız

—**Eğitim Hizmetlerinde;** ikili ve taşınmaz eğitim en aza indirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, yurt ve pansiyonların yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, kentsel alanlarda sıkışan ve yetersiz hale gelen okulların yeni alanlara taşınması, eğitimin kalitesini arttırıcı ve ilin ülke genelindeki başarı düzeyini yükseltecek projeler, eğitim kurumlarının depremlere dayanıklılığı, okullaşma oranlarının yükseltilmesi, çağın gereklerine uygun yeni okulların yapılması, eğitimde teknoloji kullanım düzeyinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

—**Sağlık Hizmetlerinde;** koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, bu amaçla sağlık ocaklarının arttırılması, mevcut sağlık ocaklarının fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi, tıbbi donanım yönünden güçlendirilmesi, mobil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hastanelerin modernizasyonu, sağlık hizmetlerini etkili, kaliteli verimli kılacak her türlü uygulama projesi, teknoloji düzeyini arttıracak araç-gereç ve donanım alımları, desteklenecektir.

—**Sosyal Hizmetlerde;** sosyal hizmetler toplumun her kesimini kapsayan bir hizmet alanı olarak değerlendirilecektir. Başta engelliler, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklar, yaşlılar olmak üzere sosyal hizmetlerde fiziki alt yapıyı geliştirecek ve güçlendirecek yatırımlara öncelik tanınacaktır.

—**Gençlik ve Spor Hizmetlerinde;** gençlere ve halka yönelik sportif ve sosyal nitelikli tesislerin geliştirilmesi, alt yapıların iyileştirilmesi, özellikle ilçelerdeki ve beldelerdeki spor tesislerinin arttırılması, gençlik merkezlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır.

—**Kültür ve Turizm Hizmetlerinde;** il genelinde bulunan bütün somut ve soyut kültür mirasının korunması, onarılması ve değerlendirilmesi, kültür ve turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik çalışmalar, kültürel envanter çalışmaları, kültürel nitelikli uygulama projeleri, araştırma-geliştirme projeleri desteklenecektir.

—**Çevre ve Orman Hizmetlerinde;** il merkezi ve ilçelerde ağaçlandırma çalışmaları, çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi, atık su ve katı atık projelerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

—**Tarım Hizmetlerinde;** ilin bitkisel ve hayvansal üretiminde topyekûn verim artışı ve ürün çeşitliliği artışı sağlayacak tarımsal projeler, tarımsal potansiyelin tespiti ve tanıtımına yönelik çalışmalar, tarım sektörü ile ilgili araştırma geliştirme projeleri yapılacaktır.

—**Kırsal Altyapı Projelerinde;** kırsal alanda nüfus büyüklükleri, arazi koşulları ve tarımsal üretim kapasiteleri vb kriterlere uygun olarak yatırım planlaması yapılacaktır. Köy yollarında karayolu ağı ile uyumlu olarak oluşturulacak kırsal kara yolu ağı öncelilerine göre yeni asfalt yapımı, mevcutların onarımı, tüm yerleşim yerlerinde kapalı şebeke yapımı, tarımsal sulama çalışmaları, kanalizasyon yapımı, kırsal alanda düzenli yerleşmeye ve toplulaştırmayı sağlayacak yatırımlara öncelik verilecektir.

—**Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Programı Kapsamında;** kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik projelere öncelik verilecektir. Bu konudaki kamu kuruluşlarındaki fiziki düzenlemeleri, teknolojik alt yapı geliştirme çalışmalarını içeren yatırımlar yapılacaktır.

—**Bilgi Teknolojisi ve ARGE Yatırımlarında;** bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması ekonomide etkinliğin ve verimliliğin arttırılması ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarına öncelik verilecektir.

—**İstihdamın Geliştirilmesinde;** kırsal ve kentsel alanların üretim gücünü ve düzeyini arttıracak nitelikteki projeler, kırsal ve kentsel alanda iş gücünün eğitilmesi, işe kavuşturulması, el sanatlarının teşvikine yönelik projeler desteklenecektir.

—**Afetlere Hazırlıklı Olunması Kapsamında;** il genelinde her türlü afete karşı direnci arttırmak, hazır olunmasını sağlamak, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının etkinliğini sağlamaya yönelik projeler desteklenecektir.

—**Diğer Yatırımlar Kapsamında;** yukarıda belirlenen sektörel öncelikler dışında ilin genel güvenlik ve esenliğini ilgilendiren projeler desteklenecektir.

Temel Amaçlarımız ve Önceliklerimiz

- Eğitim altyapısını tamamlamak, eğitimin tüm alanlarında kaliteyi artırmak ve eğitim ihtiyacı olan her bireye ulaşmak,
- Sivas'ta yaşayan her bireye eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
- Sosyal Hizmet kapsamına giren bütün bireylere sürekli ve kalıcı şekilde hizmet vermek ve bu alandaki fiziki altyapı ihtiyacını gidermek,
- Merkez ve ilçelerde spor faaliyetlerinin altyapısını tamamlayarak mevcut spor tesislerini korumak ve geliştirmek,
- Kültür kenti kimliği kazandırılması için tarihi eserlere ve tüm kültürel mirasa sahip çıkılarak, Sivas'ı bir kültür ve kongre merkezi yapmak,
- Sivas'ı doğal varlıkların korunduğu ve geliştirildiği, ağaçlandırılacak tüm alanların ağaçlandırıldığı Yeşil Bir Sivas kimliğine kavuşturmak,
- Bütün köyler ve bu köylerde yaşayan insanları üretici hale getirmek, tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal altyapıyı geliştirmek,
- Kırsal alandaki bütün yerleşim birimlerini çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuşturmak,
- Çağdaş, güler yüzlü, hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmak,
- Teknoloji kullanma kapasitesini artırmak ve teknolojiyi geliştirmek,
- İstihdamı artırmak, Sivas'ı yatırım yapılan cazibe merkezi haline getirmek,
- Kentsel alanlarda çağdaş ve yaşanabilir yeni alanlar oluşturmak,
- Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak **Sivas İl Özel İdaresinin temel amaçlarıdır.**




C-İL GENEL MECLİSİ FAALİYETLERİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İl Genel Meclisi, 2009 yılında yapılan Yerel Seçim sonuçlarına göre 45 üyeden oluşmuştur.

İl Genel Meclisince 2012 yılı içerisinde, tatil ayı hariç her ay toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda 70 birleşim gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 2 adet de olağanüstü toplantı yapılmıştır.


Bu toplantılarda, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer kanunlarla İl Özel İdarelerine verilen görev, yetki, sorumluluk çerçevesinde 163 adet karar alınmıştır.

MECLİS KARARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI

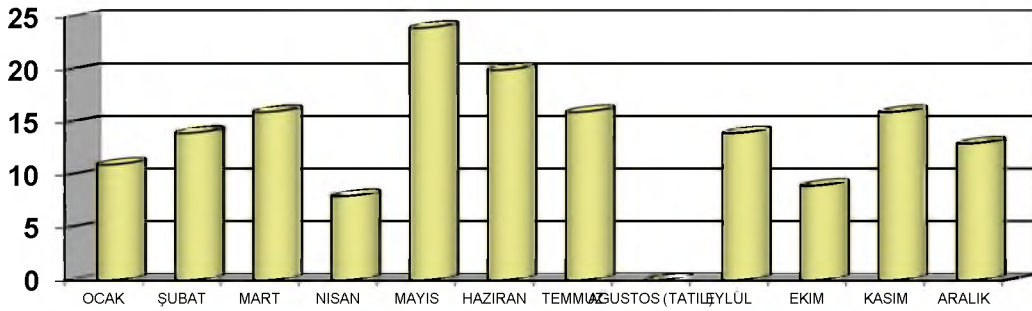

MECLİS KARARLARININ KURUM TEKLİFİ VE ÖNERGELERE GÖRE DAĞILIMI


İl Genel Meclisince alınan kararların, 78'i kurum tekliflerine, 71'i İl Genel Meclisi üyelerince verilen önergelere istinaden alınmıştır. 14'ü ise yasa ve yönetmeliklerde öngörülen komisyon teşkili ve üye seçimlerine ilişkin olarak alınmıştır.

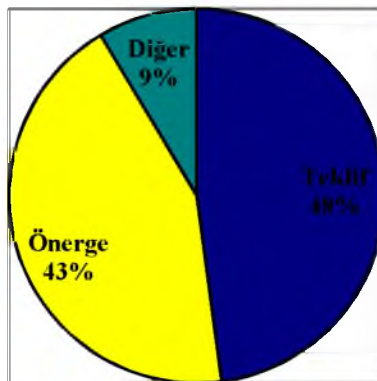


İL GENEL MECLİSİ KARARLARININ HİZMET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

Kırsal Altyapı Hizmetleri (Yol, Su, Kanalizasyon, Tarımsal Hizmetler)	52
Eğitim Hizmetleri	23
Emlak ve İmar Hizmetleri	34
Çevre ve Sağlık Hizmetleri	4
Kültür Turizm Spor ve Sosyal Hizmetler	4
İdari ve Mali Konular (İdari Bağlılık, Yönetmelik, İns. Kayn. Mali Hiz.)	38
Komisyon Teşkili ve Üyelikler	8
TOPLAM	163

HİZMET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ORANLARI



İL GENEL MECLİSİ KARARLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI



MECLİS İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

İl Özel İdaresi görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda daha sağlıklı karara varılabilmesi için meclis gündemine gelen konuların incelenmesi amacıyla İl Genel Meclisinde görüşülen konulardan 20 adet kurum teklifi, 39 adet önerge olmak üzere 59 konu, ihtisas komisyonlarına havale edilmiştir. İhtisas Komisyonlarınca gerekli çalışmalar yapılarak hazırlanan raporlar meclise sunulmuş ve karara bağlanmıştır.

İL ENCÜMENİ


İl Encümenince 2012 yılı içerisinde 37 toplantı yapılmış olup, bu toplantılarda İl Özel İdaresi görev yetki alanına giren konularda ve İl Genel Meclisi kararları doğrultusunda 242 adet karar alınmıştır.

Ayrıca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan taşınmaz mal kiralınması, ağaç satışı ve kum ocağı işletme ruhsatı verilmesi konularında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre 16 adet ihale yapılmıştır.


İL ENCÜMENİ KARARLARININ HİZMET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

Mali Konular	18
Emlak Hizmetleri	50
İmar Hizmetleri	99
Ruhsat Hizmetleri	25
İdari Para Cezaları	36
Diğer	14
TOPLAM	242

HİZMET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ORANLARI



İL ENCÜMEN KARARLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI



BİMER


2012 yılında İdaremize Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığı ile çeşitli konularda 464 başvuru yapılmıştır.

Yapılan başvuruların tamamı yasal süresi içerisinde cevaplandırılmıştır.

BİMER BAŞVURULARININ HİZMET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

Yol	350
İçme Suyu	19
Tarımsal Hizmetler	13
Kanalizasyon	11
İmar ve Ruhsat	16
Diğer	55
TOPLAM	464

HİZMET GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM ORANLARI

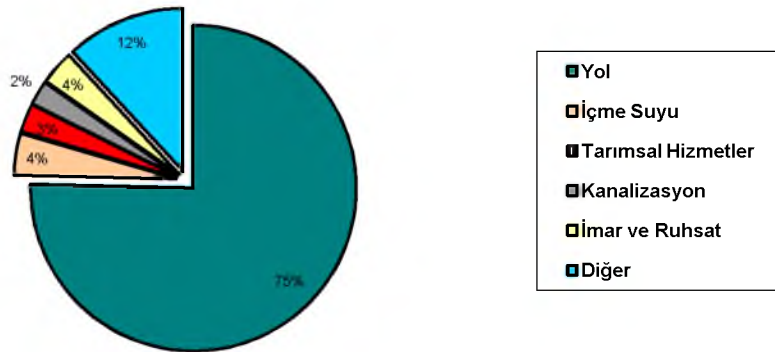

BİMER BAŞVURULARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI							
İLÇE ADI	YOL	İÇMESUYU	TARIMSAL HİZMETLER	KANALİZASYON	İMAR VE RUHSAT	DİĞER	TOPLAM
Merkez	228	4	4	4	7	41	288
Akıncılar	2						2
Altınyayla	4						4
Divriği	5	1	1		1		8
Doğanşar	2	1					3
Gemerek	6	1					7
Gölova	1	2			1	1	5
Hafik	3	2			1	2	8
Gürün	5		1				6
İmranlı	11		2		1	2	16
Kangal	34	2	3	1	1	5	46
Koyulhisar	8			1			9
Suşehri	3	1					4
Şarkışla	4				2	1	7
Ulaş	3			1			4
Yıldızeli	12	3	2	1	1	1	20
Zara	19	2		3	1	2	27

D- İL ÖZEL İDARE BİLGİLERİ

1-Organizasyon Seması:


Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 5286 sayılı kanunla kaldırılarak 5302 sayılı kanunla görev ve sorumluluklarının 16.03.2005 tarihinden itibaren İl Özel İdaresine devredilmesinden sonra Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları yapılmış ve Sivas İl Özel İdaresi, norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak, en son İl Genel Meclisinin 06.07.2006 tarih ve 66 sayılı kararı, ayrıca 04.07.2007 tarih ve 84 sayılı kararı ile örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanarak 1 adet Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 15 adet Birim Müdürü, 16 İlçe Özel İdare Müdürü, 1 Hukuk Müşaviri olmak üzere toplam 35 adet yönetici kadrosu ile çalışmalarını yürütmektedir.



Teşkilat şeması aşağıda yer almaktadır.



T.C
SIVAS İL ÖZEL İDARESİ
TEŞKİLAT ŞEMASI

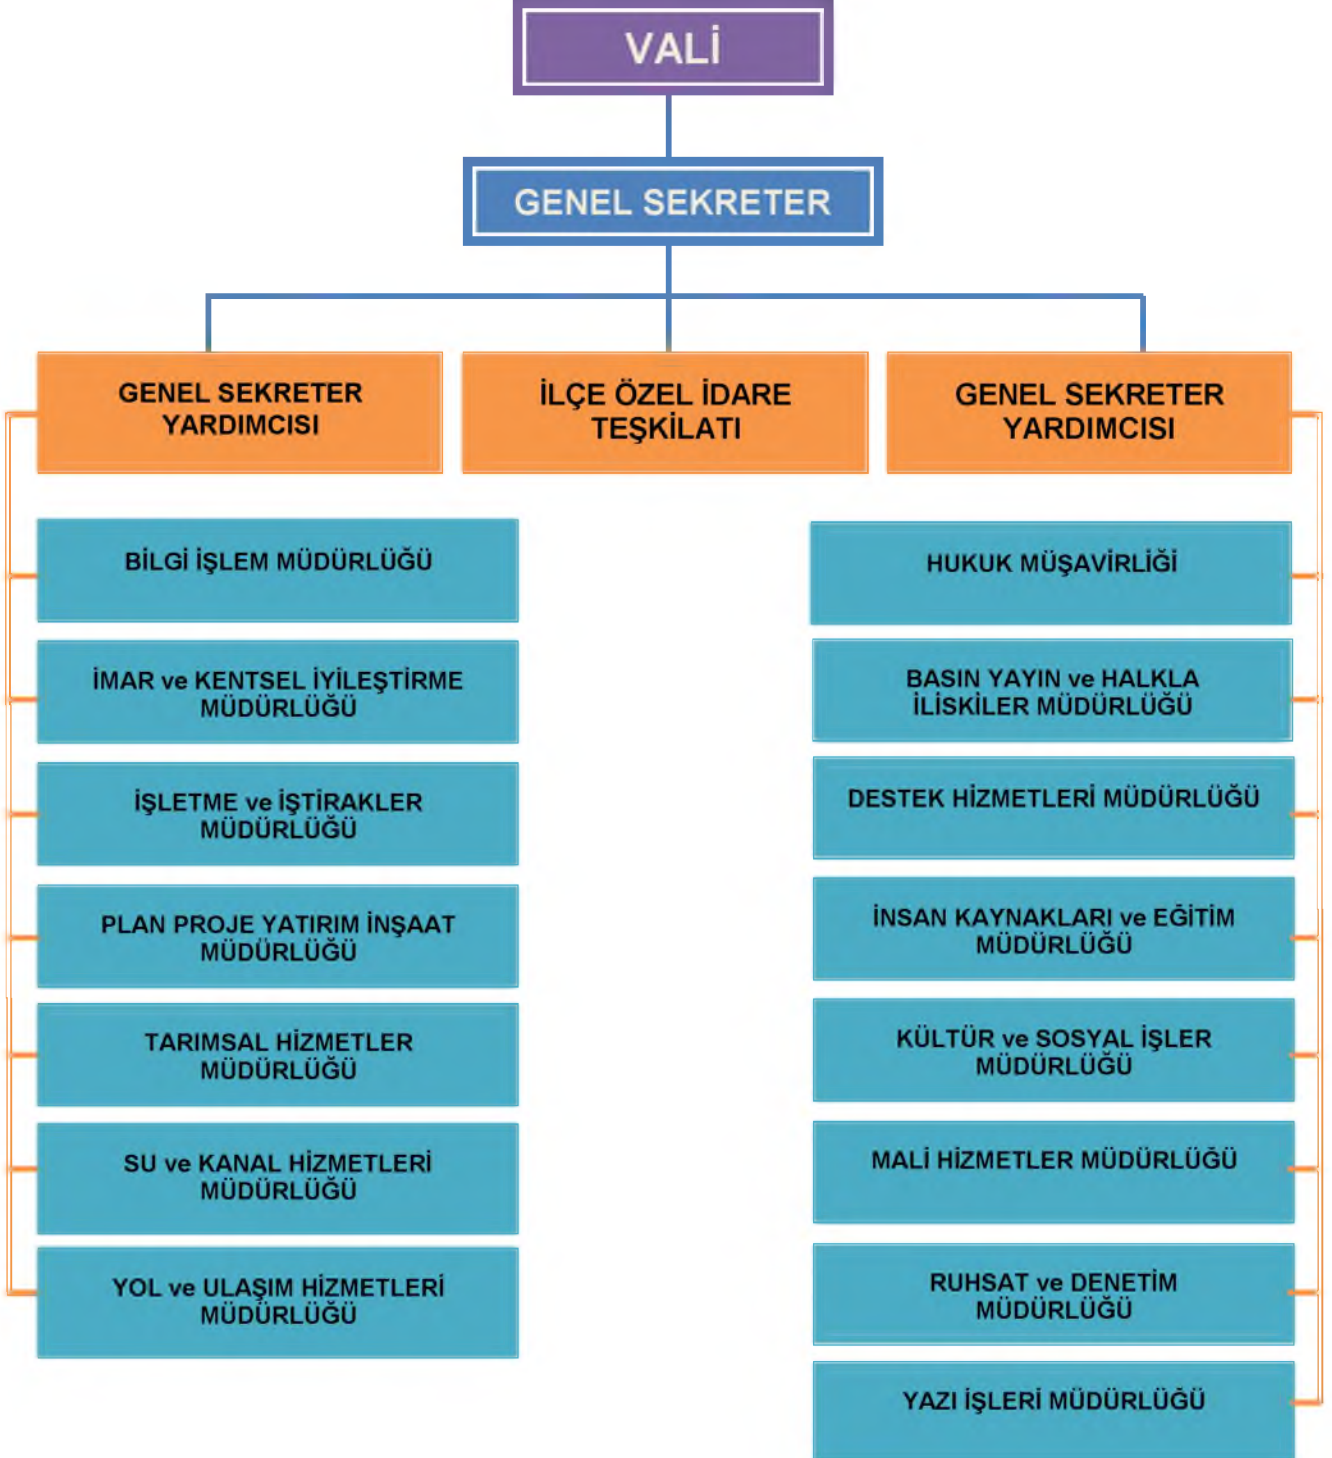

2-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Alınan kararların temel ilke, politika, öncelikler ve belirlenen stratejik hedeflere uygunluğu, komisyonlar ve yetkili makamlarca iç ve dış denetimlere tabi tutulmaktadır.

3-Bilişim Sistemi:

Sivas İl Özel İdaresi'nin tüm birimleri yeterli bilgisayar ve teknik donanımına sahip hale getirilmiş, internet bağlantısı yaygınlaştırılarak hizmetlerimizin daha hızlı icrası ile şeffaflık ve katılımcılık ilkesine uygun hizmet verilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca idarenin bilişim sistemi ile harcama birimlerinin bilişim sistemleri aynı sistem içerisinde yer almakta olup gerekli tüm bilgiler bütün birimlerce paylaşılabilmektedir.

Sivas İl Özel İdaresi'nde il merkezi ve ilçe birimlerinde bilgisayarlı otomasyon sistemine geçilmiş olup, bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce yürütülmektedir.

4-İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı yasanın 49.maddesinin 3.fıkrası ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak İl Özel İdaresinde istihdam edilen, memur, sözleşmeli personel ve işçilerimizin özlük ve sicil işlemleri, aylık ve ödenekleri yasalardan ve toplu-iş sözleşmelerinden doğan mali ve sosyal hakları, personelimizin hizmet içi eğitimleri ve İdaremize talepte bulunan lise ve dengi okul ile fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin staj eğitim işlemleri müdürlüğümüzce yapılmıştır.

Personelimizin kıdem tazminatı, arazi tazminatı, yurtiçi geçici görev yollukları ile memur emekli sandığı ve işçi sosyal güvenlik kurumu tahakkukları müdürlüğümüzce yapılmış olup, ayrıca işçi personelimize yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili maddesi gereğince “en az bir yıl iş sözleşmesi ilişkisi bulunmak, bulunduğu kademedede en az bir yıl çalışmak, bulunduğu derecede ilerleyeceği kademedede bulunmak, değerlendirme fişinde kişisel davranış bakımından en az 7 puan almak şartıyla toplamda 60 puan almak şartıyla her yıl şubat ayı içerisinde işçilere bir kademe ilerlemesi yaptırılır ve izleyen mart ayı başından itibaren uygulanır...” hükmü gereğince hak kazananlara kademe ilerlemesi müteakiben yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinin 99.ncu maddesine istianiden de Derece Terfileri yapılmıştır. Bununla beraber toplu-iş sözleşmelerinden doğan farklar nedeniyle de intibakları yapılmıştır.

Vali, Vali Yardımcıları, Meclis ve Encümen Üyeleri huzur hakları ile İl Genel Meclis Üyeleri ve ilimiz merkezinin muhtar maaşları, komisyon ödenekleri ayrıca hak ettikleri ödeneklerin tahakkuklarının hazırlanması müdürlüğümüzce yapılmıştır.

İdaremizde görev yapan personelin eğitim, hizmet vb. durumlarına göre değişiklik yapılmak üzere İl Genel Meclisine kadro iptal ve ihdaslarımız sunulmuştur.

İdaremizde çalışan ve 2012 yılında da çalışacak olanlar 5393 sayılı yasanın 49.maddesinin

3.fikrasına göre sözleşmeli personelin Ocak ayında yeni sözleşmeleri yapılarak, sözleşmeleri yenilenmiştir.

657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan memurlarımız için 1 defa Görevde Yükselme, 1 defa Unvan Değişikliği sınavı yapılmıştır.

İdaremizde çalışan personelden, ihtiyaca göre birimler arası görevlendirilmeler yapılmıştır.

Genel Sekreterliğimizde çalışan personelin görev gereği yurtiçi görevlendirilme olurları Müdürlüğümüzce alınmıştır.

İşçilerimize yasa gereği yapılması zorunlu olan portör muayeneleri, 6 aylık ve yıllık periyodik muayenelerinin ilgili sağlık birimlerince yaptırılması sağlanmıştır.

2012 Yılı içerisinde 12 işçi disiplin dosyası İşçi Disiplin Komisyonunda görüşülerek, yürürlükte bulunan toplu-iş sözleşmesi hükümlerine göre karara bağlanmıştır.

Memurlar için Performans Yönetmeliğimize göre Haziran ve Aralık aylarında performans değerlendirilmeleri yapılarak, ödemeleri tahakkuk ettirilmiştir.

Şubat ayında işçi personel için işçi değerlendirme fişleri doldurularak, değerlendirilmeleri yapılmıştır.

Memur personelin mal beyanında değişiklik olduğunda yeni mal beyanları daha sonra Mal Beyanı Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenip değerlendirilmek üzere birimimizce teslim alınmıştır.

Sivil Savunma Amirliği 2012 yılında faaliyetlerini müdürlüğümüz bünyesinde sürdürmüş olup, yasa ve yönetmelikler gereği Sivil Savunma Amirliğince yapılması gereken iş ve işlemlerin zamanında yapılması sağlanmıştır.

İdaremizde 2012 yılı içerisinde 36 Öğrencinin staj yazışmaları müdürlüğümüzce yapılmış, branşlarına göre ilgili müdürlüklerde stajlarının yaptırılması sağlanmış ve bu öğrenciler stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra staj dosyaları okullarına gönderilme işlemleri müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında idaremizde göreve başlayan veya çeşitli sebeplerle idareimizden ayrılan personelin sayısal durumu aşağıda belirtilmiştir.

MEMUR :

Emekli	: ---
Vefat	: ---
Nakil Gelen	: 10 Kişi
Nakil Giden	: 1 Kişi
Askerlik Nedeniyle Ayrılan	: 3
Sınavla Atama	: ---
İstifa	: ---

SÖZLESMELİ PERSONEL :

Göreve Başlayan : 14 Kişi
Görevden Ayrılan : ---
Askerlik Nedeniyle Ayrılan : ---

İŞÇİ :

Emekli : 82
Vefat : ---
İş Aktifesh : ---
Askerlik Nedeniyle Ayrılan ve Başlayan : ---
Özürlü-Hükümlü İşbaşı : ---

İdaremizde; 31/12/2012 tarihi itibariyle 159 memur, 41 sözleşmeli ve 589 da daimi işçi statüsünde olmak üzere toplam 789 personel hizmet vermektedir.

Hizmet veren personelin merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

SINIFI	MERKEZ	İLÇE	TOPLAM
M E M U R			
GIH	70	23	93
THS	48	---	48
SHS	2	1	3
YHS	8	4	12
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR	3	---	3
MEMUR TOPLAMI	131	28	159
SÖZLEŞMELİ PERSONEL			
THS	37	---	37
AHS	2	---	2
SHS	2	---	2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL TOPLAMI	41	---	41
KADROLU İŞÇİ			
KADROLU İŞÇİ TOPLAMI	589	---	589

31.12.2012 TARİHLİ DOLU-BOŞ KADRO DURUMU TABLOSU (MEMUR)					
İLİ		SİVAS			
KURUMU		İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ			
MEVCUT MEMUR KADROSUNUN					
SIRA NO	SINIFI	ÜNVANI	UNVAN TOPLAMI		
			D	B	T
1	G.İ.H.	Genel Sekreter	1		1
2	G.İ.H.	Genel Sekreter Yardımcısı	2		2
3	G.İ.H.	Bilgi İşlem Müdürü	1		1
4	G.İ.H.	Destek Hizmetleri Müdürü	1		1
5	G.İ.H.	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürü	1		1
6	G.İ.H.	Hukuk Müşaviri	1		1
7	G.İ.H.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü	1		1
8	G.İ.H.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü	1		1
9	G.İ.H.	İşletme ve İştirakler Müdürü	1		1
10	G.İ.H.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürü	1		1
11	G.İ.H.	Mali Hizmetler Müdürü	1		1
12	G.İ.H.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü	1		1
13	G.İ.H.	Ruhsat ve Denetim Müdürü	1		1
14	G.İ.H.	Tarımsal Hizmetler Müdürü	1		1
15	G.İ.H.	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü	1		1
16	G.İ.H.	Yazı İşleri Müdürü	1		1
17	G.İ.H.	Müdür	1		1
18	G.İ.H.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1		1
19	G.İ.H.	İlçe Özel İdare Müdürü	11	5	16
20	G.İ.H.	Uzman	4	4	8
21	G.İ.H.	Sivil Savunma Uzmanı		1	1

22	G.İ.H.	Mali Hizmetler Uzmanı		2	2
23	G.İ.H.	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı		1	1
24	G.İ.H.	Şef	9	21	30
25	G.İ.H.	Muhasebeci	2		2
26	G.İ.H.	Bilgisayar İşletmeni	19	7	26
27	G.İ.H.	Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni	21	8	29
28	G.İ.H.	Ayniyat Saymanı	1		1
29	G.İ.H.	Ambar Memuru	3		3
30	G.İ.H.	Veznedar	1		1
31	G.İ.H.	Tahsildar		1	1
32	G.İ.H.	Şoför	3	1	4
33	T.H.	Mühendis	28	2	30
34	T.H.	Mühendis (Sözleşmeli)	25		25
35	T.H.	Mimar	1		1
36	T.H.	Mimar (Sözleşmeli)	3		3
37	T.H.	Şehir Plancısı	1		1
38	T.H.	Şehir Plancısı (Sözleşmeli)	1		1
39	T.H.	Arkeolog (Sözleşmeli)	2		2
40	T.H.	Sanat Tarihçisi (Sözleşmeli)	2		2
41	T.H.	Kimyager (Sözleşmeli)	1		1
42	T.H.	Tekniker	13		13
43	T.H.	Tekniker (Sözleşmeli)	3		3
44	T.H.	Teknisyen	5		5
45	A.H.	Avukat		1	1
46	A.H.	Avukat(Sözleşmeli)	2		2
47	S.H.	Tabib (Kurum Tabibi-Tabib)		2	2
48	S.H.	Veteriner Hekim	1		1
49	S.H.	Hemşire	1	1	2
50	S.H.	Sağlık Memuru		1	1

51	S.H.	Sağlık Teknikeri		1	1
52	S.H.	Sosyal Çalışmacı		1	1
53	S.H.	Sağlık Teknikeri(Sözleşmeli)	1		1
54	S.H.	Veteriner Sağlık Teknikeri(Sözleşmeli)	1		1
55	S.H.	Veteriner Sağlık Teknisyeni	1		1
56	Y.H.	Aşçı	1	1	2
57	Y.H.	Bekçi		1	1
58	Y.H.	Hizmetli	8	6	14
59	Y.H.	Kaloriferci	3		3
60	Y.H.	Şahsa Bağlı Kadro	3		3
TOPLAM:			200	68	268



5- İl Özel İdaresi Fiziki Kaynakları

5.1. Sivas İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkuller

MERKEZ:

- 1- Vali Konağı,
- 2- Özel İdare Hizmet Kompleksi,
- 3- Özel İdare Eski Hizmet Binası,
- 4- Mülga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Binası,
- 5- Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Binası,
- 6- Lojmanlar, (Örtülüöinar, Akdeğirmen, Sularbaşı ve 4 Eylül Mahallesi)
- 7- Mevlana Caddesinde 8 adet dükkan,
- 8- Özel İdare Eski Hizmet Binası altında 5 adet dükkan,
- 9- Katlı Otopark,
- 10- Katlı Otopark'ın 1. Bodrum katında 20 adet dükkan,
- 11- Bilim ve Kültür Merkezi
- 12- Toptancı Sebze Hali İçerisinde Soğuk Hava Deposu,
- 13- Kadıburhanettin Mahallesinde Kömür Tevzii Tesisleri,
- 14- Spor Kompleksi,
- 15- Kangal Köpeğı Üretim ve Eğitim Tesisleri,
- 16- Tarihi İnönü Konağı,
- 17- Balıklı Kaplıca,
- 18- Sıcak Çermik,
- 19- Ankara'da Sivas Erkek Öğrenci Yurdu,
- 20- Ankara'da Sivas-Sinop Kız Öğrenci Yurdu
- 21- Arsa ve Tarlalar
- 22- Halı Okulları
- 23- İlçelerdeki Gayrimenkuller

1- VALİ KONAĞI:

Akdeğirmen Mahallesinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğünden satın alınan 14 dönümlük taşınmazın 13 dönümünün içerisinde yapılan Vali Konağı; 1982 yılında yapımına başlanılmış ve 1985 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Konak yaklaşık 500 m² üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir.

2- ÖZEL İDARE HİZMET KOMPLEKSİ:

Akdeğirmen Mahallesi Vali Konağı karşısında bulunan Özel İdare Hizmet Kompleksi, Orman Genel Müdürlüğünden alınmış ve 8854 m² taşınmazın içerisinde yapılmıştır. Binanın inşaatına 1995 yılında başlanılmış ve 1997 yılı sonlarında tamamlanmıştır.

3- ÖZEL İDARE ESKİ HİZMET BİNASI:

Sularbaşı Mahallesi, Kızılay Sokakta bulunan Özel İdare eski hizmet binası 1966-1969 yılları arasında yapılmış, YSE ve Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü hizmet binası, daha sonra ise 1997 yılı sonuna kadar Özel İdare Hizmet binası olarak kullanılmıştır.

Bina; zemin ve teras katları dahil 5 katlı olup, zemin kattaki 5 adet dükkan özel şahıslara, teras kat dahil binanın geriye kalan kısımlarının tamamı Sivas Belediyesine kiraya verilmiştir.

Bu bina; Tapunun 82 ada, 6, 7 ve 25 parsellerinde kayıtlı taşınmazın üzerine yapılmıştır. 25 nolu parsel Özel İdareye ait olup, 6 ve 7 nolu parsellerinde Sivas Belediyesine ait olduğu iddia edilmektedir ve bina bu parsellerin üzerine yapılmıştır.

Arsalar; Sivas Belediye Encümeninin 14.12.1965 tarih ve 3886 sayılı kararında belirtilen şartlarda; Özel İdarenin kamyon, greyder, loder ve dozer gibi iş makinelerini Sivas Belediyesine vermesi karşılığında alınmıştır.

Aradan geçen zaman içerisinde Belediye, Belediye Encümeninin 14.12.1965 tarih ve 3886 sayılı kararında yazılı şartların yerine getirilmediği belirtilerek, arsaların Özel İdareye devri yapılmamıştır.

İdaremize ait 25 nolu parsel ile 7 nolu parselin kadastro tespitinde hudut ihtilafının bulunması, yine 25 nolu parselin Belediye ile Ziya Pekin adlı şahıs ve mirasçıları arasında davalı olmasından dolayı kadastro tespiti gerçekleşmemiş ve Sivas Belediyesi adına ilgililerce tapunun iptali ve tescil davası açılmış olup, bu dava neticelenmemiştir.



4- MÜLGA KÖY HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI :

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve İl Özel İdaresine tahsisli olup, Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüklerinin kaldırılması ve İl Özel İdareleriyle birleştirilmesi nedeniyle boşalan Bölge Müdürlüğüne ait bina, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kullanım amacıyla verilmiştir.

5- MÜLGA KÖY HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNA VE TESİSLERİ:

Kılavuz Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup İl Özel İdaresine kullanım amacıyla tahsis edilen yaklaşık 33 dönümlük taşınmaz üzerinde; 7 katlı bina, sosyal tesisler, tamirhane, atölye, ambar vb. tesisler bulunmaktadır.



6- LOJMANLAR:

Akdeğirmen Mahallesiindeki lojmanları:

Akdeğirmen Mahallesi, Vali Konağı yanında bulunan lojmanlar, yaklaşık 6 dönümlük arsa üzerine üç blok olarak yapılmıştır. A Blokta 10, B blokta 10 ve C blokta 12 adet olmak üzere toplam 32 adet konut ile kapıcı ve kalorifer dairesi bulunmaktadır.



Başara Apt. A Blok Lojmanları:

Örtülüpınar Mahallesi, Tekel Ara Sokak Başara Apartmanı A Blokta bulunan 10 adet konut; 1973 yılında özel kişilerden ihale yoluyla satın alınmış ve bu konutlardan 7 numaralı olan 1982 yılında irtifak hakkı İçişleri Bakanlığına ait olmak üzere Maliye Hazinesine satılarak, tapu devri yapılmıştır.

Sularbaşı Mahallesiinde Bulunan Lojmanlar:

Mülga Köy hizmetleri tarafından hazine arsası üzerine yaptırılan Merkez Sularbaşı Mahallesiinde A-1 blokta 10, A-2 blokta 5, B blokta 10 adet olmak üzere toplam 25 adet lojman ve kaloriferci dairesi bulunmaktadır.



4 Eylül Mahallesinde Bulunan Lojmanlar:

Mülga Köy Hizmetleri tarafından hazine arsası üzerine yaptırılan Merkez 4 Eylül Mahallesinde A blokta 10, B blokta 8 adet olmak üzere toplam 18 adet lojman ve kaloriferci dairesi bulunmaktadır.



7- MEVLANA CADDESİNDEKİ DÜKKANLAR:

Mevlana Caddesi üzerinde bulunan 8 adet dükkan; Selçuk İlköğretim Okulu bahçesinin doğu kısmındaki düşük koddan faydalanılarak ve okul bahçesine hiçbir engeli olmayacak şekilde yapılmış ve tamamı şahısların icarındadır.

8- ÖZEL İDARE ESKİ HİZMET BİNASI ALTINDAKİ DÜKKANLAR:

Merkez Eski Belediye Sokakta, Özel İdare eski hizmet binası altında 5 adet dükkan olup bunların beşi de özel şahıslarca kiralanmıştır.

9- KATLI OTOPARK:

Merkez Çarşıbaşı Mahallesi Paşa Camii bitişiğindeki Sivas Belediyesine ait 3617 m² arsa üzerine kat karşılığı sözleşmesi ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştır. Otoparkın inşaatına 1997 yılında başlanılmış, 2001 yılı sonlarında tamamlanmıştır.

Otopark, A ve B blok olmak üzere, iki blok halinde yapılmıştır. A Blok 3 katlı, B Blok 2 katlıdır.

A Blokun; -1. katında 27 adet dükkân, WC, -2. ve -3. katlarındaki minibüs garajı Sivas Belediyesine, -2. ve -3. katlardaki otoparkların tamamı İlimiz Özel İdaresine aittir.

B Blok 2 katlı olarak inşa edilmiş olup, -1. katında 20 adet dükkân ve -2. katında otopark bulunmaktadır. Bu bloğun tamamı İl Özel İdaresine aittir.

2003 yılı Haziran ayı itibariyle, 5 yıllığına kiraya verildi. 2006 yılı kirası 48.000 TL'dir. Diğer yıllar kiralara ise ÜFE oranında artış uygulanmaktadır.

Otoparktaki;

20 Adet dükkân, 210 araçlık otopark İl Özel İdaresine, (hisse % 71,20)

27 Adet dükkân, minibüs garajı, lavabo, WC Sivas Belediyesine aittir. (hisse % 28,80)

10- KATLI OTOPARKTA BULUNAN DÜKKANLAR:

B Bloкта bulunan 20 adet dükkânlarımızın büyüklükleri farklı olup, en küçüğü 11 m² en büyüğü 30 m² arasında değişmektedir. Halen kirada bulunmaktadır.



11- SOĞUK HAVA TESİSLERİ:

Soğuk Hava Tesisleri; Kadıburhanettin Mahallesi, Toptancı Sebze Hali içerisinde bulunan Sivas Belediyesine ait 3183 m² taşınmazın üzerine, kat karşılığı olarak yapılmıştır.

Sivas Belediyesinin vermiş olduğu arsaya karşılık, bitişik parseldeki arsa üzerine, 2 adet büro, Belediye Hal İdari Binası olarak yapıp Belediye'ye teslim edilmiştir.

1998 yılı Mayıs ayında inşaatına başlanılan tesisler, 2001 yılı ortalarında tamamlanmıştır.

Tesisler 2500 ton kapasiteli olup, 15 adet sebze-meyve deposu, 2 adet et ve et ürünleri deposu olmak üzere 17 adet soğuk hava deposuna sahiptir.

03 Kasım 2010 tarihinde yıllık 22 milyar kira bedeli üzerinden ve gelecek yıllarda TÜFE, ÜFE oranında artışlar uygulanmak şartıyla kiracı tarafından kullanılmaktadır.



12- BİLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ:

İlimiz Merkez İlçe, Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan, 16 pafta, 513 ada ve 13 nolu parselde kayıtlı eski Madımak Otel'i İdareimizce kamulaştırılmıştır. Halen ilimizin Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır.

13- KÖMÜR TEVZİİ TESİSLERİ:

Kadıburhanettin Mahallesi (Üniversite yolu üzeri) Paşaçayırı mevkiinde bulunan ve çevresinde ticaret merkezlerinin yoğun olduğu, 29.916 m² alana sahip olan taşınmazın içerisinde demiryolu hattı ve rampası, çevre duvarı ve tel örgüsü, idari binası, kantarı, bekçi kulübesi gibi müstemilat yapıları bulunmaktadır. Söz konusu tesisler, 1998 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 15.211.000,00 TL bedelle satın alınmıştır. Tesisler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının da ortağı bulunduğu Sivas Kömür Satış Ortaklığına işletilmek üzere kiraya verilmiştir. Halen bu kuruluşun icarında bulunmaktadır.



14- SPOR KOMPLEKSİ:

Kadıburhanettin Mahallesi Paşaçayırı yöresinde, Maliye Hazinesine ait olup Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 19.12.2001 tarihinde; hizmetlerin devamı boyunca Özel İdare adına tahsis edilen 7-8 pafta, 371 ada ve 42, 104 ve 105 nolu parsellerde kayıtlı 96.504 m² taşınmaz üzerine yapılmıştır.

Kompleks; Sivasspor Kulübü Derneğine, 2006 yılında 6.725TL bedelle kiraya verilmiştir.

15- KANGAL KÖPEĞİ ÜRETİM VE EĞİTİM TESİSLERİ:

Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Tesisleri; Merkez Çelebiler köyü sınırları içerisinde ve Merakum mevkiinde, 3 parçada toplam 300.200 m² alanlı tarlalar Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Tesisleri yapılmak amacıyla 1999 yılında Maliye Hazinesinden satın alınmıştır. Bu arazinin etrafı beton direk ve dikenli telle çevrilmiş, 764 parselde kayıtlı tarlanın yaklaşık 20 dönümlük kısmı ise kafesli telle çevrilip, içerisine Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Tesisleri yapılarak hizmete girmiştir. Tesislerin içme ve kullanma suyu 1800 metre mesafeden motorla terfi edilmek suretiyle karşılanmaktadır.

Tesisler; 2 katlı, kaloriferli idari bina, kuluçka odaları, yavru gezinti odaları gibi bölümlerden oluşmaktadır. Üretim tesisleri, 28 Haziran 2000 tarihinde ihale edilerek, inşaatına başlanılmış ve 2001 yılı ortalarında tamamlanarak hizmete girmiştir.

Kangal Köpeği Üretim Tesisleri 03 Mart 2004 tarihinde yapılan ihale sonucu yıllık 1.550,00 TL bedel üzerinden ve gelecek yıllarda TEFE oranında artışlar uygulanmak suretiyle 5 yıllık süre için İlimiz Özel İdaresinin ortağı olan Sivas Tarım Hayvancılık A.Ş ve Sivas Tarım Hayvancılık ve Anonim Şirketinin ortağı olduğu İç Anadolu Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ne Kiraya verilmiş, 2006 yılı kirası 1.812 TL'dir.

16- İNÖNÜ KONAĞI:

Bahtiyarbostan Mahallesi, Alibaba Caddesi üzerinde bulunan ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ' nün bir süre ikamet ettiği ve yıllarca müze olarak kullanılan Konak; 27.10.2000 tarihinde Sivas Belediyesinden satın alınmıştır.

Konağın aslına uygun olarak restorasi için, roleve ve restorasyon projeleri hazırlanmış, Kültür Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan gerekli izin alınarak, restorasyon ve bahçe tanzimi işleri yapılmıştır. Konak 5 yıl süreyle kiraya verilmiş, kiracı, kira

şartlarına uymadığı için kira süresi tamamlanmadan sözleşme mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Konak, İdaremizin de ortağı olduğu şirket tarafından kullanılmaktadır.

İnönü Konağının bitişiğinde bulunan, tapunun 148 ada 2 nolu parselinde kayıtlı 180,16 m² arsalı avlulu ahşap ev; restorasyon ve bahçe tanzimi kapsamında, Konağın bitişiğinde bulunan tapunun 148 ada, 3 nolu parselinde kayıtlı ve şehir imar planında park alanı olarak ayrılan 210,17 m² arsalı ahşap ev; restorasyon ve bahçe tanzimi kapsamında, 2002 yılında kamulaştırılmış olup gerek 2 nolu parseldeki ve gerekse 3 nolu parseldeki ahşap evler yıkılarak arsaları konağın bahçesine dahil edilmiş ve gerekli bahçe tanzimleri yapılmıştır.

17- BALIKLI KAPLICA:

Balıkli Kaplica; Kangal ilçesi, Kavak Köyü sınırları içerisinde ve Kangal ilçesine 14 km. Sivas iline 100 km. uzaklıktadır.

-Kaplica tesisleri, mülkiyeti Özel İdaresine ait olan 41.659 m² alan içerisinde yerleşmiş bulunmaktadır.

-Balıklı kaplica 1986 yılına kadar İlimiz Özel İdaresince işletilmiş, bu tarihten 1995 yılına kadar Kangal Belediyesi ve diğer müstecirlere kiraya verilmiştir.

-1995 yılında Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde ve 7 Haziran 1995 tarihinde, 30 yıllık süre için (Ünsallar Kaplica Turizm İnş. ve Taah. A.Ş.ne) kiraya verilmiştir.

18- SICAK CERMİK

TERMAL EVLER

Yıldızeli İlçesi sınırları dahilinde ve Sıcak Çermik mevkiinde, Maliye Hazinesinden 26.03.1999 tarihinde 4.5 milyar bedelle satın alınan 22 dönümlük arazinin içerisinde, (Belediye İmar Planına göre Resmi Kurum Alanı içerisinde kalan yere) 3 blok halinde yapılan motel tipi termal evler 1998 yılı sonlarında tamamlanmıştır.

Her blokta iki ev bulunmaktadır. Blokun biri Makamın hizmetlerinde kullanılmak üzere eve dönüştürülmüştür. Bloktaki evlerden herbirinin alanı 60 m² civarındadır.

SICAK CERMİK

Sıcak çermik yöresinde, sıcak su kaynaklarının bulunduğu 371.894 m²'lik taşınmaz mal Özel İdareye ait iken 1960 yılında bedeli mukabilinde Sivas Belediyesine devredilmiştir.

Yıldızeli İlçesi, Kalın Köyü sınırları, Sivas Belediyesi mücavir alanı içerisinde kalan ve Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilen yerde bulunan 8 parçada toplam 157.750,00 m² alanlı tarla vasfındaki taşınmazlar, Termal Turizm Tesisleri yapılmak gayesiyle, 2000 yılında Maliye Hazinesinden satın alınmıştır.

19- ANKARA İLİNDEKİ (SİVAS) ÖĞRENCİ YURDU BİNASI :

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Delilertepesi Mahallesinde bulunan 617 m² alanlı arsa üzerine Öğrenci Yurdu yapılması amacıyla 1967 yılında satın alınan arsanın % 60,8'i Sivas Belediyesine, %39,2'si İlimiz Özel İdaresine aittir.

Yurt Binası; Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından yaptırılarak, 1973 yılında hizmete girmiştir. Halen Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu olarak faaliyetlerini sürdürmekte

ve burada kalan öğrencilerin büyük kısmını Sivas'lı öğrenciler oluşturmaktadır.

Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Bakanlar Kurulunun 21.11.1972 tarih ve 7/5375 sayılı kararıyla Kamu Yararlı Dernek kapsamına alınmış ve halen Ankara'da faaliyet gösteren tek Şehir Yurdu olduğu bilinmektedir.

20- SİVAS-SİNOP KIZ ÖĞRENCİ YURDU :

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Delilertepesi Mahallesiinde bulunan ve tapunun 261 pafta, 5325 ada, 3 no'lu parselde kayıtlı, mülkiyeti Sinop İl Özel İdaresine ait olan 551 m² alanlı arsa üzerine Sivas ve Sinop Özel İdarelerince Kız Öğrenci Yurdu yapılmak üzere protokol yapılmış, yurttaki öğrenci kapasitesinin %70'i Sivas, %30'u Sinop Özel İdarelerine kontenjan olarak verilmiştir.

21- ARSALAR VE TARLALAR:

ARSALAR:

- Merkez Gökçebostan Mahallesi, Seyrantepe mevkiindeki 10.027,20 m² alanlı arsa, Huzur Evi yapılmak amacıyla 1994 yılında, Maliye Hazinesinden 510.000.00 TL bedelle satın alınmış ve halen boş durmaktadır.



- Kılavuz Mahallesiinde, Belediye Petrol İstasyonunun yukarısında, halen Tarım İl Müdürlüğüne ait garaj tesislerinin bulunduğu yerde İlimiz Özel İdaresine ait 10.000 m² taşınmaz; 1997 yılında 18. madde uygulaması sonucu 6630 m²'ye düşmüştür.



- Örtülüpınar Mahallesiinde 34 pafta, 337 ada, 105 parselde 222,55 m2 arsa,



TARLALAR:

1/1) Akdeğirmen Mahallesi, Temeltepe mevkii, Özel İdare Hizmet Kompleksinin Kuzey Batı kısmında, tapunun 165 pafta, 754 ada ve 3 parselinde kayıtlı 15.000 m2 alanlı taşınmaz mal; 2002 yılında satın alınmıştır.

1/2) Akdeğirmen Mahallesi, Temeltepe mevkii, Özel İdare Hizmet Kompleksinin Kuzey Batı kısmında, tapunun 165 pafta, 755 ada ve 18 parselinde kayıtlı 182.465,43 m2 alanlı taşınmaz mal; 2004 yılında satın alınmıştır.

1/3) Akdeğirmen Mahallesi, Temeltepe mevkii, Özel İdare Hizmet Kompleksinin Kuzey Batı kısmında, tapunun 165 pafta, 755 ada ve 19 parselinde kayıtlı 5.708,19 m2 alanlı taşınmaz mal; 2004 yılında, satın alınmıştır.

1/4) Akdeğirmen Mahallesi, Özel İdare Hizmet Kompleksinin Kuzey ve Kuzey Doğusunda, tapunun 165 pafta, 91 ada ve 57 parselinde kayıtlı 157,02 m2 alanlı taşınmaz mal; 2004 yılında, satın alınmıştır.

1/5) Akdeğirmen Mahallesi, Özel İdare Hizmet Kompleksinin Kuzey ve Kuzey Doğusunda, tapunun 165 pafta, 91 ada ve 56 parselinde kayıtlı 797,51 m² alanlı taşınmaz mal; 2004 yılında, satın alınmıştır.

1/6) Akdeğirmen Mahallesi, Özel İdare Hizmet Kompleksinin Kuzey ve Kuzey Doğusunda, tapunun 165 pafta, 91 ada ve 55 parselinde kayıtlı 51,08 m² alanlı taşınmaz mal; 2004 yılında, satın alınmıştır.

1/7) Akdeğirmen Mahallesi, Özel İdare Hizmet Kompleksinin Kuzey ve Kuzey Doğusunda, tapunun 165 pafta, 91 ada ve 53 parselinde kayıtlı 122.084,67 m² alanlı taşınmaz mal; 2004 yılında 2942 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince **Orman Genel Müdürlüğünden** Yeşil Sivas Projesi ihtiyacında fidan yetiştirilmek üzere satın alınmıştır.

Orman Genel Müdürlüğünden alınan 7 parseldeki taşınmaz toplamı 2002 yılında 15.000 m², 2004 yılında 311.263,90 m² olmak üzere toplam (a) 15.000, (b) 182.465,43 (c) 5.708,19 (d) 157,02 (e) 797,51 (f) 51,08 (g) 122.084,67 **326.263,90 m²'dir. (Özel İdarenin yeri hariç)**

- Üçlerbey Mahallesi, Kaldı Yolu mevkiindeki 29.873,93 m² alanlı tarla; Ağaçlandırma yapılmak üzere 1994 yılında Maliye Hazinesinden satın alınmış ve amacı doğrultusunda değerlendirilmediğinden boş bulunmaktadır. Tarla; Kızılırmak Köprüsünün yakınında ve Kızılırmak'a bitişiktir.



- Kardeşler mevkii, Kardeşler Tepesinin üst zirvesinde ve kuzey yamaçlarında, tapunun 278, 526, 527 ve 528 parsellerinde kayıtlı 4 parçada toplam 133.550 m² alanlı tarla vasıflı taşınmaz mal; 1994 yılında Kayak Evi ve tesisleri yapılması amacıyla kamulaştırılmış ancak, zaman içerisinde tesisler yapılmadığından taşınmazların tamamı ağaçlandırılmıştır. Bu alana 2005 yılı içerisinde Kent Ormanı olarak düzenleme yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir.

- Pirkirik Köyü sınırları içerisinde, Sivas-Erzincan Karayolunun Güney kısmında, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünce ağaçlandırılan alanın bitişiğinde ve Atatürk büstü ile Paşapınarı çeşmesinin bulunduğu yerdeki 3.338 m² alanlı, 2 parçadaki taşınmaz mallar 1972 yılında kamulaştırılmış ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

- Merkez Kadıburhanettin Mahallesi Paşacayı mevkiinde bulunan 5014 ada, 1 nolu parsel üzerine 46 adet ve 5210 ada, 1 nolu parsel üzerine 60 adet olmak üzere pay karşılığı 106 adet dükkan yapılmak üzere Belediyenin kuruluşu olan **ÖZBELSAN A.Ş.**'ye verilmiştir.

-Merkez Kadıburhanettin Mahallesi Paşacayı mevkiinde bulunan 55 pafta, 5202 ada, 1 nolu parselde 6262,61 m² arsa bulunmakta ve bu arsanın 54.836 m²'si İl Özel İdaresine ait diğer kısmı

ise başka şahsa ait bulunmaktadır.

-Merkez Kadıburhanettin Mahallesi Paşaçayırı mevkiinde bulunan 370 ada, 87 nolu parselde 3.010,93 m² arsa bulunmaktadır.

22- HALI OKULLARI:

Merkez Halıcılık Okulu Tesisleri:

Akdeğirmen (Bezirci) Mahallesinde bulunan halıcılık okulu binası ve depolar 1963 yılında Sümer Bank Genel Müdürlüğünden satın alınmıştır.

Halı okulu tesisleri 3691 m² alanlı arsanın içerisinde bulunmaktadır. Atölye binası, depolar, yemekhane ve idare binasından müteşekkil olan bu bina, 2001 yılında Özel İdare Müdürlüğünün Halıcılık faaliyetlerine son vermesiyle boş bulunmaktadır.



Çayboyu Mahallesi Halı Okulu:

İlimiz Merkez Çayboyu Mahallesi 14 pafta, 35 parselde 378 m² alanlı halıcılık okulu binası boş ve atıl durumda bulunmaktadır.



Karayün Köyü Halı Okulu:

130 m² üzerine yapılı bulunan halı okulu ve üzerindeki lojmanın faaliyetleri 2000 yılında sona ermiş olup, bina İl Daimi Encümeninin 01/10/2003 tarihli 358 kararıyla Köy Konağı olarak kullanılmak üzere Köy Tüzel Kişiliğine tahsis edilmiştir.

Hıdırnalı Köyü Halı Okulu:

Burada bulunan Halı Okulu 1986 yılında yaptırılmış ve faaliyet olmadığından İl Daimi Encümeninin 24.10.1997 tarih ve 548 sayılı kararıyla Köy Tüzel kişiliğine tahsis edilmiştir.

Hanlı Köyü Halı Okulu:

1987 yılında yapılan bir katlı Halı Okulu binası ve lojman İl Daimi Encümeninin 26.08.1998 gün ve 375 sayılı kararıyla Acil Kurtarma İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Deiliilyas Halıcılık Okulu Binası ve Lojmanı:

Altınyayla İlçesine bağlı olan ve ilçenin 5 km. yakınında bulunan Deiliilyas Kasabası Köyiçi mevkiinde, İlköğretim okulunun da bulunduğu taşınmazın içerisine bir adet 20 tezgâhlık halı okulu ile bitişliğine bir adet lojman yapılmış, ancak öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanmış, İl Encümeninin 01.04.2003 tarih ve 23 sayılı kararıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

İmranlı İlçesi Halı Okulu:

İmranlı İlçe Merkezinde bulunan ve 1982 yılında yapılan Halı Okulu binası, İl Encümeninin 15 Eylül 2004 tarih ve 306 sayılı kararıyla Sosyal Market Olarak Kullanılmak üzere İmranlı Kaymakamlığına tahsis edilmiştir.

Ortaseki Köyü Halıcılık Okulu:

Koyulhisar İlçesi, Ortaseki Köyüne 1986 yılında yapılan 10 tezgâhlık Halı Okulu binası; öğrenci yetersizliği sebebiyle faaliyetleri durdurulmuş ve İl Encümeninin 24.07.1996 gün ve 383 sayılı kararıyla, Koyulhisar Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmiştir.

Şarkışla Halıcılık Okulu Binası:

Şarkışla İlçesi Merkez Gültekin Mahallesinde bulunan Halıcılık Okulu binası 420 m² yüzölçümlü taşınmazın içerisine yapılmış olup, halıcılık faaliyetlerinin olmaması nedeniyle Şarkışla Köylere Hizmet Götürme Birliğine 12.03.2003 gün ve 32 sayılı İl Encümeni kararıyla 10 yıl süreyle, bedelsiz tahsis edilmiştir. Birlikçe burası Süt Toplama Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Ulaş İlçesi Eskikarahisar Köyü Halı Okulu:

Ulaş İlçesine bağlı Eskikarahisar Köyü, Köyiçi mevkiinde, Maliye Hazinesince tahsisli 816 m² taşınmazın üzerine 1988 yılında yapılan Halıcılık Okulu binası; öğrenci olmaması nedeniyle faaliyetleri durdurulmuş ve bu yer İl Encümeninin 13.12.1995 tarih ve 598 sayılı kararıyla Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmiştir.

Yıldızeli İlçesi Kızıllı Köyü Halı Okulu:

Yıldızeli İlçesi, Kızıllı Köyü, Köy Tüzel kişiliğine ait 4550 m² yüzölçümlü taşınmazın 1550 m²'lik kısmının Köy Tüzel Kişiliğinin Özel İdareye hibe etmesiyle, bu taşınmazın üzerine 1986 yılında Halıcılık Okulu binası yapılmış ve halıcılık faaliyetlerinin durmasıyla bu bina İl Encümeninin 02 Ağustos 2000 tarih ve 266 sayılı kararıyla; derslik olarak kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

23- İ L Ç E L E R :

AKINCILAR

ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE LOJMANLAR:

Akincıların 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmasından sonra buraya İlimiz Özel İdaresince, Zemin katı hizmet binası, diğer iki katında 4 adet konut bulunduğu 3 katlı bina ve bitişğine de kaymakam konutu yapılmıştır.

Binaların yapımına 1991 yılında başlanılmış ve 1992 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Zemin katta İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmetleri ile diğer bazı kamu kurumları hizmetlerini sürdürmektedir. Bina kaloriferli olup, bitişğinde bulunan kaymakam konutunun kalorifer ısısı bu binadan sağlanmaktadır.

ALTINYAYLA

ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE LOJMANLAR:

Altinyayla'nın 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmasından sonra, bu ilçeye İlimiz Özel İdaresince zemin katı hizmet binası, diğer iki katında 4 adet konutun bulunduğu 3 katlı bina ve bitişğine de kaymakam konutu yapılmıştır

Hizmet binası ve lojman olarak 1992 yılında yapılan bu binanın tamamı Altinyayla Lisesinde okuyan kız öğrencilerin barınmasında kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

DİVRİĞİ

a) ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE LOJMANLAR:

Divriği Merkez İlçe Mercantepe Mahallesinde ve tapunun 573 adası üzerinde ve 4 nolu parselde bulunan 2.296 m² taşınmazın üzerine yapılan bina; zemin dahil 3 katlı olup, zemin katı hizmet binası, diğer iki katında 4 adet konut bulunmaktadır. Daha sonra en üstteki 2 konut birleştirilerek kaymakam konutu olarak kullanıma ayrılmış, 2001 yılında İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün hizmetlerini Hükümet Konağında vermesiyle, zemin kattaki hizmet büroları mahalli imkânlarla yapılan tadilat sonrası konuta dönüştürülmüş ve halen konut olarak kullanılmaktadır. Bina kaloriferlidir.

b) ESKİ KAYMAKAM KONUTU:

Merkez İlçe, Mercantepe Mahallesi, Hükümet Konağı arkasında bulunan kaymakamlık eski konutu, kaymakamlık konutunun Özel İdare hizmet binası üzerine taşınmasıyla boşalmış olup, sobalı olan konut kamu görevlilerine tahsis edilmektedir.

c) AYGIR DEPOSU YERİ:

Aygır deposu, şu anda arsa halinde ilçe mezarlığı ile Ulu Camii yolu üzerinde sıkışık bir haldedir. Ulu Camii çevre restorasyonu sırasında yol çalışması kapsamında değerlendirilebilir.

DOĞANŞAR

a) KAYMAKAM KONUTU:

Doğanşar'ın ilçe olmasıyla Özel İdare hizmet binasının bitişğine Kaymakam konutu yapılmış olup, bu konutun yapımına 1991 yılında başlanılarak 1992 yılında tamamlanmıştır

b) ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE LOJMANLAR:

Doğanşar'ın 09.05.1990 Gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmasından sonra, bu ilçeye İlimiz Özel İdaresince, zemin katı dahil 3 katlı Özel İdare Hizmet binası ve 4 adet lojman yapılmıştır. Binanın zemin katı Özel İdareyle birlikte bazı kamu kurumlarınca hizmet büroları olarak kullanılmakta, diğer 2 katta bulunan 4 adet konut kamu görevlilerine tahsis edilmektedir.

Binanın yapımına 1991 yılında başlanılmış ve 1992 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Bina kaloriferli olup, bitişğindeki kaymakam konutunun kalorifer ısısı bu binadan sağlanmaktadır.

c) HASTANE YERİ ARSASI:

İlçenin Cinci Mahallesi, Kâfir Türbesi mevkiinde bulunan ve tapunun 109 ada, 255, 256, 258, 260, 262, 264 ve 266 nolu parsellerinde kayıtlı toplam 3.306,07 m² yüzölçümlü taşınmaz mal, ilçeye hastane yapılmak amacıyla 1996 yılında Özel İdarece kamulaştırılmıştır.

d) HÜKÜMET KONAĞI ARSASI:

İlçenin Cinci Mahallesinde bulunan ve tapunun 109 ada, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 152, 254, 261, 265 ve 267 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazdan 3.595,76 m²lik kısmı, ilçeye yapılacak Hükümet Konağı için İlimiz Özel İdaresince tamamı (11 parça) 17.978,80 TL bedel üzerinden kamulaştırılmak suretiyle alınmış olup, bu paranın 7.978,80 TL ilçe halkından bazı vatandaşlarca HİBE olarak İlimiz Özel İdaresine ödenmiştir. (Kamulaştırmaya ilişkin İl Encümeni kararı 09 Temmuz 2001 gün ve 265 sayılıdır.)

GEMERЕК

a) ÖZEL İDARE İŞ HANI:

Gemerek, Merkez İlçe Bahçeli Mahallesi, Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve Gemerek Belediyesine ait arsa üzerine, kat karşılığı olarak, zemin dahil 4 katlı olarak yapılan Özel İdare İşhanı binası İl Encümeninin 26 Mart 2003 tarih ve 46 sayılı kararıyla, Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi adına tahsis edilmiştir.

b) TARLA:

Gemerek İlçesi, Eğerci Kasabasında bulunan ve 50/178 hissesi (50 dönüm) İlimiz Özel İdaresine ait tarla mevcut olup, bu tarlanın yola bakan kısmından 10 dönümlük yer ağaçlandırılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilmiştir. (Tahsis edilen 10 dönümlük yerin tamamı İdaremize ait olmayıp, müştereken tahsisi söz konusudur.)

GÖLOVA

a) KAYMAKAM KONUTU:

Gölova'nın 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmasından sonra, Özel İdare hizmet binasıyla birlikte, aynı yıllarda Kaymakam Konutu da yapılarak hizmete girmiştir. 3 katlı olarak yapılan binanın zemin katı Kaymakamlık ile Özel İdare Müdürlüğü hizmet büroları olarak hizmet vermektedir, diğer iki katta 4 adet konut bulunmaktadır.

b) ESKİ TAŞ BİNA:

Gölova, Merkez İlçe, Aşağı Camii Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve tapunun 123 ada 3 nolu parselinde kayıtlı olan eski taş bina, yıllarca Jandarma Komutanlığının hizmetlerine verilmiş, halen boş olup, ilçe lisesi olarak kullanılmak üzere çalışmalar devam etmektedir.

c) HASTANE YERİ ARSASI:

Merkez İlçe, Cumhuriyet Caddesi üzerinde ve tapunun 106 ada, 11 parselinde kayıtlı 3.889,97 m² alanlı taşınmaz; ilçeye hastane yapılması gayesiyle Bekir ÇOLAKOĞLU tarafından 1993 yılında HİBE edilmiş ve arsanın üzerine hastane binası yapılmıştır.

d) ARSA:

Merkez İlçe, Fevzi Çakmak Mahallesi, Ulubey Caddesi üzerinde bulunan ve tapunun 186 ada, 3 parselinde kayıtlı 811,71 m² arsa vasfında taşınmaz bulunmaktadır.

GÜRÜN

a) ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI:

Gürün İlçesi, Merkez Ketençayırı mevkiindeki 1.092 m alanlı taşınmazın üzerine, zemin

katında Özel İdare hizmet büroları, diğer iki katında 4 adet konutun bulunduğu Özel İdare hizmet binası 3 katlı olarak yapılmış ve daha sonra en üst katta bulunan 2 adet konut birleştirilerek, kaymakam konutuna dönüştürülmüştür. Bina kaloriferlidir.

b) BİNA VE ARSA:

Gürün Merkez İlçe, Burçevi Mahallesi, Tapir yöresinde bulunan 7.772 m² alanlı taşınmaz mal; üzerinde alt katı hizmet binası, diğer iki katında 4 adet konutun bulunduğu 3 katlı bina ile yanındaki çelik kontriksiyonlu hangar, Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden satın alınmıştır.

1997 yılında bu arsa iki parçaya ifraz edilmiş, bunlardan 5.465,83 m² yüzölçümlü olan arsa üzerine İlçe Devlet Hastanesi yapılmaktadır ve inşaat devam etmektedir. Diğer tarafta kalan sobalı binadaki 4 adet konut kiraya verilmiştir.

Sobalı 4 adet konut ve aynı yerdeki depo 2005 yılında satışa çıkartılmış, alıcı çıkmamıştır.

Merkez İlçe, Fettahağa Mahallesinde 839,29 m² alanlı arsa bulunmaktadır. Bu taşınmaz 1959 yılında 10.773 lira bedelle satın alınmıştır.

Merkez İlçe, Sadık ağa Mahallesi, Pınar önü mevkiinde 100 m² alanlı arsa bulunmakta olup, bu taşınmaz (Ahrır Binası) 1936 yılında satın alınmıştır.

Merkez İlçe, Burç evi Mahallesinde, 30 Yataklı Devlet Hastanesinin yapıldığı 5.456,83 m² alanlı taşınmaz, üzerine yapılan binanın cins tashihiinin yapılmamış olması nedeniyle tapu kayıtlarında arsa olarak yer almaktadır

c) GÖKPINAR GÖLÜ YANINDAKİ TAŞINMAZ VE TESİSLER:

Gürün İlçesi, Yelken Köyü sınırları içerisinde ve ilçeye 17 Km. mesafede bulunan Gürün Gökpınar Gölü ve civarında, ilimiz Özel İdaresine ait basit tarzda lokanta, gazino gibi yapılar bulunmakta ve bunların bulunduğu yerde 5 parçada toplam 20.993 m² tarla-çayır vasıflı taşınmaz bulunmaktadır. lokanta ve gazino binasının bulunduğu yerdeki taşınmazların sınırı Ankara Üniversitesi ile ihtilaflıdır. (Buradaki Tesisler Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliğine İl Daimi Encümeninin 16 Ekim 2002 tarih ve 391 sayılı kararıyla (birinci yıl 100 milyon TL diğer yıllar % 50 artırılmak üzere) 5 yıl süreyle tahsis edilmiştir.

HAFİK

a) KAYMAKAM KONUTU:

İlçenin Çay Mahallesindeki 717 m² alanlı taşınmazın üzerine yapılan kaymakam konutu, müstakil, tek katlı ve kaloriferlidir.

b) KORU IRMAĞI YÖRESİNDE TARLALAR:

Hafik Merkez ilçe, Kuru Irmağı yöresinde ve 298 ada içerisinde bulunan 16 parçada toplam 65.952,37 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz mallar; hazır beton üretim tesisleri yapılması amacıyla 1994 yılında kamulaştırılmıştır. Tarlalar halen boş durmaktadır. (2005 yılında satışa çıkartılmış, ancak talipli çıkmadığından satış gerçekleştirilmemiştir.)

KANGAL

a) ÖZEL İDARE İŞHANI (HÜKÜMET KONAĞI) :

İlçenin İstasyon Caddesi üzerindeki Maliye Hazinesine ait arsa üzerine 1988 yılında yapımına başlanılan Özel idare İş Hanı; 1990 yılında tamamlanmıştır. Bina üç katlı olup tamamında 50 adet büro bulunmaktadır. Bina halen resmi kurumların icarında ve ilçe hükümet konağı olarak kullanılmaktadır.

b) KAYMAKAM EVİ :

Merkez İlçe, Köyönü mevkiinde bulunan 10.770 m² alanlı taşınmazın bir bölümü üzerine yapılan kaymakam konutu, müstakil ve kaloriferlidir.

c) ÜÇ KATLI BİNA:

Merkez İlçe, Reşadiye Mahallesi'nde bulunan zemin dahil 3 katlı kaloriferli bina 1980 yılında yapılmıştır. 09 Aralık 2004 tarih ve 430 sayılı İl Encümeni kararıyla, sosyal market olarak kullanılmak üzere İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmiştir.

d) ESKİ KAYMAKAM KONUTU:

Merkez İlçe, Sularbaşı Mahallesi, Çarşı içi mevkiinde bulunan ve 441,08 m² alanlı taşınmazın üzerine yapılan Kaymakam eski konutu, sağlık ocağı olarak kullanılmak üzere 5 yıl süreyle Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

e) BALIKLI KAPLICA TESİSLERİ:

Kangal İlçesine bağlı Kavak Köyü sınırları içerisinde bulunan Balıklı Kaplıca Termal suyu ve tesisleri 41.659 m² alanlı taşınmazın içerisinde yerleşmiş durumdadır. Tesisler 07.06.1995 – 06.06.2025 yılları arasını kapsayan 30 yıllık dönem için Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde kiraya verilmiş, 2001 yılı sonu itibarıyla kiracı taahhüt ettiği işleri bitirmiştir. 2006 yılı kirası 27.500,00 TL' dir.

f) ARSA:

Merkez Hase Mahallesi'nde bulunan 6.000 m² alanlı tarla vasıflı taşınmaz; Gülbahar HATİP isimli vatandaş tarafından 1994 yılında hastane yapılması için bağışı nedeniyle alınmıştır. Kadastro tespiti neticesinde 12.000 m² ye çıkan taşınmazın tespit davası açılmış ve dava devam etmektedir.

Merkez İlçe, Sularbaşı Mahallesi, Deligaziliyolu mevkiinde bulunan 5.244 m² alanlı taşınmaz mal, okul yapılması için Kangal Hayırsever Derneği tarafından hibe edilmiştir.

İlçeye bağlı Alacahan Kasabası içerisinde bulunan 4.524,85 m² alanlı taşınmaz mal okul yapılması kaydıyla Alacahan Beldesi Ortaokul Koruma ve Lise Yaptırma-Yaşıatma Derneği tarafından İl Özel İdaresi adına hibe edilerek, 2000 yılı itibarıyla İdare adına tapu tescili yapılmıştır.

KOYULHISAR

a) ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI:

Koyulhisar İlçesi, Merkez Camikebir Mahallesi, Helvalı mevkiinde bulunan 580,57 m² alanlı taşınmazın üzerine 3 katlı olarak yapılan binanın zemin katında Özel İdare hizmet büroları, 1. katında 2 adet konut, 2. katında ise 2 konutun birleştirilmesiyle kaymakam konutu meydana getirilmiştir. Bina 1992 yılında tamamlanarak, hizmete girmiş olup, kaloriferlidir.

SUSEHİRİ

a) ÖZEL İDARE İŞ HANI

Suşehri İlçesi Merkez Gönüloğlu Mahallesi, Sivas Caddesi üzerindeki 36 ve 40 nolu parseller üzerine yapılan Özel İdare İş Hanı; A-B-C Blok ve zemin dahil 5 katlı olarak projelendirilmiş, ancak A Blokun üzerine zemin dahil 5 katlı bina yapılmış diğer blokların üzerine ise bir kat yapılmıştır.

A Blok Zemin dahil 5 katlı binanın, zemin katında 10 adet dükkan ile diğer 4 katta 40 adet büro, B Bloкта 10 adet dükkan ve C Bloкта da 8 adet dükkan olmak üzere binanın tamamında 28 adet dükkan ve 40 adet büro mevcuttur. İş hanının yapımına 1984 yılında başlanılmış ve 1985 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir.

Bina yapılırken Suşehri Belediyesi ile hazinenin arsalarına tecavüz edildiği için bu arsalar 2003 yılında satın alınmış olup, binanın kat mülkiyeti kurulmuştur.

İş hanının zemin katında bulunan 29 adet işyerinin 22 adedi 2004 ve 2005 yılları içerisinde

satılmış, tapu devirleri sağlanmış, ancak satışı yapılan ve ita amirince ihale kararı onaylanmayan 7 işyeri mahkeme konusu olmuş, konu 2005 yılı sonu itibariyle Danıştay'da dır .

İş hanı binasının A bloku üzerinde bulunan 4 katta toplam 40 adet büro, İl Encümeninin 10 Eylül 2003 tarih ve 330 sayılı kararıyla; öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesine tahsis edilmiştir.

SARKISLA

a) ÖZEL İDARE İŞ HANI:

Şarkışla Merkez İlçe, Kayalıyokuş Mahallesiinde bulunan iş hanı; 1.373,16 m² taşınmazın üzerine yapılmıştır. İş hanı zemin dahil 4 katlıdır. Zemin katta bulunan dükkanlar ile konutların tamamı satılmış, diğer katlarda ise toplam olarak 18 adet büro kalmıştır. Bunların da satışı yapılacaktır. Ayrıca bir de soğuk hava deposu bulunmaktadır.

b) KAYMAKAMLIK KONUTU:

Merkez Kayalıyokuş Mahallesiinde 1.027 m² alanlı taşınmazın içerisine yapılan kaymakam konutu müstakil ve kaloriferlidir.

Kaymakamlık eski konutu: Merkez İlçe, Hükümet Konağı yanında bulunan kaymakam eski konutu 779 m² alanlı taşınmazın içerisine yapılan ve boş olan konut, 2005 Şarkışla Köylere Hizmet Götürme birliğince Gençlik Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

c) ŞEMİ EFENDİ KONAĞI:

Şarkışla İlçe Merkezinde bulunan ve 234 ada, 37 parselde 1286 m² alanlı avlulu ahşap yapılı olan Şemsi Efendi Konağı, 06.06.2006 tarih ve 50 sayılı İl Encümeni kararıyla 3 adet konut karşılığında mülk sahiplerinden takas yoluyla alınmıştır.

A R S A L A R:

<u>Mahalle</u>	<u>Mevkii</u>	<u>Pafta</u>	<u>Ada</u>	<u>Parsel</u>	<u>Hisse</u>	<u>Alanı</u>
1-Kayalıyokuş	Konakçayı Kenarı	37	227	3	½	786,90
2-Yukarı	Dolay	31	55	131	Tam	1.702,00
3-Yukarı	Kale	31	52	5	Tam	4.660,00
4-Yukarı	Kale	74	380	10	Tam	575,09

ULAS

a) ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE LOJMANLAR:

Ulaş'ın 09.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla İlçe olmasından sonra, bu ilçeye ilimiz Özel İdaresince zemin katı hizmet büroları, diğer iki katında 4 adet konutun bulunduğu 3 katlı Özel İdare hizmet binası ve bu binanın bitişiğine de müstakil kaymakamlık konutu yapılmıştır.

Binanın yapımına 1991 yılında başlanmış, 1992 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Zemin katında halen İlçe Emniyet Amirliği hizmetlerini yürütmekte olup, kaloriferli olan binanın kalorifer tesisatı kaymakam konutu ile müşterektir.

b) ULAŞ İŞ MERKEZİ:

İlçenin Esentepe Mahallesiindeki 1634,10 m² alanlı taşınmazın üzerine 2 katlı olarak yapılan Ulaş İş Merkezinin zemin katında 11 adet dükkan, birinci katında ise 20 adet büro bulunmaktadır. Büroların tamamı Kaymakamlık, Milli Eğitim ve Tapu gibi kamu kurumlarının hizmetine verilmiş, dükkanlar ise özel kişi ve kuruluşlara kiraya verilmiştir. Binanın 634 sayılı kanun uyarınca kat mülkiyeti kurulmuştur.

c) ARSA:

İlçenin Yeşilyurt Mahallesiinde ve belde içi mevkiinde 3150 m² ilkokul arsası bulunmaktadır.

Bu yer; ilçenin Hürriyet mahallesinde bulunan 225 ve 395 m² alanlı kerpiç ev ve arsası vasıflı, Özel İdareye ait bitişik iki parselin, ilçe belediyesine ait yukarda belirtilen taşınmazlarla karşılıklı takası yoluyla elde edilmiştir.

YILDIZELİ

a) KAYMAKAMLIK KONUTU:

İlçenin Köyönü mevkiinde bulunan 21.128,40 m² alanlı taşınmazın içerisinde 1973 yılında yapılan kaymakamlık konutu, müstakil ve kaloriferlidir.

b) ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE LOJMANLAR:

Yıldızeli Merkez İlçe, Salıhiye Mahallesi, Aksu Yöresinde 135,11 m² alanlı taşınmazın üzerine yapılan Özel İdare hizmet binası; zemin kat dahil 3 katlıdır. Zemin kat Özel İdare hizmet binası olarak kullanılmakta ve diğer iki katta ise 4 adet konut bulunmaktadır. Bina kaloriferli olup 1990 yılında hizmete girmiştir.

c) ARSA: İlçenin Merkez M.Akif Ersoy Mahallesinde bulunan (üzerinde daha önceleri Halk Eğitim Merkezi binasının bulunduğu) 937,50 m² alanlı taşınmaz; İ.M.K. Borsasınca yapılacak okul arsası ihtiyacını karşılamak amacıyla bu taşınmaz mal Turan KARYAĞDI isimli vatandaşa ait Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, ada 106, parsel 4'de kayıtlı 7.996,15 m² arsa ile 2004 yılında takas edilmiştir.

d) TARLA 1: Merkez İlçe, Karşıyaka Mahallesi, Ortayol Mevkiinde ve ilçe kapalı spor salonunun bitişğinde, 10.104,64 m² alanlı tarla vasfında taşınmaz bulunmaktadır.

TARLA 2: İlçenin Karşıyaka Mahallesi, Karagöl mevkiinde ve ilçe kapalı spor salonunun bitişğinde 7.211,07 m² alanlı tarla vasfında taşınmaz bulunmaktadır. Bu taşınmaz mal; ilçenin Karşıyaka Mahallesinde, Karagöl mevkiinde, tapunun 140 ada, 103 parselinde kayıtlı 7211,07 m² tarla vasıflı taşınmaz mal: İl Genel Meclisinin 10 Şubat 2006 tarih ve 14 sayılı kararıyla; Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu yapılması amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 3 yıl süreli tahsis edilmiştir.

Z A R A

a) KAYMAKAM KONUTU:

İlçenin Şehitler Mahallesinde bulunan ve Maliye Hazinesine ait 303 ada, 284 no'lu parselde kayıtlı 8.585,67 m² alanlı taşınmazın içerisinde İlimiz Özel İdaresince yapılan kaymakam konutu müstakil ve kaloriferlidir. Konutun yapımına 1995 yılında başlanmış, 1998 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir.

b) ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI VE LOJMANLAR:

Merkez İlçe, Şehitler Mahallesi, 2 no'lu Devlet Yolu üzerindeki 564 m² alanlı taşınmazın üzerine yapılan Özel İdare hizmet binası ve lojmanların bulunduğu bina, zemin dahil 3 katlı olup zemin katta hizmet büroları, diğer iki katta 3 adet konut bulunmaktadır. Binanın yapımına 1986 yılında başlanmış ve 1988 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir.

c) ARSA:

İlçenin Kızılırmak Mahallesi, Kasabaönü mevkiinde bulunan 4.271 m² alanlı taşınmaz malın üzerine Bakım Evi tesisleri yapılmış bulunmaktadır.

5.2. İl Özel İdaresi Makine Parkı

İlimiz Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ödenek cetveli ve çeşitli hizmetlerde kullanılan makine parkı, makine cinsi, araçların marka, modeli ve makine parkının yaş durumu itibariyle ilgili tablolar, aşağıya çıkarılmıştır.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÖDENEK CETVELİ

S.NO	HESAP ADI	ÖZEL İDARE ÖDENEK (TL)	KÖYDES ÖDENEK (TL)
1	SİGORTA GİDERLERİ	100.000,00	0,00
2	TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİ	350.000,00	0,00
3	DİĞER TAŞIMA GİDERLERİ	836.051,83	0,00
4	AKARYAKIT VE YAĞ ALIMİ	5.805.200,29	308.260,37
5	MAKİNE TEÇHİZAT VE BAKIM ONARIM	2.028.067,09	0,00
6	YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	6.360,51	0,00
7	KARA TAŞITI ALIMLARI	250.000,00	0,00
8	İLAN GİDERLERİ	10.000,00	0,00
9	DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMLARI	200.000,00	0,00
GENEL TOPLAM		9.585.679,72	308.260,37

2012 YILI SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GENEL MAKİNE PARKI

S.NO	MAKİNA CİNSİ	TOPLAM	S.NO	MAKİNA CİNSİ	TOPLAM
1	OTOMOBİL	21	21	ASFALT YAP. DİSTİRİBÜTÖRÜ	8
2	ÇİFT ŞOFÖR MAHALLİ PICK-UP	34	22	SU TANKERİ	2
3	ARAZİ BİNEK (SUV ARAÇ)	1	23	VİDANJÖR	1
4	KAMYONET (KAPALI KASA)	3	24	SONDAJ MAKİNESİ	2
5	MİNÜBÜS	5	25	KOMPRESÖR	2
6	OTOBÜS	1	26	VAGONDİRİL	2
7	SEYYAR TAMİR ARACI	1	27	MOBİL VİNÇ	1
8	SABİT KASALI KAMYON	4	28	FORKLİFT	3
9	KAR BIÇAKLI DAM. KAMYON	10	29	TRAKTÖR	4
8	DAMPERLİ KAMYON	48	30	CENAZE NAKİL ARACI	1
10	GREYDER	44			
14	LASTİK TEK.EXCAVATÖR	4			
13	PALETLİ EXCAVATÖR	6			
11	DOZER	15			
12	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	20			
15	SİLİNDİR	12			
22	KAR MAKİNASI	4			
29	LEVHA DİREĞİ ÇAK. MAKİNASI	1			
17	TREYLER ÇEKİCİ	5			
20	AKARYAKIT TANKERİ	2			
TOPLAM		241	TOPLAM		26
GENEL TOPLAM					267

**SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE
PARK DURUMU**

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	ADEDİ
OTOMOBİL	MURAT	131-KARTAL	2
	DOĞAN	SLX	4
	DOĞAN	SL	1
	TOYOTO	COROLLA TERRA 1.6	4
	TOYOTO	AVENSİS ST 220 L	2
	TEMPRA	S	1
	RENAULT	19 AVRUPA-LATITUDE	2
	MERCEDES	S 350 L	1
	FORD	FOCUS-MONDEO	2
	HONDA-CİVİC	ACCORD SEDAN 2.0	1
	PEUGEOT	508 SEDAN	1
TOPLAM			21
PICK-UP	FORD	RANGER 4*2 STD	4
	ISUZU	TFS 54 H-20(4*4)	10
	NISSAN	NAVARA	20
TOPLAM			34
ARAZİ BİNEK (SUV)	NISSAN	X-TRAIL	1
TOPLAM			1
KAMYONET (KAPALI KASA)	LAND LOVER	4x4	1
	FORD TRANSİT	LCY	1
	MERCEDES	VİANO	1
TOPLAM			3
MİNİBÜS	FORD	TRANSİT LCY-330S	5
TOPLAM			5
OTOBÜS	İVECO	FI MI DI	1
TOPLAM			1
SEY.TAMİR ARACI	MERCEDES	UNIMOG U 1550 L37	1
TOPLAM			1
SABİT KASALI KAMYON	FATİH	280	3
	MERCEDES	2528	1
TOPLAM			4
KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAMYON	MAN	18.220 FAX	5
	MERCEDES	3340 K	5
TOPLAM			10
DAMPERLİ KAMYON	MERCEDES	3031 K / 3029 K	20
	FATİH	145-22 / 180	14
	FATİH	170-25 / 280	14
TOPLAM			48
GREYDER	KOMATSU	GD-655-A	11
	MİTSUBİSHİ	MG-530	14
	KOMATSU	GD.675.5	5
	VOLVO	G 940	14
TOPLAM			44

**SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE
PARK DURUMU**

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	ADEDİ
LAS.TEK. EXCAVATÖR	HİDROMEK	HMK-100-S/101-S	2
	HİDROMEK	HMK-102-S	2
TOPLAM			4
PAL. EXCAVATÖR	HİTACHİ	EX-220	1
	HİDROMEK	EXC	2
	HİDROMEK	HMK-220 LC	2
	VOLVO	EC 240 C	1
TOPLAM			6
DOZER	FİAT	FD-20	1
	CATERPILLAR	D-7-G	14
TOPLAM			15
LAS.TEK YÜKLEYİCİ	CATERPİLLER	936 F	2
	ÇUKUROVA	840C	2
	KOMATSU	WA320.3 / WA 320.5	11
	KOMATSU	WA-320.6	5
TOPLAM			20
DEM.BANJ.SİLİNDİR	KOMATSU	JV-100	2
	HAMM	2420-D	6
	HAMM	HD+110 VV	2
TOPLAM			10
LAS.TEK.SİLİNDİR	BOMAK	BW 24 R	2
TOPLAM			2
KAR MAKİNASI	UNIMOĞ SCHMİDT	SUPRA 2000 - 4000	4
TOPLAM			4
LEVHA DİREĞİ ÇAKMA MAKİNESİ	FATİH	180	1
TOPLAM			1
TREYLER ÇEKİCİ	NISSAN	CWA-45-HTL	1
	MERCEDES	2628-S	1
	MAN	33.420 A / 33.480 TGS	3
TOPLAM			5
AKARYAKIT TANKERİ	FATİH	145-22/180	2
TOPLAM			2
ASFALT YAPIM DİSTİRİBÜTÖRÜ	FATİH	145-22 / 220-26 / 280	6
	MERCEDES	2640 CL	2
TOPLAM			8
SU TANKERİ	FATİH	280	2
TOPLAM			2
VİDANJÖR	BMC PROFESYONEL	PRO 827	1
TOPLAM			1
SONDAJ MAKİNA	INGERSOLL- RAND	T4W-6X4	1
	ACKER	MARK-111	1
TOPLAM			2

**SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE
PARK DURUMU**

CİNSİ	MARKASI	MODELİ	ADEDİ
KOMPRESÖR	ATLAS	A-125/175	1
	AGIRMAN	M-70	1
TOPLAM			2
VAGONDİRHİL	FURUKOVA	HCR-9-EDS	2
TOPLAM			2
MOBİL VİNÇ	SUMOTOLİNG	HC 77 S	1
TOPLAM			1
FORKLİFT	MANİTOU	MT 732	1
	KOMATSU	FD30HT-17	1
	MANİTOU	MT 1440	1
TOPLAM			3
TRAKTÖR	FORD 3000		1
	FORD 7000		1
	STEYR		1
	TÜMOSAN		1
TOPLAM			4
CENAZE NAKİL ARACI	FORD	TRANSİT 350 L VAN	1
TOPLAM			1

**AKARYAKIT TÜKETİMİ
(2011 - 2012 YILLARI)**

S.NO	AKARYAKIT CİNSİ	TÜKETİLEN MİKTAR		TUTARI (TL)	
		2011	2012	2011	2012
1	MOTORİN Litre	1.571.402	1.632.153	5.011.820,00	5.920.473,69
2	BENZİN Litre	27.786	25.726	101.100,00	100.397,51
3	MADENİ YAĞ Kg.	25.125	29.470	111.421,00	128.964,04
4	HİDROLİK YAĞ Kg.	8.320	8.503	41.040,00	43.071,50
5	GRES YAĞ Kg.	892	986	3.515,51	4.460,33
6	ANTİFİRİZ Kg.	2.826	3.191	9.829,00	13.389,74
7	FUEL-OİL Kg.	110.880	109.910	244.050,00	259.729,99
8	AD.BLUE (Katkı) Lt.	6.668	6.750	8.183,00	8.261,44
TOPLAM				5.494.022,51	6.478.748,24

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
01.01.2013 TARİHİ İTİBARIYLA MAKİNA PARKI YAŞ DURUMU

S.NO	MAKİNANIN		MAKİNALARIN YAŞ DURUMU			
	CİNSİ	MİKTARI	(01-10)Yaş	%	(11-Yukarı)	%
1	OTOMOBİL	21	10	48	11	52
2	ÇİFT ŞOF.MAHALLİ PİÇK-UP	34	24	71	10	29
3	ARAZİ BİNEK (SUV ARAÇ)	1	1	100		
4	KAMYONET (Kapalı Kasa)	3	2	67	1	33
5	MİNÜBÜS	5	4	80	1	20
6	OTOBÜS	1	1	100		
7	SEYYAR TAMİR ARACI	1			1	100
8	SABİT KASALI KAMYON	4	4	100		
9	KAR BIÇAKLI DAM.KAMYON	10	5	50	5	50
10	DAMPERLİ KAMYON	48	28	58	20	42
11	GREYDER	44	19	43	25	57
12	LASTİK TEK. EXCAVATÖR	4			4	100
13	PALETLİ EXCAVATÖR	6	5	83	1	17
14	DOZER	15			15	100
15	LASTİK TEK. YÜKLEYİCİ	20	10	50	10	50
16	SİLİNDİR	12	4	33	8	67
17	KAR MAKİNASI	4			4	100
18	LEVHA DİREĞİ ÇAK. MAKİNESİ	1	1	100		
19	TREYLER ÇEKİCİ	5	2	40	3	60
20	AKARYAKIT TANKERİ	2	1	50	1	50
21	ASFALT YAP. DİSTRİBÜTÖRÜ	8	5	63	3	37
22	SU TANKERİ	2	2	100		
23	VİDANJÖR	1	1	100		
24	SONDAJ MAKİNASI	2			2	100
25	KOMPRASÖR	2			2	100
26	VAGONDİRİL	2			2	100
27	MOBİL VİNÇ	1		-	1	100
28	FORKLİFT	3	3	100		
29	TRAKTÖR	4			4	100
30	CENAZE NAKİL ARACI	1	1	100		
TOPLAM		267	133	49,81%	134	50,19%

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
MAKİNE FAALİYET DURUMU
(01.01.2012 – 31.12.2012 TARİHİ İTİBARIYLA)

MAKİNEİN CİNSİ	MAKİNEİN DURUMU			TOPLAM ÇALIŞTIĞI	TOPLAM TÜKETTİĞİ	ORTA.YAKIT (Lt/h-km)	ORT.ÇAL.(h/ay)	YILLIK RANDIMAN (%)	ŞOF/OPRT OLMAYAN ARAÇ.TOP
	T	F	A	SAAT (h)	YAKIT (Lt)				
DOZER	15	13	2	7.176	227.083	31	598	40	2
GREYDER	44	40	4	30.096	539.725	17	2.508	57	4
YÜKLEYİCİ (LOD.)	20	18	2	16.678	264.174	15	1.389	70	2
KOMPRESÖR	2	2	-	-	-	-	-	-	-
SİLİNDİR	12	10	2	1.721	17.574	10	143	18	2
EXCAVATÖR	10	8	2	3.591	46.062	12	299	36	2
VAGON DRİLL	2	2	-	175	2.297	13	14	11	1
KAR MAKİNESİ	4	3	1	767	17.270	22	63	32	-
ARA TOPLAM	109	96	13	60.204	1.114.185	-	-	-	13
KAMYON	63	59	4	1.112.216	420.076	0,4	92.684	64	6
TREYLER ÇEKİCİ	5	4	1	104.088	56.474	0,5	8.674	87	1
TANKER/DİST/AKY/SU	10	7	3	338.709	133.609	0,4	28.225	123	3
ARA TOPLAM	78	70	8	1.555.013	610.159	-	-	-	10
GENEL TOPLAM	187	166	21		1.724.344	-	-	-	23
	T	:	TOPLAM						
	F	:	FAAL						
	A	:	ARIZALI						

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ANA İŞ MAKİNELERİNİN 2012 YILINDA AYLARA GÖRE ÇALIŞMA VE RANDIMANINI
GÖSTERİR TABLO

Aracın Cinsi	Araç Sayısı	Birimi	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Toplam Randıman
Dozer	15	Çalışma h/ay	551	1029	1369	295	159	586	555	553	742	521	461	355	7176
1200 saat/yıl		Ay.Ran.%	37	68	105	27	13	49	43	46	53	44	39	28	40
Greyder	44	Çalışma h/ay	3257	4711	3421	1134	992	2261	3209	2370	1902	1978	1957	2904	30096
1200 saat/yıl		Ay.Ran.%	98	142	126	40	39	87	89	70	56	60	61	80	57
Yükleyici	20	Çalışma h/ay	1941	2622	3271	725	705	866	1060	1034	1159	858	1184	1253	16678
1200 saat/yıl		Ay.Ran.%	107	145	192	45	40	51	53	58	61	48	52	69	70
Kompresör	2	Çalışma h/ay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
800 saat/yıl		Ay.Ran.%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Silindir	12	Çalışma h/ay	-	-	17	53	130	225	325	267	309	236	152	7	1704
800 saat/yıl		Ay.Ran.%	-	-	25	8	22	42	61	67	48	40	46	10	18
Excavatör	10	Çalışma h/ay	69	156	189	325	456	459	320	301	421	337	422	136	3591
1000 saat/yıl		Ay.Ran.%	8	17	75	40	61	69	64	45	63	50	64	23	36
Vagondrill	2	Çalışma h/ay	-	-	-	-	30	65	20	10	5	20	17	8	175
800 saat/yıl		Ay.Ran.%	-	-	-	-	45	98	30	15	8	15	26	12	11
Kar Makinası	4	Çalışma h/ay	224	299	150	25	-	-	-	-	-	-	22	47	767
600 saat/yıl		Ay.Ran.%	112	149	100	50	-	-	-	-	-	-	44	31	32
Kamyon	63	Çalışma h/ay	56686	69772	64278	45947	52452	107998	153735	148672	151428	119054	101627	40567	1112216
27500 km/yıl		Ay.Ran.%	39	48	56	35	46	87	117	109	112	94	85	33	64
Treyler Çekici	5	Çalışma h/ay	3333	6652	7148	10290	5934	7657	8957	12540	16444	7468	9480	8185	104088
30000 km/yıl		Ay.Ran.%	45	88	95	137	79	102	119	167	219	99	126	109	87
Tanker	10	Çalışma h/ay	8394	16309	27269	38269	36235	37563	37508	37860	45096	15113	13335	25758	338709
27500 km/yıl		Ay.Ran.%	61	118	198	278	263	273	272	275	328	109	97	187	123

**2011 - 2012 YILINDA YEDEK PARÇA AMBARINA ALINAN
MALZEME TUTARI**

S.NO	MALZEMEYİ ALAN	2011 YILI	2012 YILI
		ALINAN MAL TUTARI (TL)	ALINAN MAL TUTARI (TL)
1	İç Piyasa (Sivas)	463.000,00 TL	931.000,00 TL
2	Dış Piyasa (Sivas Dışı)	326.000,00 TL	625.000,00 TL
3	Devlet Malzeme Ofisi	213.000,00 TL	412.000,00 TL
TOPLAM		1.002.000,00 TL	1.968.000,00 TL

**01 OCAK - 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
(İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Atelyesinde Yapılan İşler)**

S.NO	İŞİN MAHİYETİ	ADET
1	Atelyede Tamir İşlemleri Yapılan Araçlar	618
2	Atelyede Yapılan Diğer İşler	10
3	Arazide Tamir İşlemler Yapılan Araçlar	706
4	Arzide Yapılan Diğer İşler	20
GENEL TOPLAM		1.354

2012 YILINDA KİRAYA VERİLEN ARAÇLAR VE KİRA GELİR TUTARI

S.NO	CİNSİ	ÇALIŞILAN (SAAT / KM)	TUTAR (TL)
1	DOZER	63 saat	13.600,00 TL
2	GREYDER	5 saat	1.750,00 TL
3	LAS. TEK. YÜKLEYİCİ	5 saat	750,00 TL
4	SİLİNDİR	-	-
5	EXCAVATÖR	-	-
6	HİDROMEK	-	-
7	VAGODİRİL	-	-
8	TREYLER (ÇEKİCİ)	816 km	7.728,00 TL
9	ETÜT	-	-
10	ÖNCÜ	430 km	1.790,00 TL
GENEL TOPLAM		73 SAAT / 1246 KM	25.618,00 TL



5. 3. İŞTİRAKLERİMİZ

- Sivas I. Organize Sanayi Bölgesi
- Sivas II. Organize Sanayi Bölgesi
- Gemerek Organize Sanayi Bölgesi
- Sivas Demir Çelik A.Ş.
- TES Tarım Hayvancılık Gıda Oto San. Tic . A . Ş.
- Özbelsan A.Ş
- Sidaş A.Ş.
- Sivas Tarım ve Hayvancılık Ürünleri A.Ş.
- Şarkışla Organize Sanayi Bölgesi



TES Tarım Hayvancılık Gıda Oto San. Tic . A . Ş.



Özbelsan A.Ş

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

- 2012 Yılı Harcamaları
- 2012 Yılı Bütçesi Özet Tablosu
- 2012 Yılı Faaliyet Sonuç Tablosu
- 2012 Yılında K.H.G.B.Den İlçelere Gönderilen Ödenek Tablosu

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

- Sivas İl Özel İdaresinin Diğer Sektörler İçin Yaptığı Harcamalar
- Kırsal Altyapı Çalışmaları
- İlçeler Bazında Kırsal Altyapı Faaliyetleri
- Sivas İl Özel İdaresi Tarafından Yapılan Diğer Çalışmalar


II.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ TABLOLAR

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolar

2012 Yılı Bütçemiz 22.11.2011 tarih ve 168 sayılı Meclis kararı ile 55.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Önceki yıllardan devir eden nakit ve 2012 yılı gelir fazlalığı karşılığında İl Genel Meclisinin 04.12.2012 tarih ve 153 sayılı kararıyla 5.000,000,00 TL ek ödenek ve 2011 yılından devreden 10.641.033,41 TL ile 2012 yılında toplam 70.461.033,41 TL ödenek mevcuttur. Toplam ödeneğin fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı ve yapılan harcamalar aşağıda belirtildiği gibidir.



KODU	AÇIKLAMA	FİNANSAL 5		FİNANSAL 8		CARİ YIL (2012)
		MERKEZ	İLÇELER	MERKEZ	İLÇELER	
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	16.843.086,55	2.521.013,94	46.082.266,54	6.764.290,86	72.210.657,89
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	321.575,07	0,00	5.421.376,00	0,00	5.742.951,07
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK	160.635,83	0,00	2.293.981,64	0,00	2.454.617,47
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	4.979.966,73	0,00	2.067.292,39	0,00	7.047.259,12
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	18.864.616,84	292.302,20	14.201.644,13	80.997,03	33.439.560,20
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	0,00	6.379.425,76	0,00	6.379.425,76
8	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	524.114,83	0,00	4.033.581,69	0,00	4.557.696,52
9	EĞİTİM HİZMETLERİ	8.227.446,25	417.684,05	24.399.380,25	10.428.212,56	43.472.723,11
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZM.	0,00	0,00	665.716,90	0,00	665.716,90
TOPLAM		49.921.442,10	3.231.000,19	105.544.665,30	17.273.500,45	175.970.608,04

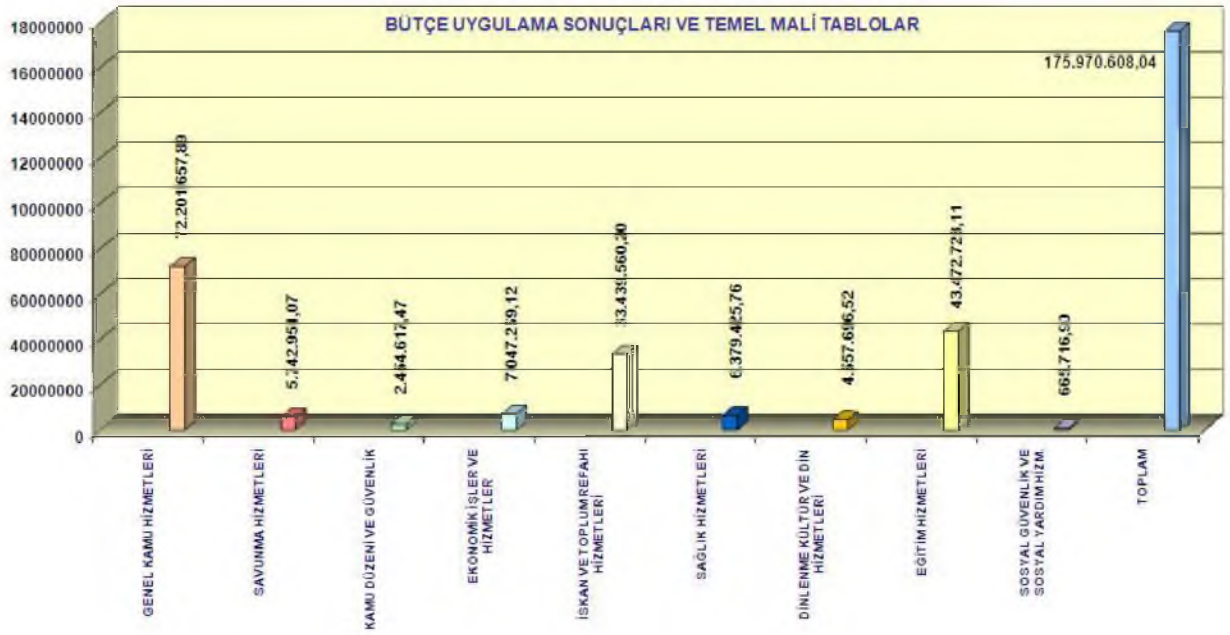

**2012 YILI BÜTÇESİNİN EKONOMİK VE FİNANSAL SINIFLANDIRMANIN
1. DÜZEY İTİBARIYLA DAĞILIMI VE YAPILAN HARCAMALAR**

KOD	AÇIKLAMA	FİNANSAL 5		FİNANSAL 8		CARİ YIL (2012)
		MERKEZ	İLÇELER	MERKEZ	İLÇELER	
01-	Personel Giderleri	6.776.919,40	1.126.238,87	38.754.566,93	6.602.650,62	53.260.375,82
02-	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prım Gideri	900.139,89	139.528,47	7.444.659,34	3.021,42	8.487.349,12
03-	Mal ve Hizmet Alım Gideri	24.866.813,64	1.919.727,59	20.695.090,49	10.632.935,81	58.114.567,53
05-	Cari Transferler	3.597.420,00	36.340,36	11.602,21	0,00	3.645.362,57
06-	Sermaye Giderleri	13.720.249,17	9.164,90	38.638.746,33	34.892,60	52.403.053,00
08-	Borç Verme	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
TOPLAM		49.921.442,10	3.231.000,19	105.544.665,30	17.273.500,45	175.970.608,04


2012 Yılı bütçesinin Ekonomik ve Finansal sınıflandırmalarının 1. Düzey itibariyle dağılımı ve yapılan harcamalar.

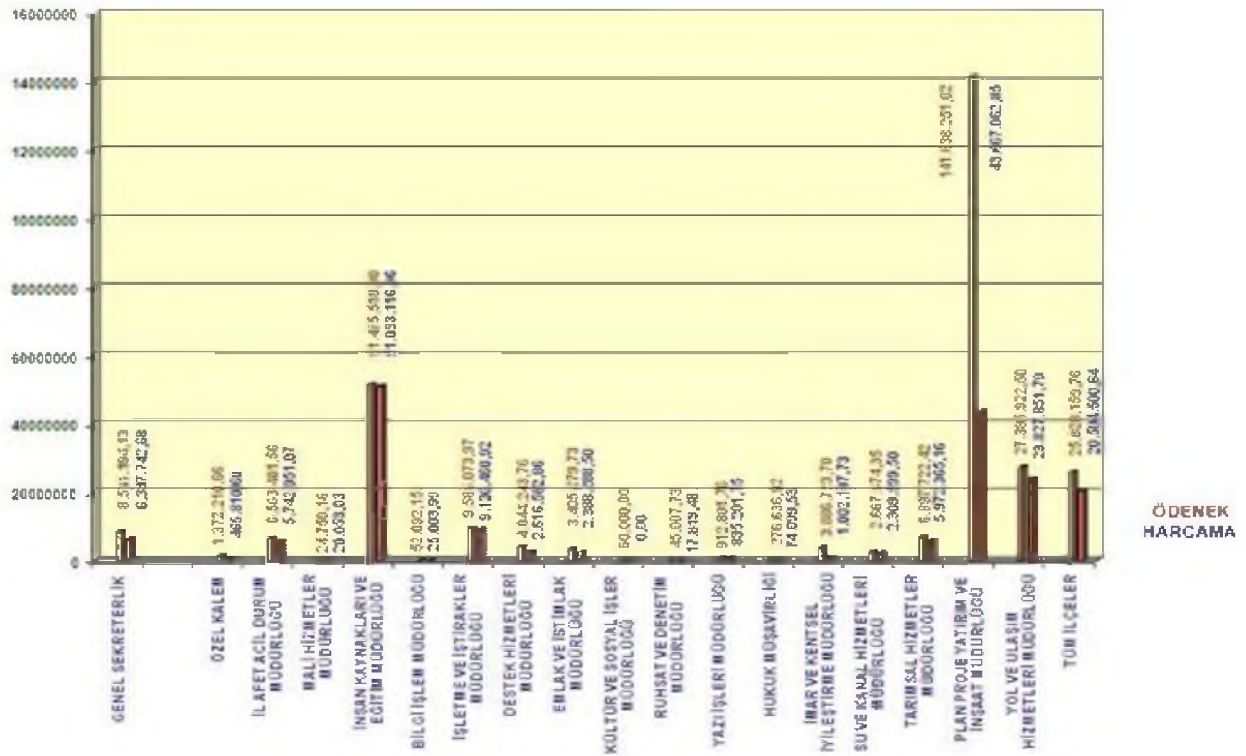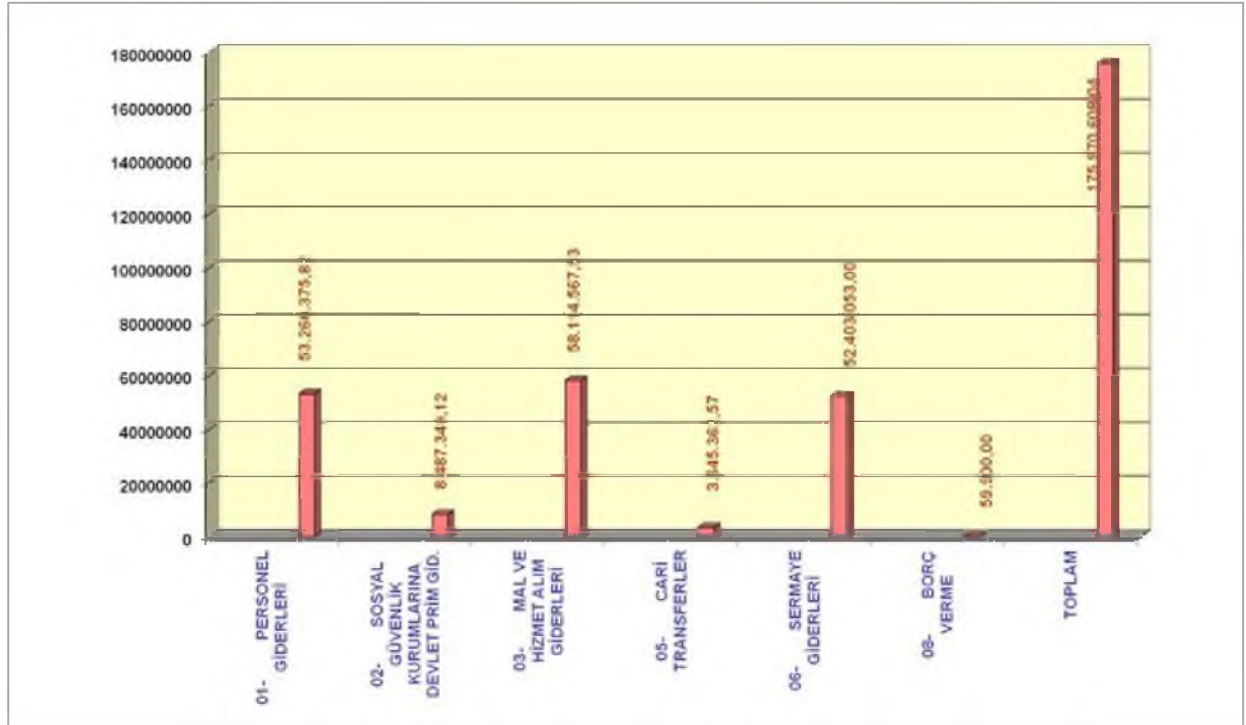

2012 YILI HARCAMALARININ BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI			
BİRİMİ	TOPLAM ÖDENEK	GÖNDERİLEN ÖDENEK	BÜTÇE GİDERİ
Genel Sekreterlik	8.541.194,13	6.429.191,02	6.347.742,68
Özel Kalem	1.372.210,66	475.327,54	465.810,60
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü	6.563.481,56	5.747.352,80	5.742.951,07
Mali Hizmetler Müdürlüğü	24.750,16	20.053,03	20.053,03
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	51.475.518,90	51.286.777,08	51.033.116,96
Bilgi İşlem Müdürlüğü	52.092,15	25.034,98	25.003,99
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	9.586.073,97	9.133.040,61	9.120.460,92
Destek Hizmetler Müdürlüğü	4.044.243,76	2.617.149,06	2.616.562,86
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3.405.279,73	2.388.288,50	2.388.288,50
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	60.000,00	0,00	0,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	45.007,73	17.819,48	17.819,48
Yazı İşleri Müdürlüğü	912.801,76	835.210,75	835.201,75
Hukuk Müşavirliği	276.636,92	74.327,53	74.099,53
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	3.886.723,70	1.002.480,17	1.002.107,73
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	2.667.674,35	2.309.599,50	2.309.599,50
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	6.897.722,42	5.972.365,16	5.972.365,16
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	141.638.251,02	47.353.663,35	43.667.062,85
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	27.385.922,50	23.829.446,79	23.827.851,79
Tüm İlçeler	25.828.159,76	25.828.159,76	20.504.500,64
TOPLAM	294.663.745,18	185.345.287,11	175.970.608,04

2012 Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi itibariyle Bütçe ile tahmin edilen ve gerçekleşen gelir miktarı aşağıya çıkartılmıştır.

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI%	BAKANLIK (Bağ.ve Yard.)
1	Vergi Gelirleri	501.000,00	386.464,38	% 103	
3	Müteşebbüs ve Mülkiyet Gelir	7.577.002,00	1.509.978,77		
4	Alınan Bağış ve Yardımlar	6,00	0,00		132.503.822,03
5	Diğer Gelirler	51.921.990,00	59.973.078,91		
6	Sermaye Gelirleri	2,00	0,00		
TOPLAM		60.000.000,00	61.869.522,06		

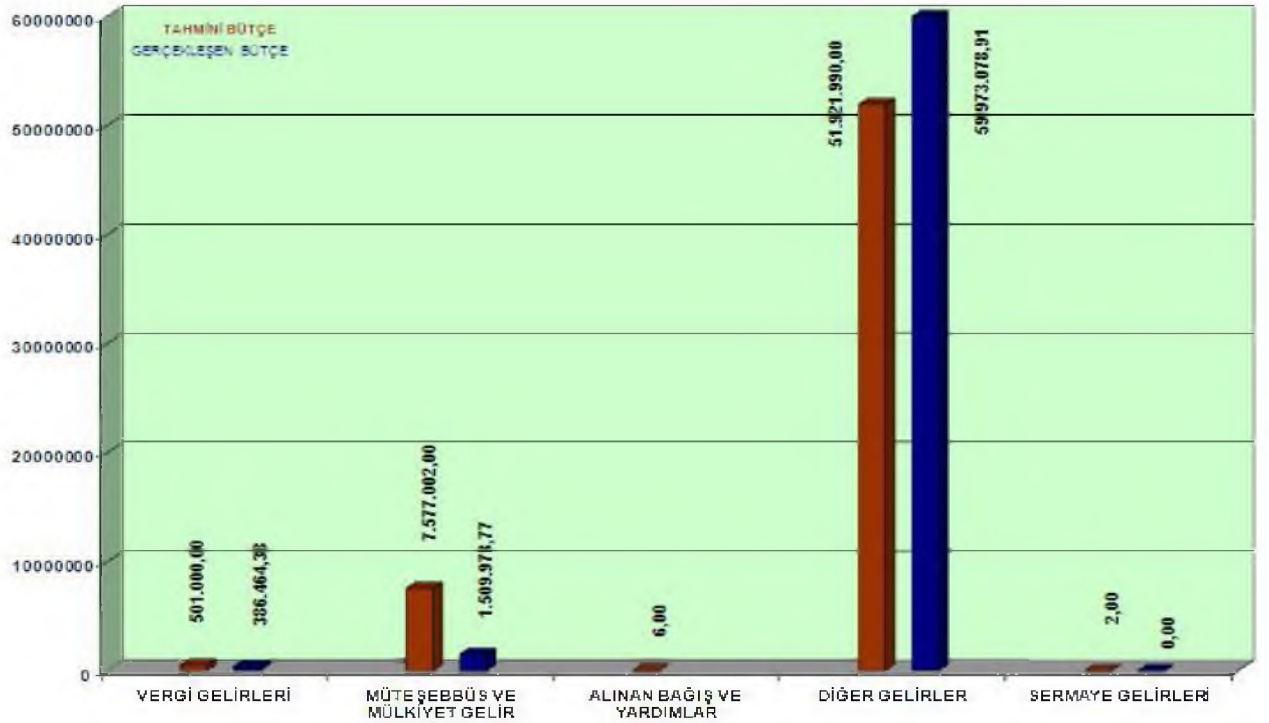

2012 Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 2.Düzeyi itibariyle Bütçe ile tahmin edilen ve gerçekleşen gelir miktarı aşağıya çıkarılmıştır.

KODU		BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	2012 YILI TAHSİLATI	TAHSİL	BAKANLIK
1 6	Harçlar	501.000,00	386.464,38	% 103	
3 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.027.001,00	69.229,24		
3 3	Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri	1,00	0,00		
3 6	Kira Gelirleri	1.550.000,00	1.440.749,53		
3 9	Diğer Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri	5.000.000,00	0,00		
4 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5,00	0,00		132.503.822,03
4 4	Kurum ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.00	0,00		
5 1	Faiz Gelirleri	7.000.000,00	9.274.273,37		
5 2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Pay	43.847.989,00	49.802.597,08		
5 3	Para Cezaları	67.000,00	210.614,66		
5 9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.007.001,00	685.593,80		
6 1	Taşınmaz Satış Gelirleri	1,00	0,00		
6 2	Taşınır Satış Gelirleri	1,00	0,00		
	TOPLAM	60.000.000,00	61.869.522,06		

2012 YILI K.H.G.B. ÖDENEK LİSTESİ		
S.NO	İLÇE ADI	MİKTARI
1	MERKEZ	424.610,00
2	AKINCILAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	93.000,00
3	ALTINYAYLA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	57.000,00
4	DİVRİĞİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	205.000,00
5	DOĞANŞAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	93.000,00
6	GEMEREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	381.585,32
7	GÖLOVA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	161.993,40
8	GÜRÜN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	310.000,00
9	HAFİK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	172.000,00
10	İMRANLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	195.113,00
11	KANGAL İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	317.000,00
12	KOYULHISAR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	195.000,00
13	SUŞEHİRİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	180.000,00
14	ŞARKIŞLA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	145.000,00
15	ULAŞ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	54.700,00
16	YILDIZELİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	161.151,48
17	ZARA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ	131.000,00
18	İLÇELER KARLA MÜCADELE	1.000.000,00
TOPLAM		4.277.153,20

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

1-SİVAS İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER SEKTÖRLER İÇİN YAPTIĞI 2012 YILI HARCAMALARI

İdaremiz Kırsal Altyapı çalışmalarının yanı sıra ilimizdeki Sosyo- Kültürel yapıyı geliştirmek ve ilerletmek amacıyla özellikle İskan toplum hizmetleri, Mobese hizmetleri, Emniyet hizmetleri, Tarım hizmetleri, Spor hizmetleri, Kültür hizmetleri, M.Eğitim hizmetleri, Sağlık hizmetleri, Sosyal Yardım hizmetleri, Çevre Orman hizmetleri, Acil Afet hizmetleri, Genel Kamu hizmetleri ve Ekonomik hizmetler alanındaki faaliyetlere büyük önem ve destek vererek bu alandaki çalışmalarımız için **Bakanlık Ödeneğinden 122.818.165,75 TL ve Özel İdare Bütçesinden 53.152.442,29 TL** olmak üzere toplam **175.970.608,04 TL** harcama yapmıştır.

KIRSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI:

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI PROGRAM VE UYGULAMALARI

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2012 yılı yatırım programında 130 km. köyyolu onarımı yer almış olup 99 km.si tamamlanmıştır. İl Özel İdaresi ve Köydes stabilize program toplamı 563 Km olup bunun 374 km.si , 346 Km kırma taştan, temel/alt temel işinin 332 km.si, 76 km birinci kat asfaltın kaplamanın 67 km.si, 270 km. ikinci kat asfalt kaplama çalışmasının 244 km.si tamamlanmıştır. Programda bulunan 102 adet sanat yapısının 77 adeti tamamlanmış bulunmaktadır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri için 2012 yılında Özel İdare bütçesinden **8.882.000,00 TL.** ödenek ayrılmıştır. Bu ödenğe ek olarak **15.147.955 TL.** ödenek sağlanmış olup toplam **24.029.955,00 TL** ödeneğimizden, **22.643.486,00 TL** harcama yapılarak, %94 parasal, %84 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yine Köydes projesi kapsamında yapılan işler için ayrılan **7.202.295,00 TL.**ödenekten bugüne kadar **6.681.646,00 TL** harcama yapılarak yaklaşık % 84 parasal gerçekleşme sağlanmış ve ayrıca ortak kullanım ödenegi olan **1.090.430,00 TL** ödenekten **1.080.120,00 TL** harcanarak % 99 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

2012 yılında köyyolarında İl Özel İdaresi ve Köydes ödeneginden toplam 30.405.525.00 tı harcama yapılmıştır.



Asfalt sathi kaplama çalışmaları



Asfalt sathi kaplama alıřmaları



Asfalt sathi kaplama alıřmaları



Kızilkavraz köprüsü



Kızilkavraz köprü çalışmaları



Kızılkavraz köprü çalışmaları

TRAFİK VE BİLGİ İŞARET İŞLERİ

Sivas İl Özel İdaresi trafik atölyesinde ki çalışmalarla; köy yollarında ki hizmet standardını yükseltmek, olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek, çalışanların verimliliğini artırmak ve devlet bütçesine katkıda bulunmak hedeflenmiştir. 2012 yılı başından bu yana trafik levha atölyesinde çeşitli nedenlerle tahrip olan 1300 adet trafik işaret levhası yenilemesi yapılmış, ayrıca 900 adet köy isim levhası, 4290 adet de trafik işaret levhası olmak üzere toplam 6490 adet muhtelif trafik uyarı ve bilgi levhası üretilerek gerekli yerlere monte edilmiştir.



Trafik işaret levha ekibi çalışmalarından görünüm



Trafik işaret levha ekibi çalışmalarından görünüm



Trafik işaret levha ekibi çalışmalarından görünüm

KİLİT PARKE ÜRETİM TESİSİ :

2012 yılı içerisinde tesisimizde 2140 ton çimento kullanılarak 101.511 m2 kilitli parke taşı üretilmiş, 98.631 m2 parkenin köylere nakli yaptırılmış olup tesisimizde halen 2880 m2 kilitli parke taşı bulunmaktadır.



Sayın Valimizin ve Genel Sekreterimizin Kilit parke üretim tesisini incelerken



Kilit parke tesislerinden bir görünüm

ASFALT PLENT TESİSİ

Asfalt plent tesislerinde 2012 yılı içerisinde 29.000 ton agrega ,1.000 ton bitüm kullanılarak 30.000 ton yama malzemesi (Rotmix) üretimi yapılarak bozuk olan köy yollarının onarımında kullanılmıştır.



Sayın Valimiz ve Genel Sekreterimizin Asfalt plent tesisindeki incelemeleri

KAR MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ

1780 adet köy ve mezrası, 29 adet beldesiyle toplam 8060 km lik kırsal yol ağı ile ülkemizin en geniş yerleşim yerine sahip illerinden biri olan Sivas'ta kış mevsimlerinde en büyük çalışmalarımızı karla mücadele çalışmaları oluşturmaktadır. Kırsalda yaşayan halkımızın ulaşımını sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Özel İdare ekipleri 2011-2012 yılı kış sezonunda, toplam 1780 köy ve mazrası ile 29 belde olmak üzere toplam 1809 yerleşim biriminde **8.884.345 TL.** harcama yapılarak, **44.485 km** karla mücadele çalışması yaparak halkımıza hizmet vermiştir.



Kar M¼cadele alıřmalarından g¼r¼n¼mler



Kar M¼cadele alıřmalarından g¼r¼n¼mler



Kar M¼cadele alıřmalarından g¼r¼n¼mler



Kar M¼cadele alıřmalarından g¼r¼n¼mler

ÖZEL İDARE KÖYYOLLARI 2012 YILI PROĞRAMI VE UYGULAMA İCMALİ

İŞİN ADI	ÖZEL İDARE						
	ÖDENEK	EK ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	PROĞRAM (KM)	UYGULAMA Km/m2/Ad.	YAKLAŞIK MALİYETİ	HARCAMASI
ONARIM				130	99		
STABİLİZE KAPLAMA				371	214		
I.KAT ASFALT (KIRMATAŞ-TEMEL/ALTTEMEL)	7,219,137	5,000,000	17,117,092	346	332	12,062,935	11,513,168
I.KAT ASFALT KAPLAMA		1,560,645		(- 35 =311)	31		
		2,837,310		36	31		
PROTOKOLLÜ I.KAT ASF. KAPLAMA		500,000					
		5,000,000	5,000,000	27.3	30.0		
II.KAT ASFALT				223	216	1,425,998	1,256,785
SANAT YAPISI (Adet)	1,152,863		1,152,863	62	42	1,215,478	1,220,088
ASFALT YAMASI				0.0	606		
KİLİT PARKE	510,000	250,000	760,000	149,800	96,000	1,623,000	1,278,360
DİĞER MAL VE HİZMET ALIMLARI						1,745,201	1,301,646
TÜPRAŞ-ASFALT ALIMI						5,700,000	5,700,000
DOĞRUDAN TEMİNLE MAL VE HİZMET ALIMI						391,673	373,440
TOPLAM	8,882,000	15,147,955	24,029,955			24,164,285	22,643,486

KÖYYOLLARI 2012 YILI KÖYDES PROGRAMI VE UYGULAMA İCMALI

İŞİN ADI	ÖDENEĞİ	PROGRAM (KM)	UYGULAMA (KM)	HARCAMA
STABİLİZE KAPLAMA	2,552,513.55	192.0	159.7	2,163,190.49
I.KAT ASFALT	1,709,391.00	39.8	35.9	1,709,391.50
II.KAT ASFALT	1,463,582.00	47.6	27.7	1,263,567.06
SANAT YAPISI	574,993.00	40	35	825,027.81
KİLİT PARKE (15 Proje)(m2)	901,815.00	55,466.00	55,466.0	720,469.75
TOPLAM	7,202,294.55			6,681,646.61

ORTAK KULLANIM ÖDENEĞİ

İŞİN ADI	ÖDENEĞİ	YAKLAŞIK MALİYETİ	İHALE BEDELİ	HARCAMASI
KORİGE BORU ALIM	360,000	348,966	306,500	357,170
TRAFİK İŞARET LEVHA ALIM	200,000	169,471	164,000	193,520
BİTÜM VE ASTAR ALIM	530,430			530,430
TOPLAM	1,090,430	518,437	470,500	1,081,120

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROĞRAM VE UYGULAMALARI

MERKEZ

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Bahçeli Mez.-Ağılkaya	5	5			Bitti
2	Kurum	Onarım	Gaziköy (Virajların düzeltilmesi)	3				Başlamadı
3	Kurum	Stabilize	Arpayazı-Eğribucak	6	5			Bitti
4	Kurum	Stabilize	Ulukapı	2	1			Bitti
5	Kurum	Stabilize	Dv.yolu-Savcun	6	2			D.Ediyor
6	Kurum	Stabilize	Bahçeli Mez.-Ağılkaya	5				Başlamadı
7	Kurum	Stabilize	Gümüşdere-Kuzören	3	3			Bitti
8	Köydes	Stabilize	Arpayazı-Eğribucak	6	5	102,000	143,740	Bitti
9	Köydes	Stabilize	Kuşlu-Yeni Kervansaray	4	3	44,000	25,960	Bitti
10	Köydes	Stabilize	Yassıcebel	4	4	68,000	101,954	Bitti
11	Köydes	Stabilize	Ulukapı	2	1	34,000	44,611	Bitti
12	Köydes	Stabilize	Dyl İlt. Savcun	6	2	102,000	58,064	D.Ediyor
13	Köydes	Stabilize	Bahçeli mezrası-ağılkaya	5		55,000		Başlamadı
14	Köydes	Stabilize	Akçamescit ky.	3		52,000		Başlamadı
15	Köydes	Stabilize	Demiryazı-Battalağlı mz.	2	2	22,000	25,960	Bitti
16	Kurum	Kırma Taş	Demiryazı-Tutmaç	4	6	222,553		Bitti
17	Kurum	Kırma Taş	Tahtıkement-Yavu	4	5	194,873	435,865	Bitti
18	Kurum	Kırma Taş	Sivritepe	2	2	70,526	75,331	Bitti
19	Kurum	Kırma Taş	Yanalak	3	2	106,452		Bitti
20	Kurum	Kırma Taş	Akkuzulu	1	2	66,923	289,331	Bitti
21	Kurum	Kırma Taş	Yıldız-Gökkaya	5	6	278,057	86,916	Bitti
22	Kurum	Kırma Taş	Hayranlı ky.	4	3	141,963		Bitti
23	Kurum	Kırma Taş	Başsöğüt	2	2	84,439		Bitti
24	Kurum	Kırma Taş	Yazıbaşı	1	2	54,728	365,205	Bitti
25	Kurum	Kırma Taş	Karalı	4	4	177,519	188,690	Bitti
26	Kurum	Kırma Taş	Himmetfakı	1	1	56,134		Bitti
27	Kurum	Kırma Taş	Bostancık	1	1	59,046		Bitti
28	Kurum	Kırma Taş	Gaziköy	1				Başlamadı
29	Kurum	I.Kat Asfalt	Kızılova-Kızılöz	4	5			Bitti
30	Kurum	I.Kat Asfalt	Başbüyük-Onbaşılar	5	-			Başlamadı
31	Kurum	II.Kat Asf.	Dy.İlt. Tepeönü-Armutlu	15	17	82,264	62,540	Bitti
32	Kurum	II.Kat Asf.	Demirçelik İlt.Doğanca-Acıpınar	12	12			Bitti
33	Kurum	San. Yap.	Gazibey	1	1	15,000		Bitti
34	Kurum	San. Yap.	Asarcık köy içi yol istinat duvarı	1	1	30,000	108,020	Bitti
35	Kurum	San. Yap.	Eski Kayseri Grb.	1	1	15,000	98,609	Bitti
36	Kurum	San. Yap.	Herekli (3x3 10 m)	1	1	30,000		Bitti
37	Kurum	San. Yap.	Savcun (3x2 10m.)	1	1	25,000		Bitti
38	Kurum	San. Yap.	Çaypınar	1	1	15,000		Bitti
39	Kurum	San. Yap.	Hocabey	1	1	15,000		Bitti

40	Köydes	San.Yap.	Emirhan	1	1	11,000	33,913	Bitti
41	Köydes	San.Yap.	Akpınar Köyü					İPTAL
42	Köydes	San.Yap.	Akçamescit					İPTAL
43	Köydes	San.Yap.	Akkoç-Gündüz Arası	1	1	11,000	37,069	Bitti
44	Köydes	San.Yap.	Kurtlapa-Asarcık	1		11,000	891	Boru Konacak
45	Köydes	San.Yap.	Savcun	1	1	11,000	20,984	Bitti
46	Köydes	San.Yap.	Kızılca köyü					İPTAL
47	Köydes	San.Yap.	Asarcık	1	1	11,000	43,578	Bitti
48	Köydes	San.Yap.	Tokuş	1	1	11,000	75,671	Bitti
49	Köydes	San.Yap.	Herekli	1	1	30,000	37,446	Bitti
50	Köydes	San.Yap.	Çaypınar	1	1	11,000	22,130	Bitti
51	Köydes	San.Yap.	Hocabey	1	1	30,000	41,604	Bitti
52	Köydes	San.Yap.	Ayli	1	1	35,000	42,298	Bitti
53	Köydes	San.Yap.	Yeni Kervansaray	1	1	11,000	74,024	Bitti
54	İll. Bank.	San.Yap.	Yaramış KY.	1	1	45,000		Bitti
55	İll.Bank	San.Yap.	Yıldız ky.	1	1	25,547		Bitti
56	Kurum	Kil.Parke	Gaziköy	7,000	7,000			Bitti
57	Kurum	Kil.Parke	Beypınarı	5,000				Başlamadı
58	Kurum	Kil.Parke	Karayün	5,000	6,000			Bitti
59	İll.Bank.	Kil.Parke	Güney ky.	1	1	36,000		Bitti
60	Kurum	Asf.Yama	Demirçelik-Doğanca ky.	13	13			Bitti
61	Kurum	Asf.Yama	Armutlu ky.	20	20			Bitti
62	Kurum	Asf.Yama	Tokuş ky.	5	5			Bitti
63	Kurum	Asf.Yama	Tugay Komutanlığı	3	3			Bitti
64	Kurum	Asf.Yama	Hasbey Tutmaç ky.	9	9			Bitti
65	Kurum	Asf.Yama	Beştepe-Küllük ky.	7	7			Bitti
66	Kurum	Asf.Yama	Kalın ky.	1	1			Bitti
67	Kurum	Asf.Yama	Yeniboğazkesen ky.	1	1			Bitti
68	Kurum	Asf.Yama	İşhan ky.	2	2			Bitti
69	Kurum	Asf.Yama	Karamehmetoğlu	3	3			Bitti
70	Kurum	Asf.Yama	Kızılkavraz ky.	5	5			Bitti
71	Kurum	Asf.Yama	Ozmuş-Zengi ky.	5	5			Bitti
72	Kurum	Asf.Yama	Olukman-Yıldız ky.	15	15			Bitti
73	Kurum	Asf.Yama	Eskikayseri grb ky.	10	10			Bitti
			TOPLAM			2,509,024	2,540,405	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROGRAM VE UYGULAMALARI

AKINCILAR

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Geyikpınar Grb yolu		3			Bitti
2	Kurum	Stabilize	Üzengi-Balçık	3	3			Bitti
3	Kurum	Stabilize	Geyikpınar Grb yolu	3	3			Bitti
4	Kurum	Kırma Taş	Sıyrındı-Abdurrahman					Başlamadı
5	Kurum	Kırma Taş	Yünlüce	4	4	193,252	122,546	Bitti
6	Kurum	Kırma Taş	A.Yeniköy-Ökçaören	3	2		105,102	Bitti
7	Köydes	I.Kat Asf.	Balçık-Sapanlı Grup Ky.	7	8	71,000	71,000	Bitti
8	Kurum	II.Kat Asf.	Şenbağlar-Doğantepe	10	11	153,761	176,122	Bitti
9	Kurum	II.Kat Asf.	Eskibağ Grb.	4	4			Bitti
10	Kurum	II.Kat Asf.	Çiçekli-Aşağı Yeniköy	6	7			Bitti
11	Kurum	San. Yap.						Başlamadı
12	İll.Bank.	Köprü	Şenbağlar Doğantepe ky.	1		40,000		Tem.Son.Yapıl.
13	Kurum	Kil.Parke	Göllüce					Başlamadı
14	Kurum	Asf.Yama	Şenbağlar-Dağantepe ky.	12	12			Bitti
15	Kurum	Asf.Yama	Çiçekli-A.Yeniköy ky.	7	7			Bitti
			TOPLAM			458,013	474,770	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROGRAM VE UYGULAMALARI

ALTINYAYLA

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Kırma Taş	Deliilyas-Yassıpınar	7	5	202,872	185,043	Bitti
2	Kurum	Kırma Taş	Başyayla-Konakyazı	3	4	139,122		Bitti
3	Kurum	II.Kat Asf.	Güzeloğlan-Gümüşdiğin	3	4	149,581		Bitti
4	Kurum	II.Kat Asf.	Tahtyurt-Güzeloğlan	5	5		99,743	Bitti
5	Kurum	II.Kat Asf.	Kızılhüyük-Kürkçüyurdu	5	5		34,497	Bitti
6	Köydes	II. Kat Asf.	Tahyurt-Güzeloğlan Ky.	5	4	155,771	155,771	Bitti
7	Kurum	Kil.Parke	Doğupınar	5,000	5,500			Bitti
8	İll.Bank.	Kil.Parke	Serinyayla ky.	4000	4000	40,000		Bitti
9	Kurum	Asf.Yama	Kaleköy-Güzeloğlan-Tahtyurt ky.	10	10			Bitti
10	Kurum	Asf.Yama	Kürkçüyurdu ky.	6	6			Bitti
11	Kurum	Asf.Yama	Gümüşdiğin ky.	4	4			Bitti
12	Kurum	Asf.Yama	Başören-Paşaköy ky.	5	5			Bitti
			TOPLAM			687,346	475,054	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROĞRAM VE UYGULAMALARI

DİVRİĞİ

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Çiğdemli-Sarıgül	1				Başlamadı
2	Kurum	Onarım	Yeşilyol	2	6			Bitti
3	Kurum	Onarım	Bayırlı-Başıhisar	1				Başlamadı
4	Kurum	Onarım	Güneş	1	1			Bitti
5	Kurum	Onarım	Çamurlu	1				Başlamadı
6	Kurum	Onarım	Çayözü-Doluçay-Karaman Mez.	2				Başlamadı
7	Kurum	Onarım	Handere	2	2			Bitti
8	Kurum	Onarım	Güllüce-İkideğirmen	2				Başlamadı
9	Kurum	Onarım	Akpelit kl. (2011 yılı)	4				Başlamadı
10	Kurum	Stabilize	Kaledibi	4	4			Bitti
11	Kurum	Stabilize	Yeşilyol-Arapkir Bağ.	9				Başlamadı
12	Kurum	Stabilize	Yeşilyayla	2				Başlamadı
13	Kurum	Stabilize	Çamlık-Doğan	8	8			Bitti
14	Kurum	Stabilize	Yalnızsöğüt-İnanlı	3	3			Bitti
15	Kurum	Stabilize	Gökçecharman	3	3			Bitti
16	Kurum	Stabilize	Çiğdemli-Sarıgül	1				Başlamadı
17	Kurum	Stabilize	Bayırlı-Başıhisar	1				Başlamadı
18	Kurum	Stabilize	Güneş	1	1			Bitti
19	Kurum	Stabilize	Çamurlu	1				Başlamadı
20	Kurum	Stabilize	Karakale	2	2			Bitti
21	Kurum	Stabilize	Çayözü-Doluçay-Karaman Mez.	2				Başlamadı
22	Kurum	Stabilize	Handere	2	2			Bitti
23	Köydes	Stabilize	Güneyevler Ahi mz.	3	2	18,212	26,491	Bitti
24	Köydes	Stabilize	Yuva -Sapan Ky.	3	3	32,356	77,314	Bitti
25	Köydes	Stabilize	Beldibi Ky.	0	0	15,771		İptal
26	Köydes	Stabilize	Duruköy	8	8	140,384	164,166	Bitti
27	Köydes	Stabilize	Akpelit Ky.	4	4	70,192		Bitti
28	Köydes	Stabilize	Sırçalı Ky.	3	3	43,377		Bitti
29	Köydes	Stabilize	Çamlık-Doğan Ky.	4	12	115,128	68,634	Bitti
30	Köydes	Stabilize	Tepahan-Karyağan ky.	4	2	35,000	31,000	Bitti
31	Köydes	Stabilize	Yusufşeyh ky.	3	3	33,887	33,887	Bitti
32	Kurum	Kırma Taş	Çayören-Çakmakdüzü	6	6		215,397	Bitti
33	Kurum	Kırma Taş	Selimoğlu-Handere-Güçlü	5	11	606,377		Bitti
34	Kurum	Kırma Taş	Karakale	1	1		130,103	Bitti
35	Kurum	Kırma Taş	Ekinbaşı	4	2		362,706	Bitti
36	İll.Bank.	Kırma Taş	Diktaş Ovacık ky.	9	9	360,000	500,124	Bitti
37	Kurum	I. Kat Asf.	Soğucak ky.	10	10			Bitti
38	Köydes	I.Kat Asf.	Gedikbaşı Ky.	1	1	26,627	26,627	Bitti
39	Kurum	San. Yap.	Ortaköy	1		15,000		Başlamadı

40	Kurum	San. Yap.	Çamlık-Çatılı	1		15,000		Başlamadı
41	Kurum	San. Yap.	İkizbaşak	2	2	30,000	80,235	Bitti
42	Kurum	San. Yap.	Susuzlar Tirolar	1	1	15,000		Bitti
43	Köydes	San. Yap.	Bahçeli	1	1	12,746	12,746	D.Ediyor
44	Köydes	San. Yap.	Maltepe-Kutlu Ky.	1	1	14,023	14,023	Bitti
45	Köydes	San. Yap.	Dumluca-Karaağaçlı Ky.	1	1	22,563	22,563	Bitti
46	Köydes	San. Yap.	Erikli-Kozlu Ky.	1	1	15,951	15,951	Bitti
47	Köydes	San. Yap.	Çayözü Ky.	1	1	14,023	14,023	Bitti
48	Kurum	Kil.Parke	Akmeşe					Başlamadı
49	Kurum	Kil.Parke	Ortaköy	4,000		40,000		Başlamadı
			TOPLAM			1,691,617	1,880,785	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROGRAM VE UYGULAMALARI

DOĞANŞAR

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	İçdere Mez.	1	3			Bitti
2	Kurum	Stabilize	Eskiköy-Avcıçayı					Başlamadı
3	Kurum	Stabilize	İçdere Mez.		4			Bitti
4	Kurum	Stabilize	Başekin ky.(2011 Yılı)	1				Başlamadı
5	Kurum	Kırma Taş	İçdere-Göçüköy	5		200,700		Başlamadı
6	Kurum	II.Kat Asfalt	Kozlu-Ekinciler	8	8	19,499		Bitti
7	Kurum	Kil.Parke	Göçüköy	2,000		20,000		Başlamadı
8	Köydes	Kil.Parke	İçdere Ky.	2,250	2,250	32,325	32,325	Bitti
9	Köydes	Kil.Parke	Boyalı Ky	2,250	2,250	32,325	32,325	Bitti
10	Köydes	Kil.Parke	Çalıncı Ky.	1,700	1,700	24,423	24,423	Bitti
11	Köydes	Kil.Parke	Aslantaş Ky.	650	650	9,338	9,338	Bitti
12	Köydes	Kil.Parke	Alan Ky.	650	650	9,338	9,338	Bitti
13	Köydes	Kil.Parke	Avcıçayı Ky.	650	650	9,338	9,338	Bitti
14	Köydes	Kil.Parke	Çatpınar Ky.	650	650	9,338	9,338	Bitti
15	Köydes	Kil.Parke	Kıpcak Ky.	650	650	9,338	9,338	Bitti
16	Köydes	Kil.Parke	Boyalı ky.	500	500	7,674	7,674	Bitti
17	Köydes	Kil.Parke	Ortaköy	551	551	8,452	8,452	Bitti
18	İll.Bank.	Kil.Parke	Sarısuat ky.			40,000		Başlamadı
19	Kurum	Asf.Yama	Kozlu-Ekinciler ky.	8	8			Bitti
			TOPLAM			432,089	151,890	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROĞRAM VE UYGULAMALARI

GEMEREK

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Karaerkek	4	4			D.Ediyor
2	Kurum	Stabilize	Karaerkek	4				Başlamadı
3	Kurum	Stabilize	Akçaşar-Arpaözü	5	5			Bitti
4	Kurum	Stabilize	Yeniköy-Dolangel	4	4			Bitti
5	Kurum	Stabilize	Eskiyurt-Saraç	2	3			Bitti
6	Kurum	Kırma Taş	Durgunsu-Cesurlar (II.Kat Dahil)	4	4	162,787	181,546	Bitti
7	Kurum	I.Kat Asfalt	Eğerci-Sızır	6	6			Bitti
8	Kurum	II.Kat Asfalt	Kartalkaya-Seydinali Küçüktuzhisar-Yeniköy grb.	8	9	20,140		Bitti
9	Köydes	II. Kat Asf.	Eğerci-Akçaşar Ky	1	1	45,041	37,571	Bitti
10	Köydes	II. Kat Asf.	Kartalkaya Ky.	1				
11	Köydes	II. Kat Asf.	Hacıyusuf-Kartalkaya Ky.	2	2	109,578	109,133	Bitti
12	Köydes	II. Kat Asf.	Beştepeler Ky.	1	1	40,389	40,334	Bitti
13	Köydes	San.Yap.	Beştepeler Ky.					
14	Kurum	Kil.Parke	Yeniköy	6,000	5,000	60,000	60,000	Başlamadı
15	Köydes	Kil.Parke	Dendil ky.	2,800	2,800	42,523	38,722	Bitti
16	İll.Bank.	Kil.Parke	Bulhasan ky.	2100	2100	50,000		Bitti
17	Kurum	Asf.Yama	Seydinali-Tuzhisar ky.	9	9			Bitti
18	Kurum	Asf.Yama	Keklice ky.	5	5			Bitti
19	Kurum	Asf.Yama	Hacıyusuf-Kartalkaya ky.	15	15			Bitti
20	Kurum	Asf.Yama	Akçaşar ky.	3	3			Bitti
			TOPLAM			530,458	467,306	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROĞRAM VE UYGULAMALARI

GÖLOVA

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Subaşı	6	6			Bitti
2	Kurum	Onarım	Akçataş	1	1			Bitti
3	Kurum	Stabilize	Subaşı	6				Başlamadı
4	Kurum	Stabilize	Çevrecik-sarıçiçek	5	5			Bitti
5	Kurum	Stabilize	Akçataş	1	1			Bitti
6	Köydes	Stabilize	Karayakup-Çubuk mz.	3	3	60,000	48,833	Bitti
7	Kurum	Kırma Taş	Boğazköy	1	1	81,312	91,494	Bitti
8	Kurum	Kırma Taş	Yukarı Dikköy	1	2			Bitti

9	Kurum	II.Kat Asfalt	Boğazköy-Gözlüce	4	4	104,674		Bitti
10	Kurum	II.Kat Asfalt	Bozat-Demirkonak-Yuvacık	7	7			Bitti
11	Kurum	II.Kat Asfalt	Akçataş-Karayakup	2	2			Bitti
12	Köydes	II. Kat Asf.	Gölova Baraj Yolu	1	1	59,960	58,858	Bitti
13	Kurum	San. Yap.	Subaşı (Köprü)	1		15,000		Başlamadı
14	Kurum	San. Yap.	Gözükcük (Menfez)	1		15,000		Başlamadı
15	Kurum	Kil.Parke	Boğazköy	5,000		50,000		Başlamadı
16	Kurum	Kil.Parke	Akçataş	4,500	4,500	45,000	45,000	Bitti
17	İller Bank.	Kil.Parke	Günalan ky.	1	1	40,000		Bitti
18	Kurum	Asf.Yama	Akçataş-Karayakup	2	2			Bitti
19	Kurum	Asf.Yama	Bozat-Demirkonak ky.	8	8			Bitti
			TOPLAM			470,946	244,185	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROGRAM VE UYGULAMALARI

GÜRÜN

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Karapınar-Güldede-Başören	5				Başlamadı
2	Kurum	Onarım	Tepecik	8	8			Bitti
3	Kurum	Onarım	Koyunlu Grb.	8	10			Bitti
4	Kurum	Stabilize	Güllübucak	10				Başlamadı
5	Kurum	Stabilize	Kavak	10				Başlamadı
6	Kurum	Stabilize	Karapınar-Güldede-Başören	5				Başlamadı
7	Kurum	Stabilize	Koyunlu Grb.	5	14			Bitti
8	Kurum	Stabilize	Tepecik-M.yolu	8	8			Bitti
9	Köydes	Stabilize	Koyunlu grb.	4	4	36,837	36,837	Bitti
10	Kurum	Kırma Taş	Kızılpınar	5	4	407,658		Bitti
11	Kurum	Kırma Taş	Kalederesi	5	7		632,914	Bitti
12	Kurum	Kırma Taş	Kızılburun-Karakuyu	8	8	235,545		Bitti
13	Kurum	Kırma Taş	Osmandede Göbekveren-Beypınar-Akpınar(Ydk)	21	13	582,908		D.Ediyor
14	Kurum	I.Kat Asfalt	Eskihamal-Yeşildere	6	5			Bitti
15	Kurum	II. Kat Asf.	Tepecik	9			121,701	Başlamadı
16	Köydes	II. Kat Asf.	Eskihamal Grup Yolu	10	6	135,596	135,596	Bitti
17	Köydes	II. Kat Asf.	Sanca Grup Yolu	10	6	246,565	246,565	Bitti
18	Kurum	San. Yap.	Karahisar	1	1	15,000	41,812	Bitti
19	Kurum	San. Yap.	Yeşildere-Kılıçdoğan	1	1	15,000		Bitti
20	Kurum	San. Yap.	Tepecik	1		15,000		Başlamadı
21	Köydes	San. Yap.	Tepecik Ky.	1	1	16,702	16,702	Bitti

22	Köydes	San.Yap.	Tepecik Ky.	1	1	19,406	19,406	Bitti
23	Köydes	San.Yap.	Ayvalı ky.	1	1	10,346	10,346	Bitti
24	Köydes	San.Yap.	Tepecik Ky.			17,775	17,775	Bitti
25	Köydes	San.Yap.	Eskihamal-Kılıçdoğan gr.	1	1	25,198	25,198	Bitti
26	Köydes	San.Yap.	Bağlıçay Ky.	1	1	16,066	16,066	Bitti
27	Kurum	Kil.Parke	Yazyurdu	7,000	6,000	70,000		D.Ediyor
28	Kurum	Kil.Parke	Eskihamal	7,000		70,000		D.Ediyor
29	Kurum	Asf.Yama	Yolgeçen ky.	10	10			Bitti
30	Kurum	Asf.Yama	Gökpınar ky.	10	10			Bitti
31	Kurum	Asf.Yama	Yelkesen-Fatmadevriş ky.	13	13			Bitti
			TOPLAM			1,935,602	1,320,918	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROĞRAM VE UYGULAMALARI

HAFİK

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Değirmenseki-Ekingölü	4				Başlamadı
2	Kurum	Onarım	Yakaboyu	1	1			Bitti
3	Kurum	Onarım	Çömlekçi	1	2			Bitti
4	Kurum	Stabilize	Alibeyli-Akkaya	2	3			Bitti
5	Kurum	Stabilize	Düğer	5	8			Bitti
6	Kurum	Stabilize	Değirmenseki-Ekingölü	4				Başlamadı
7	Kurum	Stabilize	Yakaboyu	1	1			Bitti
8	Kurum	Stabilize	Çömlekçi	1	2			Bitti
9	Köydes	Stabilize	Çakmak-Esenli Ky.	8	8	84,960	84,960	Bitti
10	Kurum	Kırma Taş	Alçıören Grb.	5	6	500,717	555,812	Bitti
11	Kurum	Kırma Taş	Tozanlı Grb.	10	9			Bitti
12	Kurum	I.Kat Asfalt	Pusat	1	1			Bitti
13	Köydes	I.Kat Asf.	Bakımlı-Süleymaniye Ky.	8	6	499,425	499,425	Bitti
14	Kurum	II.Kat Asfalt	Tozanlı Grb.	8	10	55,114		Bitti
15	Kurum	San. Yap.	Çaltılı	1	1	15,000	9,263	Bitti
16	Kurum	San. Yap.	Gürpınar-Beydili ky.	1	1		35,400	Bitti
17	Kurum	San. Yap.	Adamlı			15,000		İptal
18	Kurum	Kil.Parke	Akkaya					Başlamadı
19	Kurum	Kil.Parke	Celallı	7,000	7,000	70,000	70,000	Bitti
20	Kurum	Kil.Parke	Çınarlı	7,000	9,000	70,000	70,000	Bitti
21	Köydes	Kil.Parke	Düzyayla	525	525	8,365	8,365	Bitti
22	Kurum	Asf.Yama	Tozanlı grb ky.	10	10			Bitti
23	Kurum	Asf.Yama	Koşutdere-Çınarlı ky.	15	15			Bitti
24	Kurum	Asf.Yama	Düzyayla-Düğer ky.	7	7			Bitti
25	Kurum	Asf.Yama	Maden ky.	8	8			Bitti
			TOPLAM			1,318,581	1,333,225	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROĞRAM VE UYGULAMALARI

İMRANLI

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Yoncabayır (Çalıyurt)	3	3			Bitti
2	Kurum	Onarım	Alahacı-Yünören	1	3			Bitti
3	Kurum	Onarım	Yukarıboğaz	1	1			Bitti
4	Kurum	Onarım	Arık- Bandıra	4	6			Bitti
5	Kurum	Stabilize	Acidere	5				Başlamadı
6	Kurum	Stabilize	Alahacı-Yünören	1	1			Bitti
7	Kurum	Stabilize	Yukarıboğaz	1	1			Bitti
8	Kurum	Stabilize	Arık Bandıra	4				Başlamadı
9	Kurum	Stabilize	Delimahmut-Gökçebel	4				Başlamadı
10	Kurum	Stabilize	Toptaş-A.Şeyhli-Bahtiyar	7	7			Bitti
11	Kurum	Stabilize	Yozyatağı-Bozkaya	3				Başlamadı
12	Kurum	Stabilize	Çayköy-Uyanık	7				Başlamadı
13	Kurum	Stabilize	Kapımahmut Melekler Mez.	4				Başlamadı
14	Köydes	Stabilize	Dağyurdu ky.	3	3	105,148	105,148	Bitti
15	Kurum	Kırma Taş	Bahtiyar	4	3	286,503		Bitti
16	Kurum	Kırma Taş	Acidere ky.	4	4		418,571	Bitti
17	Kurum	Kırma Taş	Gelintarla	2	2		122,826	Bitti
18	Kurum	Kırma Taş	Eskikeşlik	3	3	97,254		Bitti
19	Kurum	Kırma Taş	Yeniköy	2	2	45,023		Bitti
20	Kurum	Kırma Taş	Boğazören	1	1	33,978		Bitti
21	Kurum	I.Kat Asfalt	Demirtaş-Toptaş	4	5			Bitti
22	Köydes	II. Kat Asf.	Cerit Grup Köy Yolu	8	8	343,661	343,661	Bitti
23	Kurum	San. Yap.	Karacaören-Orta	1	1	15,000	58,988	Bitti
24	Kurum	San. Yap.	Aşağışeyhli-Bahtiyar	1	1	15,000		Bitti
25	Kurum	San. Yap.	Ardıçalan	1		15,000		Başlamadı
26	Köydes	San.Yap.	Uzuntumur-Borular Ky.	1				İPTAL
27	Köydes	San.Yap.	Karacaören Ky.	1	1	21,182	21,182	Bitti
28	Köydes	San.Yap.	Yünören-Avşar Ky.	1	1	9,647	9,647	Bitti
29	Köydes	San.Yap.	Taşlıca Ky.	1	1	12,365	12,365	Bitti
30	Kurum	Kil.Parke	Türkkeşlik	3,000	2,000	30,000	30,000	Bitti
31	Kurum	Kil.Parke	Karaboğaz	7,000	7,000	70,000	70,000	D.Ediyor
32	İll.Bank.	Kil.Parke	Karacaören ky.	1	1	60,000		Bitti
33	Kurum	Asf.Yama	Karaçayır ky.	4	4			Bitti
34	Kurum	Asf.Yama	Kemreli ky.	2	2			Bitti
35	Kurum	Asf.Yama	Delice ky.	5	5			Bitti
36	Kurum	Asf.Yama	Türkkeşlik ky.	3	3			Bitti
			TOPLAM			1,159,762	1,192,389	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROGRAM VE UYGULAMALARI

KANGAL

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Külekli-Göller Mez.	2	4			Bitti
2	Kurum	Onarım	Akçamağra-Taşlı	2				Başlamadı
3	Kurum	Onarım	Divriği yolu-Killik-Dipoğlu M.	5	5			Bitti
4	Kurum	Onarım	Kızılениş-Sarıpınar	1				Başlamadı
5	Kurum	Onarım	Turnalı	1	1			Bitti
6	Kurum	Stabilize	Bekoakgedik-Çağılcaören	4	2			D.Ediyor
7	Kurum	Stabilize	Beko Minarekaya-B.Akgedik	4				Başlamadı
8	Kurum	Stabilize	Çevizyolu-Satören Mez.	2				Başlamadı
9	Kurum	Stabilize	Divriği yolu-Dipoğlu	3	4			Bitti
10	Kurum	Stabilize	Onaran Kılıçdere Mez.	2	1			D.Ediyor
11	Kurum	Stabilize	Divriği yolu-Killik	2	2			Bitti
12	Kurum	Stabilize	Kavak-Gürükbekir	6	3			Bitti
13	Kurum	Stabilize	Bektaş-Aktepe	4				Başlamadı
14	Kurum	Stabilize	Çiftlikören-Çipil	4	5			Bitti
15	Kurum	Stabilize	Kılıçdere-Çetinkaya	3	3			Bitti
16	Kurum	Stabilize	Hamzabey-Oğlaklı	4	2			D.Ediyor
17	Kurum	Stabilize	Merkez Yeniköy	3	2			Bitti
18	Kurum	Stabilize	Külekli-Göller Mez.	2	4			Bitti
19	Kurum	Stabilize	Akçamağra-Taşlı	2				Başlamadı
20	Kurum	Stabilize	Kızılениş-Sarıpınar	1				Başlamadı
21	Kurum	Stabilize	Turnalı	2	1			Bitti
22	Köydes	Stabilize	Hatunçayırı Ky.	2				İptal
23	Köydes	Stabilize	Taşlık Ky.	8	8	115,000		Bitti
24	Köydes	Stabilize	Tatlıpınar Ky.	2	2	18,000		Bitti
25	Köydes	Stabilize	Elalibey Ky.	3	3	23,000		Bitti
26	Köydes	Stabilize	Sultanpınarı Ky.	5	5	40,000		Bitti
27	Köydes	Stabilize	Dereköy	6	6	48,000		Bitti
28	Köydes	Stabilize	Gençali Ky.	2	2	18,000		Bitti
29	Köydes	Stabilize	İğdelidere Ky.	7				İptal
30	Kurum	Kırma Taş	Tilkihiyük-Mezgit	3	3	415,529		Bitti
31	Kurum	Kırma Taş	Örencik	8	20		292,670	Bitti
32	Kurum	Kırma Taş	Çetinkaya yol ayrımı-Onaran	7	6	231,771	334,203	Bitti
33	Kurum	Kırma Taş	Deligazili	9	9	360,893	628,464	Bitti
34	Kurum	II.Kat Asf.	Kızılениş-Yeniköy	12	13	123,455	110,920	Bitti
35	Kurum	II.Kat Asf.	Çat-Delioğlenderesi	12	14			Bitti
36	Kurum	San. Yap.	Kuşkayası-Kargakalesi	1	1	15,000	45,958	Bitti
37	Kurum	San. Yap.	Eski Sivas Yolu-Bozarmut	1	1	40,000		Bitti

38	Kurum	San. Yap.	M.Yeniköy	1	1	15,000	27,474	Bitti
39	Kurum	San. Yap.	Eğricek-Akçaşehir	1		15,000		
40	Kurum	Kil.Parke	Örencik	5,000		50,000		Başlamadı
41	Kurum	Kil.Parke	Yarhisar	6,000		55,000		Başlamadı
42	Köydes	Kil.Parke	Deliktaş Ky.	4,500	4,500	80,000	80,000	Bitti
43	Köydes	Kil.Parke	Sacayağı Ky.	5,300	5,300	90,000	90,000	Bitti
44	Köydes	Kil.Parke	Bektaş Ky.	5,000	5,000	142,968		Bitti
45	Köydes	Kil.Parke	Kavak Ky.	3,400	3,400	70,000	70,000	Bitti
46	Köydes	Kil.Parke	Tekke Ky.	3,000	3,000	50,000	50,000	Bitti
47	İll.Bank.	Kil.Parke	Çat ky.	2450	2450	50,000		Bitti
48	Kurum	Asf.Yama	Deligazili-Yeniköy ky.	22	22			Bitti
49	Kurum	Asf.Yama	Çat-Deliogönderesi ky.	14	14			Bitti
50	Kurum	Asf.Yama	Hüyüküyurt ky.	5	5			Bitti
51	Kurum	Asf.Yama	İmamındamı ky.	1	1			Bitti
52	Kurum	Asf.Yama	Karanlık ky.	4	4			Bitti
53	Kurum	Asf.Yama	Sacayağı-Minarekaya ky.	13	13			Bitti
54	Kurum	Asf.Yama	Gürükbekir ky.	7	7			Bitti
55	Kurum	Asf.Yama	Kalkım ky.	8	8			Bitti
			TOPLAM			2,066,616	1,729,689	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROGRAM VE UYGULAMALARI

KOYULHİSAR

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Gölcük					Başlamadı
2	Kurum	Onarım	Kızılelma					Başlamadı
3	Kurum	Onarım	Gümüşlü	3	3			Bitti
4	Kurum	Onarım	Balıca-Doluca ky.(2011 Yılı)	4				Başlamadı
5	Kurum	Stabilize	Gölcük					Başlamadı
6	Kurum	Stabilize	Gümüşlü					Başlamadı
7	Kurum	Kırma Taş	Kadife-Kayaören	6	4	143,082	404,946	Bitti
8	Kurum	Kırma Taş	Kalebaşı	3	3	128,632		Bitti
9	Kurum	Kırma Taş	Direkli-Aydınlr	1	3	104,964		Bitti
10	Kurum	II.Kat Asf.	Taşpınar	2	1	275,702	318,600	Bitti
11	Kurum	II.Kat Asf.	Ekinözü	2	1			Bitti
12	Kurum	II.Kat Asf.	Yolüstü	2	2			Bitti
13	Kurum	II.Kat Asf.	Çiçekközü	1	1			Bitti
14	Kurum	II.Kat Asf.	İkizyaka	4	3			Bitti
15	Kurum	II.Kat Asf.	Ortaseki	4	6			Bitti
16	Kurum	II.Kat Asf.	Günişik	2	2			Bitti

17	Kurum	San. Yap.	Güzelyurt-Acıdere	2	2	30,000	128,695	Bitti
18	Kurum	San. Yap.	Kurşunlu	2	2	30,000		Bitti
19	Kurum	San. Yap.	Gölcük	1	1	15,000		Bitti
20	Kurum	San. Yap.	Kavalık	1	1	15,000		Bitti
21	Kurum	San. Yap.	Balıca-Dolucan arası	1		15,000		Başlamadı
22	Kurum	Kil.Parke	Çaylı					Başlamadı
23	Kurum	Kil.Parke	Karaçam					Başlamadı
24	Köydes	Kil.Parke	Taşpınar Ky.	5,851	5,851	79,314	79,314	Bitti
25	Köydes	Kil.Parke	Yalnıztepe Ky.	5,089	5,089	64,334	64,334	Bitti
26	Köydes	Kil.Parke	Yenice ky.	9,500	9,500	122,421	87,845	D.Ediyor
27	İll.Bank.	Kil.Parke	Kavacık ky.	1	1	80,000		Bitti
28	Kurum	Asf.Yama	Ortaseki ky.	5	5			Bitti
29	Kurum	Asf.Yama	Çiçeközü ky.	1	1			Bitti
30	Kurum	Asf.Yama	Sugözü ky.	2	2			Bitti
31	Kurum	Asf.Yama	Kızılelma ky.	6	6			Bitti
32	Kurum	Asf.Yama	İskenderşeyh ky.	5	5			Bitti
			TOPLAM			1,103,449	1,083,734	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROĞRAM VE UYGULAMALARI

SUŞEHİRİ

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Gelengeç (2011 yılı)	1	1			D.Ediyor
2	Kurum	Onarım	Kale	2	2			Bitti
3	Kurum	Onarım	Karalar- Çamlıca Mez.	2	2			Bitti
4	Kurum	Stabilize	Gelengeç	2	2			Bitti
5	Kurum	Stabilize	Yamaç	2	2			Bitti
6	Kurum	Stabilize	Kavşut-Gülali	1	1			Bitti
7	Kurum	Stabilize	Taklak-Eskiköy	2	2			Bitti
8	Kurum	Stabilize	Yolkesen-Matador	3				Başlamadı
9	Kurum	Stabilize	Çitlice terkeşli	1	1			D.Ediyor
10	Kurum	Stabilize	Kale	2	2			Bitti
11	Kurum	Stabilize	Karalar- Çamlıca Mez.	2	2			Bitti
12	Kurum	Kırma Taş	Taşbayır-Kuzdere	6	7	269,320		Bitti
13	Kurum	Kırma Taş	Balkara	1	1			Bitti
14	Kurum	Kırma Taş	Üzümlü	5	5	204,650	70,227	Bitti
15	Kurum	Kırma Taş	Sağpazar	1	2	49,953	504,156	Bitti
16	Kurum	Kırma Taş	Saraycık	1	1	16,620		Bitti
17	Kurum	Kırma Taş	Akşar	1	1	19,732		Bitti
18	Kurum	İl.Kat Asf.	Akıncı	3	3	39,910	43,063	Bitti
19	Kurum	İl.Kat Asf.	Eskimeşe	3	2			Bitti
20	Kurum	İl.Kat Asf.	Camili	3	2			Bitti
21	Kurum	İl.Kat Asf.	Şarköy	2	1			Bitti
22	Kurum	İl.Kat Asf.	Türkmenler Grb. Yolu	6	6			Bitti

23	Kurum	San. Yap.	Kale	1		15,000		Başlamadı
24	Kurum	San. Yap.	Güngören (Menfez L=15 mt)	1		40,000		Başlamadı
25	Kurum	San. Yap.	Olucak	1		15,000		Başlamadı
26	Kurum	San. Yap.	Taklak	1		15,000		Başlamadı
27	Kurum	San. Yap.	Sökün	1		15,000		Başlamadı
28	Kurum	San. Yap.	Yamaç	1		15,000		Başlamadı
29	Kurum	Kil.Parke	Bostancık	3,800		38,000		Başlamadı
30	Kurum	Kil.Parke	Yeşilyayla			60,000		Başlamadı
31	Kurum	Kil.Parke	Esenyaka					Başlamadı
32	Kurum	Asf.Yama	Şarköy ky.	1	1			Bitti
33	Kurum	Asf.Yama	Camili ky.	1	1			Bitti
34	Kurum	Asf.Yama	Türkmenler ky.	5	5			Bitti
35	Kurum	Asf.Yama	Eskimeşe ky.	2	2			Bitti
36	Kurum	Asf.Yama	Akıncı ky.	4	4			Bitti
37	Kurum	Asf.Yama	Çataloluk ky.	5	5			Bitti
			TOPLAM			813,185	617,446	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROGRAM VE UYGULAMALARI

ŞARKIŞLA

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Stabilize	Hardal-Ortaköy	9	4			Bitti
2	Kurum	Stabilize	Benlihasan-Akçasu	3	3			Bitti
3	Kurum	Stabilize	Bahçealan-Adamkaya-Dökmetaş	5	5			Bitti
4	Kurum	Stabilize	Samankaya-Köseveli	7	7			Bitti
5	Kurum	Stabilize	Samankaya-Karapınar	6	6			Bitti
6	Kurum	Kırma Taş	Sivrialan-Aşık Veysel mz.y.	1		145,828		Başlamadı
7	Kurum	Kırma Taş	Burnukara	3	3		14,533	Bitti
8	Kurum	Kırma Taş	Benlihasan-Emlak.Karacaören	3	5			Bitti
9	Kurum	Kırma Taş	Kadılı-Kevenlik	3	4	135,369	431,858	Bitti
10	Kurum	Kırma Taş	Konakyazı	4	5	196,097		Bitti
11	Kurum	Kırma Taş	Kümbet ky.	6	6	220,497	220,751	Bitti
12	Kurum	Kırma Taş	Kümbet-Çanakçı-Bağlararası	8				Başlamadı
13	Köydes	I.Kat Asf.	Çanakçı-Bağlararası Ky.	7	7	311,421	311,421	Bitti
14	Köydes	I.Kat Asf.	Pınarbaşı eski yol-Osmanpınarı Ky.	4		350,919	350,919	Bitti
15	Kurum	II.Kat Asf.	İyecik-Demirköprü	12	12	289,449	188,845	Bitti
16	Kurum	II.Kat Asf.	Karacaören-Em.	3	4			Bitti
17	Kurum	San. Yap.	Sivrialan	1	1	15,000		Bitti
18	Kurum	San. Yap.	Fakılı	1	1	60,000		Bitti
19	Kurum	San. Yap.		1	1			Bitti
20	Kurum	San. Yap.	Kahvepınarı	2	2	30,000	64,270	Bitti

21	Kurum	San. Yap.	Küçük Üreğil	1		15,000	13,811	Başlamadı
22	Kurum	San. Yap.	Mescit	1	1		24,260	Bitti
23	Kurum	San. Yap.	Oluktaş ky.	1			107,487	Başlamadı
24	Kurum	Kil.Parke	Maksutlu	7,000	7,000	70,000	48,000	Bitti
25	Kurum	Kil.Parke	Döllük	7,000	7,000	70,000	47,100	Bitti
26	Kurum	Kil.Parke	Oluktaş	3,500	3,000	35,000	53,577	Başlamadı
27	İll.Bank.	Kil.Parke	Döllük-Maksutlu ky.	1	1	40,000		Bitti
28	Kurum	Asf.Yama	Maksutlu ky.	6	6			Bitti
29	Kurum	Asf.Yama	Sivrialan ky.	8	8			Bitti
30	Kurum	Asf.Yama	İğecik-Demirköprü ky.	16	16			Bitti
31	Kurum	Asf.Yama	Abdallı ky.	1	1			Bitti
32	Kurum	Asf.Yama	Bozkurt-Çanakçı ky.	12	12			Bitti
33	Kurum	Asf.Yama	Gümüštepe ky.	5	5			Bitti
34	Kurum	Asf.Yama	Mengensofular ky.	5	5			Bitti
			TOPLAM			1,984,580	1,876,832	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROGRAM VE UYGULAMALARI

ULAŞ

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Çavdar-İğdeli	2				Başlamadı
2	Kurum	Stabilize	Tecer	3				Başlamadı
3	Kurum	Stabilize	Şenyurt-Çavdar grb	16				Başlamadı
4	Kurum	Stabilize	Çavdar-İğdeli	2				Başlamadı
5	Kurum	Stabilize	Demircilik	5				Başlamadı
6	Kurum	Stabilize	Y.Karahisar-Kapaklı	5	7			Bitti
7	Kurum	Stabilize	Demiryazı-Ezentere	7	3			Bitti
8	Kurum	Kırma Taş	Bostankaya-Ulaş	5				Başlamadı
9	Kurum	Kırma Taş	Kertme-Karacaören	2		183,059	68,613	Başlamadı
10	Kurum	Kırma Taş	Güneşli	9	4	337,215		D.Ediyor
11	Kurum	II.Kat Asfalt	Karacalar-Yapalı-Baharözü	16	16	38,650	34,692	Bitti
12	Kurum	San. Yap.	Çavdar	1	1	15,000	70,420	Bitti
13	Kurum	San. Yap.	Ekincioğlu	1		15,000		Başlamadı
14	Kurum	Kil.Parke	Küpeli				24,426	Başlamadı
15	Kurum	Kil.Parke	Hacımirza	5,000	6,000			Bitti
16	Kurum	Asf.Yama	Baharözü ky.	16	16			Bitti
17	Kurum	Asf.Yama	Karaşar-Hacımirza ky.	13	13			Bitti
18	Kurum	Asf.Yama	Küpeli-Acıyort-Kurtoğlu ky.	10	10			Bitti
19	Köydes	II. Kat Asf.	Küpeli-Acıyurt-Kurtoğlu Ky.	11		327,020	136,078	D.Ediyor
			TOPLAM			915,944	334,229	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROĞRAM VE UYGULAMALARI

YILDIZELİ

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Orta-Yk.Çakmak-Çırçır		2			Bitti
2	Kurum	Onarım	Eşmebaşı-Çukursaray					Başlamadı
3	Kurum	Onarım	Kümbet-Karakoç					Başlamadı
4	Kurum	Onarım	Kiremitli-Konaközü-Kaleköy					Başlamadı
5	Kurum	Onarım	Yağlıdere-Yukarı Ekecik		1			Bitti
6	Kurum	Onarım	Kadıköy	6	6			Bitti
7	Kurum	Stabilize	Orta Çakmak-Yk. Çakmak - Çırçır		2			Bitti
8	Kurum	Stabilize	Esmebaşı-Çukursaray					Başlamadı
9	Kurum	Stabilize	Kümbet-Karakoç		2			Bitti
10	Kurum	Stabilize	Kiremitli-Konaközü-Kaleköy		4			Bitti
11	Kurum	Stabilize	Yağlıdere-Yukarı Ekecik		2			Bitti
12	Kurum	Stabilize	Yavu-Yassıkara-Yolkaya		2			D.Ediyor
13	Kurum	Stabilize	Gökkaya-Zengi		2			D.Ediyor
14	Köydes	Stabilize	Gökkaya-Banaz yol ayrımı	9		117,726	117,726	Başlamadı
15	Köydes	Stabilize	Direkli Sarıkaya	1	1	13,080	13,080	Başlamadı
16	Köydes	Stabilize	M.Sarıkaya-Yuvalıçayır	12	12	156,960	156,960	Bitti
17	Köydes	Stabilize	Konaközü-Yücebaca-Kaleköy-Kıvşak	6	6	78,480	78,480	Bitti
18	Köydes	Stabilize	Orta Çakmak-Yukarı Çakmak	4	4	52,320	52,320	Bitti
19	Köydes	Stabilize	Töngel-Kerimümin	4	4	52,320	52,320	Bitti
20	Köydes	Stabilize	Karakoç	2	2	26,160	26,160	Bitti
21	Köydes	Stabilize	Sarıçal	4		52,320	52,320	Başlamadı
22	Köydes	Stabilize	Belcik-Yavu	4	4	52,320	52,320	Başlamadı
23	Köydes	Stabilize	Aslandoğmuş	2	2	26,160	26,160	Bitti
24	Köydes	Stabilize	Seren	4	4	52,320	52,320	D.Ediyor
25	Köydes	Stabilize	Delikkaya-Tayalan-Yeşilalan	14	14	183,120	183,120	Bitti
26	Köydes	Stabilize	İslim	1	1	13,119	13,119	Başlamadı
27	Kurum	Kırma Taş	Ortaçakmak-Yiğitler-İncetaş-Kıldır-Hamzaşeyh	16	19	718,994		Bitti
28	Kurum	Kırma Taş	Kiremitli-Konaközü	6	4	127,920	672,694	Bitti
29	Kurum	Kırma Taş	Demircilik-Emirler-Dereköy	8	10	312,808	229,334	Bitti
30	Kurum	Kırma Taş	Cizözü-Subaşı	6	7	363,292	581,712	Bitti
31	Kurum	Kırma Taş	Yavu-Akpınar-Beleni (Yedek)	20	-			Başlamadı
32	Kurum	Kırma Taş	Y.Çakmak	1	-			Başlamadı
33	Kurum	Kırma Taş	Cumhuriyet	1	-			Başlamadı

34	Kurum	II.Kat Asfalt	Yavu-Karalar-Başköy-Dikilitaş-Killik	15	16	57,849	48,946	Bitti
35	Kurum	II.Kat Asf.	Sandal-Subaşı	6	4			Bitti
36	Kurum	San. Yap.	Kümbet-Karakoç	1	1	15,000	44,100	Bitti
37	Kurum	San. Yap.	Menteşe-Handeresi	1	1	15,000	52,414	Bitti
38	Köydes	San. Yap.	Karalar	2	2	16,000	16,000	Bitti
39	Köydes	San. Yap.	Yukarı ekecik	2	2	16,000	16,000	Bitti
40	Köydes	San. Yap.	Yakacık Çavuşlu	2	1	16,000		Bitti
41	Köydes	San. Yap.	Doğanlı	1	1	8,000	8,000	Bitti
42	Köydes	San. Yap.	Banaz	1	1	8,000	8,000	Bitti
43	Kurum	Kil.Parke	Yolkaya	7,000				Başlamadı
44	Kurum	Kil.Parke	Çubuk	4,000				Başlamadı
45	Kurum	Kil.Parke	Yiğitler	6,000				Başlamadı
46	Kurum	Asf.Yama	Karalar-Killik-Başköy-Yavu ky.	18	18			Bitti
47	Kurum	Asf.Yama	Banaz ky.	3	3			Bitti
48	Kurum	Asf.Yama	B.Akören ky.	15	15			Bitti
49	Kurum	Asf.Yama	Sandal-Subaşı ky.	7	7			Bitti
50	Kurum	Asf.Yama	Kiremitli ky.	11	11			Bitti
51	Kurum	Asf.Yama	Çöte ky.	16	16			Bitti
52	Kurum	Asf.Yama	Çukursaray-Eşmebaşı ky.	6	6			Bitti
53	Kurum	Asf.Yama	Kalın ky.	6	6			Bitti
54	Kurum	Asf.Yama	Tat ky.	8	8			Bitti
			TOPLAM			2,551,268	2,553,605	

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ 2012 YILI PROGRAM VE UYGULAMALARI

ZARA

S. NO	BÜTÇE	İŞİN ADI	PROJENİN ADI	PROĞ. KM	UYG. KM	ÖDEN.	HARC.	DÜŞÜNCELER
1	Kurum	Onarım	Taşgöze-Mescit	4				Başlamadı
2	Kurum	Onarım	Yeşimli Gürlevik Mez.	4	4			Bitti
3	Kurum	Onarım	Karaman-Yeşildere	2	2			Bitti
4	Kurum	Onarım	Dilekpınar-Yeşimli	4				Başlamadı
5	Kurum	Onarım	Çevirmehan-Çamlıkale	1	1			Bitti
6	Kurum	Onarım	Tuzlagözü-Yuva	1	1			Bitti
7	Kurum	Onarım	Ilıca-Doğanşar İly.İlt.(2011 Yılı)	10				Başlamadı
8	Kurum	Onarım	Gölbaşı ky.(2011 Yılı)	2				Başlamadı
9	Kurum	Stabilize	Taşgöze-Mescit ve Mezraları	6				Başlamadı
10	Kurum	Stabilize	Y.Çamözü Karaoluk Mez.	2				Başlamadı
11	Kurum	Stabilize	Ütükyurdu Gazelören Mez.	2	3			Bitti
12	Kurum	Stabilize	Karaman köyü ve Mezraları	10	1			D.Ediyor
13	Kurum	Stabilize	Dilekpınar-Yeşimli	6				Başlamadı
14	Kurum	Stabilize	Topaktaş Mz.	4				Başlamadı

15	Kurum	Stabilize	Tuzlagözü Mz.	4				Başlamadı
16	Kurum	Stabilize	Şafaklı	4				Başlamadı
17	Kurum	Stabilize	Büyükgüney	5	5			Bitti
18	Kurum	Stabilize	Kaplan Mezrası	2	2			Bitti
19	Kurum	Stabilize	Beypınar-Çukurtarla	3	3			Bitti
20	Kurum	Stabilize	Gölbaşı ky.(2011 Yılı)	2				Başlamadı
21	Kurum	Stabilize	Kızık ky.(2011 Yılı)	2				Başlamadı
22	Kurum	Stabilize	Söğütlübel ky.(2011 Yılı)	2				Başlamadı
23	Kurum	Stabilize	Yolören-Karapınar ky.(2011 Yılı)	5	5			Bitti
24	Köydes	Stabilize	Seten-Aş.Seten-Yk.Seten-Kazımoğlu Mez.	4	3	113,857	40,734	Bitti
25	Köydes	Stabilize	Büyükköy-Moluklar mz.	3	5	30,000	83,697	Bitti
26	Kurum	Kırma Taş	Göhertaş-Dilekpınar	10	10	717,948		Bitti
27	Kurum	Kırma Taş	Söğütlüağıl	2	3			Bitti
28	Kurum	Kırma Taş	Yayıközü	5	7			Bitti
29	Kurum	Kırma Taş	Kızık-Pazarbeleni	5	6	235,638	891,186	Bitti
30	Kurum	Kırma Taş	Derbent	5	7	286,727	1,102,299	Bitti
31	Kurum	Kırma Taş	Yolören	2	5	116,263		Bitti
32	Kurum	Kırma Taş	Çatören	2	4	129,768		Bitti
33	Kurum	Kırma Taş	Kürünlü	1	2	44,595		Bitti
34	Kurum	Kırma Taş	Taşgöze-Mescit	4	8	196,550		Bitti
35	Köydes	I.Kat Asf.	Çevirmehan Ky.	6	6	200,000	200,000	Bitti
36	Köydes	I.Kat Asf.	Güllüali Ky.	2	2	75,000	75,000	Bitti
37	Köydes	I.Kat Asf.	Şenyayla Ky.	2	2	75,000	75,000	Bitti
38	Köydes	I.Kat Asf.	Dereköy-Göhertaş Ky.	2				İPTAL
39	Köydes	I.Kat Asf.	Burhaniye Ky.	3	4	100,000	100,000	Bitti
40	Kurum	II.Kat Asf.	Canova	2	2	15,950		Bitti
41	Kurum	II.Kat Asf.	Ekinli	2	1			Bitti
42	Kurum	II.Kat Asf.	Tödürge	2	2		17,116	Bitti
43	Kurum	II.Kat Asf.	Adamfakı	1	2			Bitti
44	Kurum	II.Kat Asf.	İkideğirmen	1	1			Bitti
45	Kurum	San. Yap.	Yukarımescit Aksu ve Gülabiler Mezrası	1	1	15,000	162,552	Bitti
46	Kurum	San. Yap.	Karaman	1	1	30,000		Bitti
47	Kurum	San. Yap.		1	1			Bitti
48	Kurum	San. Yap.	Kümbet	1	1	15,000		Bitti
49	Kurum	San. Yap.	Ütükyurdu Gazelören Mez.	1	1	15,000		Bitti
50	Kurum	San. Yap.	Tuzlagözü-Yuva	1	1	15,000		Bitti
51	Kurum	San. Yap.	Korkut Ağılönü Mez.	1	1	15,000		Bitti
52	Kurum	San. Yap.	Akören-Kuşçu	1	1	15,000	46,320	Bitti
53	Kurum	San. Yap.	Sedille	1		15,000		Başlamadı
54	Kurum	San. Yap.	Ekinli	1		80,000		Başlamadı
55	Kurum	San. Yap.	Ütük	1		82,863		Başlamadı
56	Köydes	San. Yap.	Pazarcık Ky.	2	2	35,000	47,889	Bitti

57	Köydes	San.Yap.	Kabaktepeler Ky.	1	1	20,000	19,435	Bitti
58	Köydes	San.Yap.	Belentarla Ky.	2	1	25,000	19,808	Bitti
59	Köydes	San.Yap.	Düzceli ky.	1	1	20,000	32,295	Bitti
60	Köydes	San.Yap.	Dipsizgöl Ky.					İPTAL
61	Kurum	Kil.Parke	Canova					Başlamadı
62	Kurum	Kil.Parke	Tödürge	7,000	7,000	70,000	70,000	D.Ediyor
63	Kurum	Kil.Parke	Gümüşçevre	7,000	7,000	70,000	70,000	D.Ediyor
64	İll. Bank.	Kil.Parke	Akyazı ky.	1	1	50,000		Bitti
65	İll. Bank.	Kil.Parke	Nasır ky.	1	1	50,000		Bitti
66	Kurum	Asf.Yama	Canova ky.	2	2			Bitti
67	Kurum	Asf.Yama	Tödürge ky.	2	2			Bitti
68	Kurum	Asf.Yama	İkideğirmen ky.	1	1			Bitti
69	Kurum	Asf.Yama	Ekinli ky.	2	2			Bitti
70	Kurum	Asf.Yama	Adamfakı ky.	5	5			Bitti
71	Kurum	Asf.Yama	Korkut ky.	5	5			Bitti
72	Kurum	Asf.Yama	Özyolu ky.	20	20			Bitti
			TOPLAM			2,975,159	3,053,330	



TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Toprak Sulama Suyu Hizmetleri:

Toplam Alan (ha.)	Uygulanan Alan (ha)	Top. İş.Ad.	Biten (ad)	Başlamayan (ad)	Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme	
							Nakit%	Fiziki%
1589	1589	56	49	7	5.576.980,50	5.324.660,51	95	100

* Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2012 yılı yatırım programında belirlenen 48 adet, 2011 yılından devreden 1 adet, KÖYDES programından 2011 yılından devreden 3 adet proje olmak üzere toplam 52 adet yerüstü sulama tesisi projesi ve ORAN Hibe destekli 1 adet YAS yağmurlama projesi yapımı konusu bulunmaktadır.

* 2012 yılı yatırım programında belirtilen 49 adet İl Özel İdare, 1 adet Özel İdare-Oran, 2011 yılından devreden 3 adet KÖYDES programında bulunan yerüstü sulama tesisi ile acil bakım onarım kapsamında 2 adet sulama ile Suşehri Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından programa alınan 1 adet olmak üzere programdaki iş sayısı 56 adete yükseltilmiştir. Bu projelerin 49 adedi bitirilmiş, 1 adet proje 2013 yılına devretmiş olup, 5 adet proje çeşitli ihtilaflar nedeniyle programdan çıkarılması kararlaştırılmış, 1 adet proje ise ihtilaf nedeniyle uygulanamadığından ödeneği aynı ihale kapsamındaki diğer işte kullanılmıştır.

* 2012 yatırım programında bulunan ve başlamayan toplam 7 adet projenin 5 adedi, İmranlı Dağyurdu, Kangal Yeniköy-Kalkım, Zara Avşar ve Ütük İl Genel Meclis kararı ile programdan çıkartılmıştır. Divriği Yeşilyol projesi 2013 yılına devredilmiş olup, Suşehri Aşağı Akören Projesinin ödeneği ise aynı ihale kapsamında diğer işte kullanılmıştır.

Laboratuar Hizmetleri:

Laboratuar çalışmaları kapsamında; 2012 yılı içerisinde toplam 314 adet su analizi yapılmıştır.

Oran Destekleme Kapsamındaki Projeler:

1. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2010 yılı teklif çağrısı küçük ölçekli alt yapı projeleri Mali Destek kapsamında desteklenen “Sivas ili Altınyayla İlçesi yağmurlama Sulama Sistemi Projesi” başlıklı proje bitirilmiştir.

2. ORAN 2011 yılı doğrudan faaliyet destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Yıldızeli Tarımında Basınçlı ve Kapalı Sulamayı Yaygınlaştırma Projesi” başlıklı projemiz tamamlanmış olup, nihai rapor onaylanmıştır.

Tarımsal Projeler:

2011 yılı yatırım programında bulunan ve 2012 yılına devreden projelerden;

1. Yüksek Plastik Tünel (sera) malzemesi alımı projesi ile 50 adet sera kurulumu yapılarak tamamlanmıştır.
2. Araç Dezenfeksiyon Ünitesi projesi ile 4 adet dezenfeksiyon ünitesi kurulumu çalışmaları tamamlanmıştır.

2012 yılı yatırım programı kapsamında;

1. Mikro havza bazlı meyveciliği geliştirme projesi kapsamında 61.000 adet meyve fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir.
2. Bağcılığı geliştirme projesi kapsamında 10 adet bağ tesis edilerek 2.000 adet aşılı asma fidanı dikilmiştir.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI									
ÖZEL İDARE									
S.NO	İLÇESİ	İŞİN ADI	BÜTÇE	ÖDENEĞİ	KÖYÜ	PROG	UYG.	HARCAMA	AÇIKLAMA
1	MERKEZ	SULAMA	ÖZ.İD.	108.000,00	Günören Köyü	34	34	90.144,25	BİTİ
2	MERKEZ	SULAMA	ÖZ.İD.	135.000,00	Sarıdemir	10	10	228.857,61	BİTİ
3	MERKEZ	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Kayadibi Köyü	19	19		BİTİ
4	MERKEZ	SULAMA	ÖZ.İD.	180.000,00	Harmançık	58	58	149.080,90	BİTİ
5	MERKEZ	SULAMA	ÖZ.İD.	-	Ayli-Üçtepe-Kayadibi	-	-	236.762,15	BİTİ

6	AKINCILAR	SULAMA	ÖZ.İD.	135.000,00	Çiçekli	18	18	138.934,78	BİTİ
7	AKINCILAR	SULAMA	ÖZ.İD.	315.000,00	Merkez	0	0	233.363,09	BİTİ
8	ALTINYAYLA	SULAMA	ÖZ.İD.	27.000,00	Başyayla	8	8	63.074,42	BİTİ
9	ALTINYAYLA	YAĞMURLAMA DAMLAMA	ÖZ.İD- ORAN	240.000,00	Merkez	285	285	240.000,00	BİTİ
10	DİVRİĞİ	SULAMA	ÖZ.İD.	45.000,00	Yeşilyol (Güçlü)	-	-	-	2013 yılına devir
11	DİVRİĞİ	SULAMA	ÖZ.İD.	67.500,00	Gözcük	25	25	240.795,64	BİTİ
12	DİVRİĞİ	SULAMA	ÖZ.İD.	67.500,00	Eğrisu Tam.	6	6		BİTİ
13	DİVRİĞİ	SULAMA	ÖZ.İD.	67.500,00	Kayaburun Tam.	30	30		BİTİ
14	DOĞANŞAR	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Beşagaç	21	21	143.965,49	BİTİ
15	DOĞANŞAR	SULAMA	ÖZ.İD.	27.000,00	Alanköy	5	5		BİTİ
16	GEMEREK	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Küçük Tuzhisar	6	6	100.537,44	BİTİ
17	GEMEREK	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	İnkışla	15	15	129.020,56	BİTİ

18	GÖLOVA	SULAMA	ÖZ.İD.	45.000,00	Aydoğdu	3	3	46.546,73	BİTİTİ
19	GÖLOVA	SULAMA	ÖZ.İD.	108.000,00	Çakırşeyh	12	12	127.815,81	BİTİTİ
20	GÖLOVA	SULAMA	ÖZ.İD.	170.000,00	Karayakup (Kızıldağ 11.Köy Prog. çıkarıldı)	12	12	82.006,37	BİTİTİ (İl Gen. Mec. 04.07. 2012 tar. ve 104 say. Kararı ile Gölova Kızıldağ 11köy prog. çıkarılıp, Karayakup ve Akıncılar kızıldağ'ın prog dahil edilmesi)
21	GÜRÜN	SULAMA	ÖZ.İD.	180.000,00	Suçatı Sul.II Kısım			191.802,62	BİTİTİ
22	HAFİK	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Akkaya- Alibeyli	25	25	125.950,76	BİTİTİ
23	HAFİK	SULAMA	ÖZ.İD.	135.000,00	Oymadere	48	48	145.564,73	BİTİTİ
24	İMRANLI	SULAMA	ÖZ.İD.	45.000,00	Dağyurdu	-	-		İl Genel Meclisin 06.12.2012 tarih ve 160 sayılı kararı ile programdan çıkarıldı
25	KANGAL	SULAMA	ÖZ.İD.	45.000,00	Merkez Yeniköy Bak.Omr.	-	-		İl Genel Meclisin 06.12.2012 tarih ve 160 sayılı kararı ile programdan çıkarıldı


26	KANGAL	SULAMA	ÖZ.İD.	54.000,00	Kalkım Bak.Onr.	-	-		İl Genel Meclisin 06.12.2012 tarih ve 160 sayılı kararı ile programdan çıkarıldı
27	KANGAL	SULAMA	ÖZ.İD.	63.000,00	Karanlık Bak.Onr.	115	115	76.365,80	BİTTİ
28	KANGAL	SULAMA	ÖZ.İD.	18.000,00	Karameh- metli (Kabakçe vliği)	84	84	230.066,59	BİTTİ
29	KOYULHİSAR	SULAMA	ÖZ.İD.	45.000,00	Akseki Bak.Onr.	6	6	171.076,70	BİTTİ
30	KOYULHİSAR	SULAMA	ÖZ.İD.	63.000,00	Dilekli (Tam.)	47	47		BİTTİ
31	KOYULHİSAR	SULAMA	ÖZ.İD.	27.000,00	Dilekli Merkez Mahalle				BİTTİ
32	SUŞEHİRİ	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Tatar	37	37	311.205,05	BİTTİ
33	SUŞEHİRİ	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Çataloluk (Tam.)	63	63		BİTTİ
34	SUŞEHİRİ	SULAMA	ÖZ.İD.	180.000,00	Arpacı	94	94	444.774,82	BİTTİ
35	SUŞEHİRİ	SULAMA	ÖZ.İD.	45.000,00	Karacaören (Bak.Onr)	100	100		BİTTİ
36	SUŞEHİRİ	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Aşağı Akören	-	-		(Ödeneği Karacaörende kullanıldı

37	SUŞEHİRİ	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Günlüce	0	0		BİTTİ
38	SUŞEHİRİ (Kaym. artan ödenekten)	SULAMA	SUŞEHR İ KHGB	62.108,50	Bostancık	7	7		BİTTİ (çataloluk-tatar birlikte yapılda)
39	ŞARKIŞLA	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Bağlararası	109	109	118.523,35	BİTTİ
40	ŞARKIŞLA	SULAMA	ÖZ.İD.	45.000,00	Baltalar	8	8	52.475,34	BİTTİ
41	ULAŞ	SULAMA	ÖZ.İD.	65.000,00	Kertme- karacaören	30	30	80.769,46	BİTTİ
42	YILDIZELİ	SULAMA	ÖZ.İD.	135.000,00	Hamzaşeyh	60	60	131.515,77	BİTTİ
43	YILDIZELİ	SULAMA	ÖZ.İD.	180.000,00	Çubuk (Program dan çıkarıldı.) Nallı	15	15	105.876,77	BİTTİ (10.05.2012 Tarih ve 66 sayılı İl Genel Meclis kararı ile Programdan çıkarılıp, Nallı Köyü programa dahil edildi.)
44	YILDIZELİ	SULAMA	ÖZ.İD.	67.500,00	Cumhuriyet (Tam)	15	15	102.111,32	BİTTİ
45	YILDIZELİ	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Bayat	0	0	200.121,45	BİTTİ
46	YILDIZELİ	SULAMA	ÖZ.İD.	160.000,00	Yavu (Tam)	0	0		BİTTİ


47	YILDIZELİ	SULAMA	ÖZ.İD.		Yavru Bak.Onrm .2.Kısım	-	-	198.996,73	BİTTİ
48	ZARA	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Avşar - Arapca Mez.	-	-		İL Genel Meclisin 06.12.2012 tarih ve 160 sayılı kararı ile programdan çıkarıldı
49	ZARA	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Ilıca (Tam)	65	65	98.512,58	BİTTİ
50	ZARA	SULAMA	ÖZ.İD.	90.000,00	Korkut (Tam)	13	13	125.677,19	BİTTİ
51	ZARA	SULAMA	ÖZ.İD.	45.000,00	Kevenli Bak.Onr.	0	0		BİTTİ
52	ZARA	SULAMA	ÖZ.İD.	45.000,00	İkideğirme n (Tam)	-	-		BİTTİ (Mer.Sarıdemir- Kayadibi ile birlikte bitti)
53	ZARA	SULAMA	ÖZ.İD.	34.874,00	Ütük	-	-		İL Genel Meclisin 06.12.2012 tarih ve 160 sayılı kararı ile programdan çıkarıldı
ÖDENEK AKTARMA				750.000,00					
TOPLAM				5.486.982,50		1508	1508	5.162.292,27	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI									
KÖYDES									
S. NO	İLÇESİ	İŞİN ADI	BÜTÇE	ÖDENEĞİ (TL)	KÖYÜ	PROG	UYG	HARCAMA	AÇIKLAMA
1	SUŞEHİRİ	SULAMA	ÖZ.İD	39.998,00	Yukarıakören	69	69	79.608,85	BİTTİ
2	SUŞEHİRİ	SULAMA	ÖZ.İD	20.000,00	Yürekli	6	6	36.375,04	BİTTİ
3	SUŞEHİRİ	SULAMA	ÖZ.İD	30.000,00	Aşağısarıca	6	6	46.384,35	BİTTİ
TOPLAM				89.998,00		81	81	162.368,24	
GENEL TOPLAM				5.576.980,50		1589	1589	5.324.660,51	


UYGULANAN PROJELER

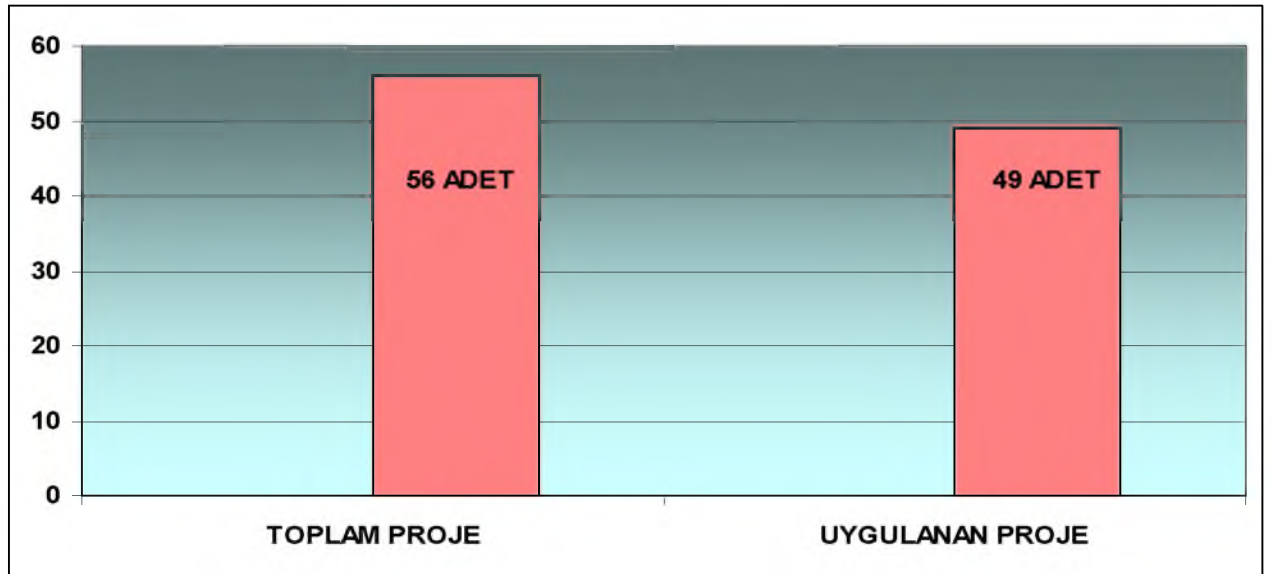

**SULAMAYA AÇILAN ALAN
(Ha.)**

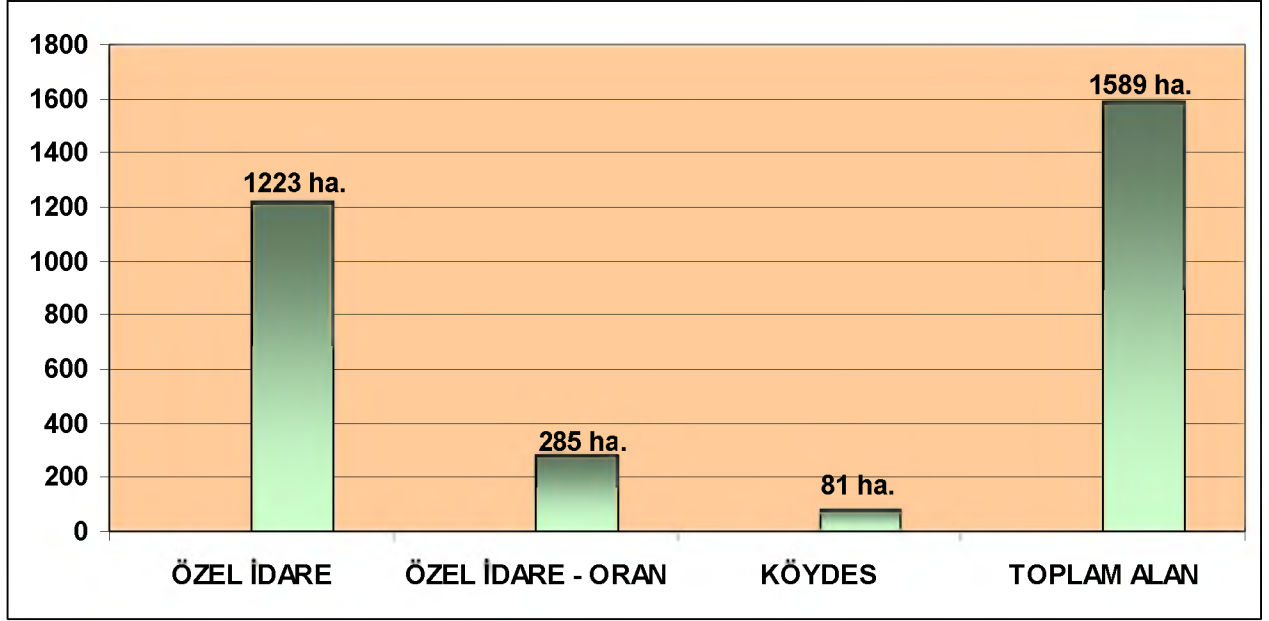

ÖDENEK DURUMU

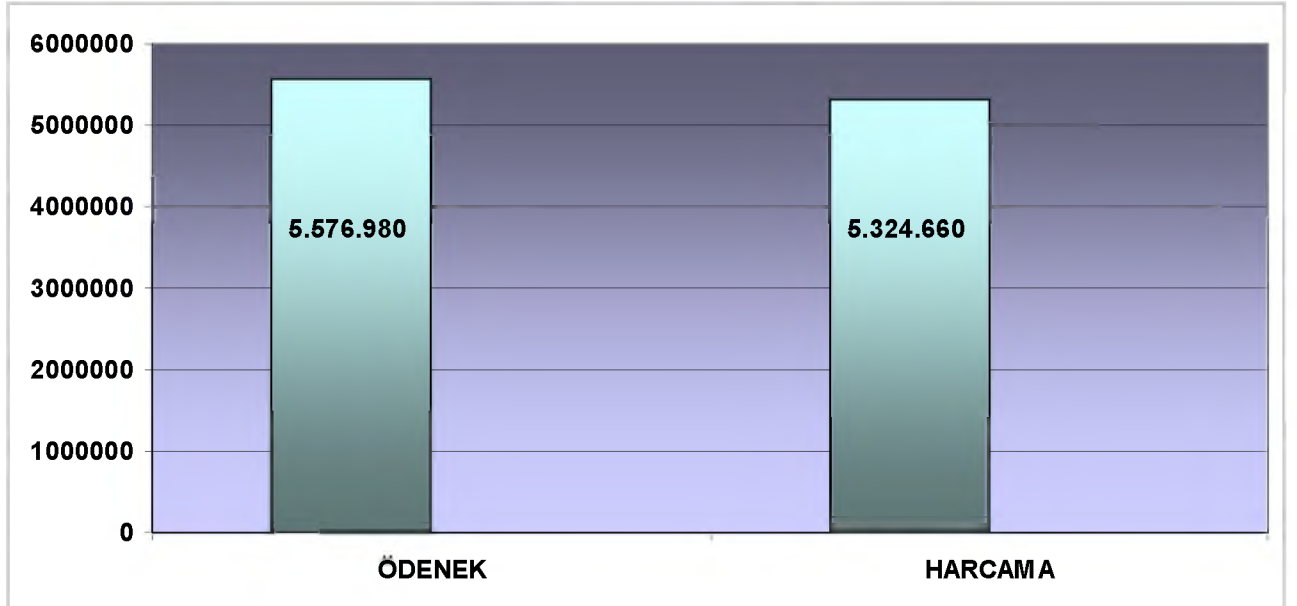

ARAÇ DEZENFEKSİYON ÜNİTESİ



GÜRÜN SUÇATI SULAMA KANALI



MERKEZ SARIDEMİR SULAMA TESİSİ



YILDIZELİ YAVU SULAMA TESİSİ



ALTINYAYLA SULAMA TESİSİ MOTORPOMPA



SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A) İÇME SUYU HİZMETLERİ

Hizmet alanımızda bulunan köylerimize sağlıklı içme suyu sağlayabilmek için 2012 yılında yeni tesis ve tesis yenileme çalışmalarına devam edilmiştir.

2012 YILI ÖDENEĞİ : 1.182.908,50


2012 YILI HARCAMASI : 1.120.059,56

NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 94

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 76

İNŞAATLAR	İŞ SAYISI	BİTEN	DEVAM EDEN	BAŞLAMAYAN
KÖY İÇME SUYU İNŞAATLARI	52	37	2	13
ASKERİ İÇME SUYU İNŞAATLARI	3	3		
TOPLAM	55	40	2	13

*Başlamayan işler 2013 yılına devredilmiştir.

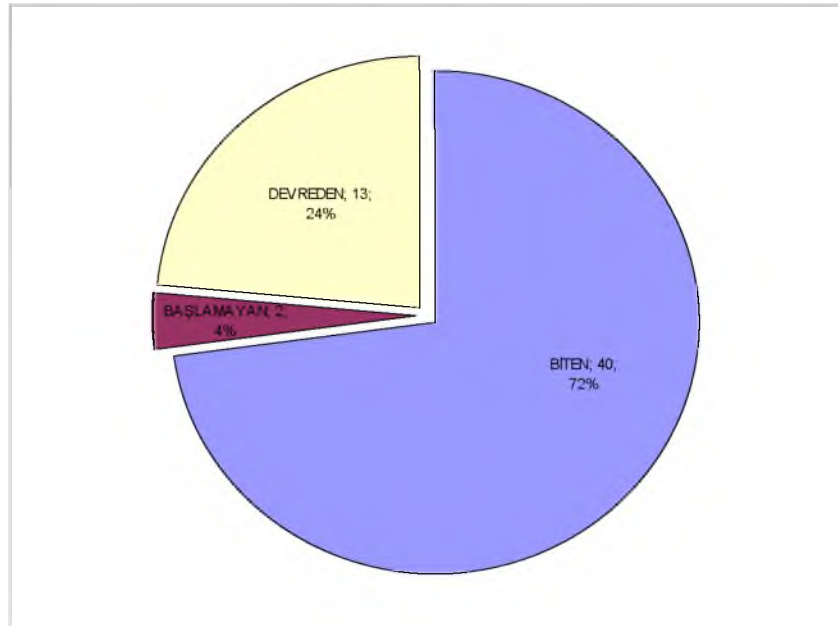

KLORLAMA CİHAZLARI

- İçme suyu şebekelerinde kullanılan sularının mikrobiyolojik yönden uygunluğunu sağlamak amacıyla depolara klorlama cihazlarının monte edilmeye devam edilmiş olup bu çalışmayla 65 köy deposuna klorlama cihaz takılmıştır.



DEPO BAKIM ONARIM

- İçme suyu depolarında suyun daha kaliteli bir şekilde muhafazasını sağlamak amacıyla 206 ünitenin su biriktirme yüzeyleri fayans kaplama yapılmış ayrıca fittings malzemelerin bakımı yapılarak tesislerimiz yenilenmiştir.



GÜNEŞ ENERJİLİ TESİSLER

- Terfili içme suyu tesislerimizdeki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Suşehri Küçükğüzel, Yıldızeli Akçalı ve Divriği Karakuzulu köylerine güneş enerjisi panelleri döşenerek ihtiyaç duyulan enerjinin üretilmesi sağlanmıştır.



PROJE ÇALIŞMALARI

- Köylerimize sağlıklı içme suyu sağlayabilmek için 16 ünite de memba tahsis kararı alınmıştır.
- 56 ünitenin istikşaf ve etüdü yapılarak hazırlanan projeler ilgili birimlere gönderilmiştir.

DİĞER FAALİYETLER


- 115 adet köyün içme suyu tesisinin tesisat, motopomp ve elektrik arızaları giderilerek tesisler faal hale getirilmiştir.
- Bünyemizde bulunan Sondaj ekibiyle; Suşehri Küçükğüzel Köyü ve Sivas Cezaevinde olmak üzere toplam 2 adet içme suyu amaçlı sondaj kuyusu, Akıncılar Kılıçköy'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün talebi üzerine 1 adet temel sondaj çalışması yapılmıştır.

2012 yılı içerisinde yapılan tüm yeni tesis ve tesis yenileme çalışmaları kapsamında muhtelif çaplarda olmak üzere 125.484 mt içme suyu borusu, 306 adet volanlı vana kullanılmıştır.

YIL SONU İÇME SUYU ENVANTERİ

Toplam köy sayısı : 1219

Toplam mezra sayısı : 663

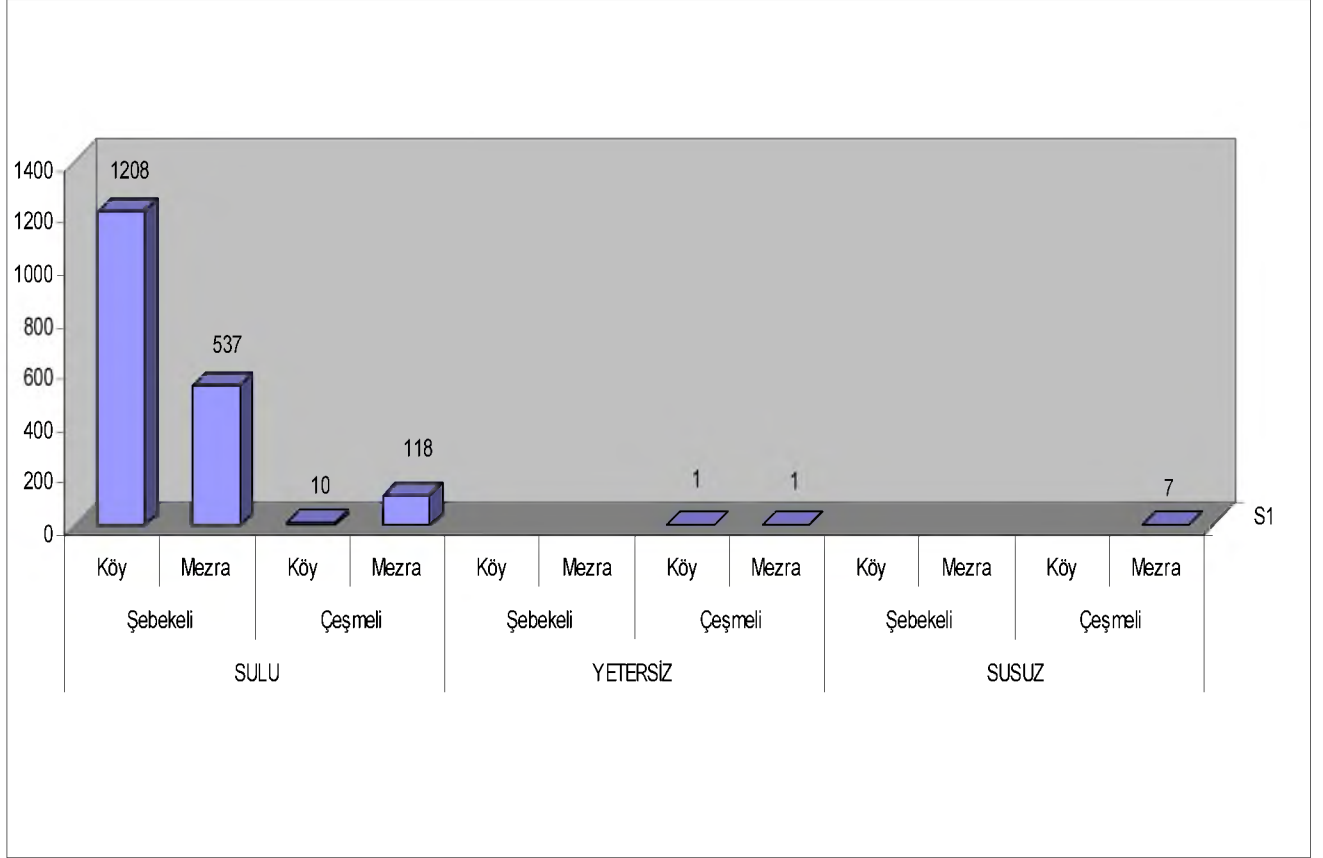


B) KANALİZASYON HİZMETLERİ

Kullanma amaçlı su temini yapılan köylerde oluşan atık suların yerleşim yerlerinde yaşayan insanlara zarar vermeden toplanarak uzaklaştırılması ve buradan da arıtılarak alıcı ortama bırakılması amacıyla 2012 yılında Devlet Vatandaş İşbirliği ile yeni tesis ve tesis yenileme çalışmalarına devam edilmiştir.

2012 YILI ÖDENEĞİ	: 2.141.999,57
2012 YILI HARCAMASI	: 2.055.828,57
NAKDİ GERÇEKLEŞME	: % 96
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 65

İNŞAATLAR	İŞ SAYISI	BİTEN	DEVAM EDEN	BAŞLAMAYAN
KANALİZASYON İNŞAATLARI	124	57	24	43

*Başlamayan işler 2013 yılına devredilmiştir.

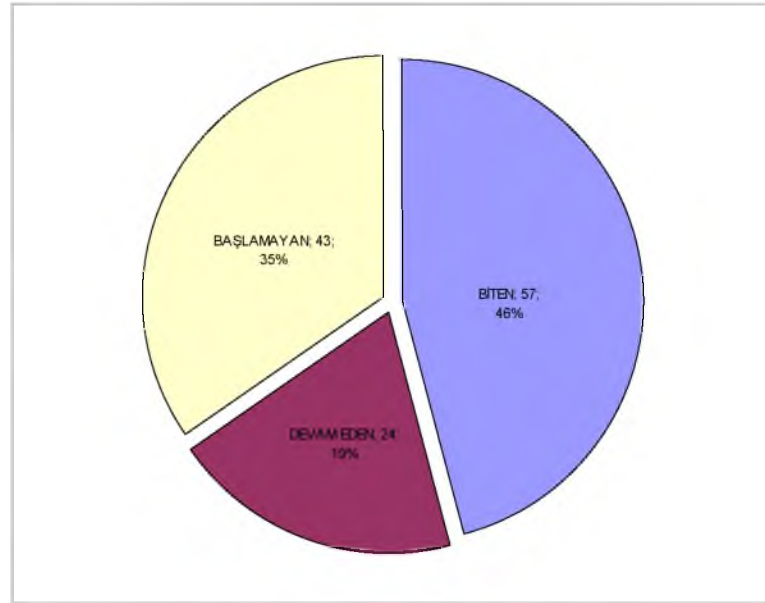

PROJE ÇALIŞMALARI

Köylerimizdeki atık suların toplanarak uzaklaştırılması ve arıtılarak alıcı ortama bırakılması amacıyla 2012 yılında toplam 98 ünitenin arazi ölçümü etüdü yapılarak hazırlanan projeler ilgili birimlere gönderilmiştir.

DİĞER FAALİYETLER

- Kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanmalar ve fosseptiklerin dolması sonucunda 65 köye Vidanjör gönderilerek yapılan çalışmalar sonucunda tesisler faal hale getirilmiştir.

2012 yılı içerisinde yapılan tüm yeni tesis ve tesis yenileme çalışmaları kapsamında 216.060 mt korige kanalizasyon borusu kullanılmıştır.

YIL SONU KANALİZASYON VE ATIKSU TESİSİ ENVANTERİ

ŞEBEKE HATTI BÜZLE YAPILAN		ŞEBEKE HATTI KORİGE BORU YAPILAN		KANALİZASYON VE ATIKSU TESİSİ YAPILAN TOPLAM	DOĞAL ARITMA TESİSİ YAPILAN	
KÖY	MEZRA	KÖY	MEZRA	ÜNİTE SAYISI	KÖY	MEZRA
159	3	422	37	621	224	7

* 2004 yılından itibaren şebeke hattında Korige boru kullanılmaya başlanmıştır.

* 2006 yılından itibaren doğal arıtma tesisi yapımına başlanmıştır.



PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI 14.12.2012 TARİH VE 20949 SAYILI GENEL SEKRETERLİK MAKAMININ YAZILARIYLA BİLDİRİLMİŞTİR. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YAZI DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMIŞ PERSONELE GÖREV DAĞILIMI YAPILMIŞTIR.

Görev Tanımı

- İhtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak ve yaptırmak,
- İl Özel İdaresince planlanmış inşaat ve onarım işlerini yürütmek,
- Yatırımlara ait ihale öncesi ve sonrası arazi ve proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,
- İl Özel İdaresine ait bina ve tesisler ile ödeneği Özel İdareye aktarılan Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve tadilatları ile ilgili her türlü inşaat işlerini gerçekleştirmek, proje, keşif, yaklaşık maliyetlerini hazırlamak ve hazırlattırmak, ihale ve muayene kabul komisyonlarını oluşturmak,
- Yapım işlerine ait gerek birimce ve gerekse Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü veya Bakanlıkların ilgili birimlerince hazırlanan ara ve kesin hak ediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih ve iş artışları, şartnameler, revize birim fiyatlara ilişkin belgeleri tetkik etmek, düzenlemek ve düzenlettirmek,
- Kesin hesabı düzenlemek, kesin kabulü yapmak (Tasfiye ve Fesih işlemleri dahil)
- Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatları hazırlamak,
- İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak ve yaptırmak,
- Müdürlüğe ait yatırım programını hazırlamak ve sonuçlarını izleyerek koordinasyon kurulu toplantılarına sunulacak cetvelleri hazırlamak,
- Müdürlüğün hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve raporları ilgili makamlara sunmak,
- Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak

Plan Proje Hizmetleri

- İhtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak,
- Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmalarını yapmak, inşaat yapılacak arsaların zemin etütlerini yapmak ve yaptırmak,
- Yatırım programı veya ihtiyaç programı kapsamında yeni yapım işlerinin yaklaşık maliyetini hazırlamak,
- Vaziyet planları ve röleve çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,
- Yatırım ve ihtiyaç program kapsamındaki inşaatların ruhsatlarının alınması ve takibini yapmak,
- Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.

Yapı Denetim Birimi:

- Denetimi verilen inşaat işlerinin sözleşme ve şartnamelere göre fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
- Ara ve kesin hakedişleri düzenlemek,
- Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatları hazırlamak,
- İhalesi yapılacak onarım işlerinin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak,
- Kesin hesabı yapmak,
- Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.

Kesin Hesap ve Takip Birimi :

- 5018 sayılı kanuna göre İl Özel İdaresinin yatırımlara ayrılan bütçesinin gerçekleştirme görevini yürütmek,
- Plan Proje ve Yapı Denetim Birimlerinin yaptığı ve yapacağı işlemleri takip etmek, mevzuat çerçevesinde yönlendirmek,
- İl Özel İdaresine ait bina ve tesisler ile ödeneği Özel İdareye aktarılan Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve tadilatları ile ilgili her türlü inşaat işlerinin ihale işlem dosyalarını incelemek, ödeneklerin takibi ve ihaleleri yaptırmak,
- İl Özel idaresi yatırım programında yer alan inşaat işleri ve ödeneği Özel İdareye aktarılan Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla, finansmanı Özel İdarece sağlanan kurumların yapım, onarım ve tadilatları ile ilgili yapılan hak edişlerin son kontrollerini yapmak,
- Koordinasyon kuruluna sunulacak cetveller ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak,
- Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hak ediş ve son kontrollerini yapmak,
- Yapım işlerine ait gerek birimce ve gerekse Çevre Şehircilik Müdürlüğü veya Bakanlıkların ilgili birimlerince hazırlanan ara ve kesin hakediş, geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih ve iş artışları, şartnameler, revize birim fiyatlarına ilişkin belgeleri tetkik etmek,
- Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yapmak.

EĞİTİM HİZMETLERİ

HİZMET TÜRÜ	ÖDENEK	HARCAMA	PARASAL GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
EĞİTİM HİZMETLERİ	68.382.858	25.407.248	37	54

Eğitim hizmetleri olarak 2012 yılı yatırım programında yer alan 234 adet projeden 127 adedi tamamlanmış, 75 adedi devam etmekte, 3 adedi ihale aşamasında olup 29 adet işe ise başlanılmamıştır.

EĞİTİM HİZMETLERİ		İLK ÖĞRETİM OKULLARI	ORTA ÖĞRETİM OKULLARI
YENİ YAPIM	Biten	9	2
	Devam Eden	14	5
	İhale Aşamasında	1	0
	Başlamayan	12	6
TOPLAM		36	13
ONARIM	Biten	73	22
	Devam Eden	0	0
	İhale Aşamasında	1	0
	Başlamayan	10	1
TOPLAM		84	23

EĞİTİM HİZMETLERİ		İLK ÖĞRETİM OKULLARI	ORTA ÖĞRETİM OKULLARI
İKMAL	Biten	3	0
	Devam Eden	0	1
	İhale Aşamasında	0	0
	Başlamayan	0	0
TOPLAM		3	1
DEPREM GÜÇL. PRJ.YAPIMI	Biten	10	8
	Devam Eden	53	2
	İhale Aşamasında	1	0
	Başlamayan	0	0
TOPLAM		64	10

Yıllara Göre Tamamlanan Projeler

İl Özel İdaresi 2010 yılında 70, 2011 yılında 97 , 2012 yılında ise 127 adet projeyi tamamlamış olup her geçen yıl tamamlanan proje sayısını artırarak çalışmalarına devam etmektedir.



Şekil 1

EĞİTİM HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI



Aşık Veysel İlköğretim okulu

Sivas Fen Lisesi İnşaatı

GürünKemal Özalper İ.Ö.O



218 Kişilik Yurt Binası



Hafik Anaokulu

2012 YILINDA İL ÖZEL İDARESİ OLARAK EĞİTİM ALANINDA DESTEK VERİLEN PROJELER

OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ kapsamında;

Merkez Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu,

Aşık Veysel İlköğretim Okulu,

Ahmet TÜRKSEVEN İlköğretim Okulu,

60.Yıl İlköğretim Okulu olmak üzere 4 adet İlköğretim okulunun çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır

4 Eylül İlköğretim Okulu,

Başöğretmen İlköğretim Okulu,

Mehmet Akif ERSOY İlköğretim Okulu,

Nizamettin SUNGUR İlköğretim Okulu,

Ziya GÖKALP İlköğretim Okulu olmak üzere 5 adet okulun çevre düzenlemesi işinin iki kez ihalesi yapılmış olup alıcı bulunamadığı için ihaleler iptal edilerek 2013 yılına bırakılmıştır.

Çalışmalar kapsamında okullara bir adet tenis kortu, boyama duvarı, açık hava spor aletleri, bahçe, santraç sahası, kamelyalar ve çiçek tarlaları yapılacaktır. İdareimiz tarafından çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 4 adet ilköğretim okulu için toplam 329 bin 260 TL harcama yapılmıştır.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASI GÖRÜNTÜLERİ



KIZ YİBO



AHMET TÜRKSEVEN İ.Ö.O.



ASIK VEYSEL İ.Ö.O.



EMNİYET HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI

HİZMET TÜRÜ	ÖDENEK	HARCAMA	PARASAL GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
EMNİYET HİZMETLERİ	7.877.598	2.249.884	29	77

2012 yılı yatırım programında yer alan 13 adet projeden 10 adet proje tamamlanmış, 2 adet proje devam etmekte olup, 1 adet proje ise ihale aşamasındadır.



Ulaş İlçe Emniyet Amirliği Binası Projesi



Sivas MOBESE Merkezi



Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu

SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI

HİZMET TÜRÜ	ÖDENEK	HARCAMA	PARASAL GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
SAGLIK HİZMETLERİ	7.274.560	5.527.867	76	75

2012 yılı yatırım programında yer alan 8 adet projeden 6 adedi tamamlanmış olup, 2 adet proje ise devam etmektedir.



SİVAS DEMİRYOLLARI HASTANESİ İNŞAATI ÇALIŞMALARI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

KÜLTÜR HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI

HİZMET TÜRÜ	ÖDENEK	HARCAMA	PARASAL GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
KÜLTÜR HİZMETLERİ	24.631.540	1.355.646	6	50

2012 yılı yatırım programında yer alan 13 adet projeden 5 adedi tamamlanmış, 2 adet proje devam etmekte, 2 adet proje ihale aşamasında olup 4 adet projeye ise başlanılmamıştır.

ATATÜRK KONGRE VE ETNOGRAFYA MÜZESİ ÇALIŞMALARI


PROJENİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	HARCAMA	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	PROJEDE GELİNEREN AŞAMA
Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik Sağlama ve Tesisat işleri yapımı proje hazırlama işi	2012	411.820	337.517	%100	projeleri tamamlanmıştır.
Kongre Müzesi iç dizaynı, teşhir ve tanzim projesi hazırlanması işi	2012	1.161.373			Kongre Müzesi iç dizaynı, teşhir ve tanzim projesi hazırlanması işi ihalesi: 21.01.2013 tarihinde yapılacaktır.
Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Restorasyonu yapımı işi	2012-2013	2.137.652			Kongre Müzesi iç dizaynı, teşhir ve tanzim projesi hazırlanması işi ihalesi 21.01.2013 tarihinde yapılacaktır.



Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi

YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİ ÇALIŞMALARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	HARCAMA	FİZİKİ GERÇ.%	PROJEDE GELİNEREN AŞAMA
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı,Nazım ve Uygulama İmar Planı proje hazırlama işi	2012	115.640	4.944	100	BİTTİ
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Uygulama inşaatı işi	2013	9.929.416			Kamulaştırma ve yol çalışmalarını müteakip tesislerin ihalesi yapılacaktır.

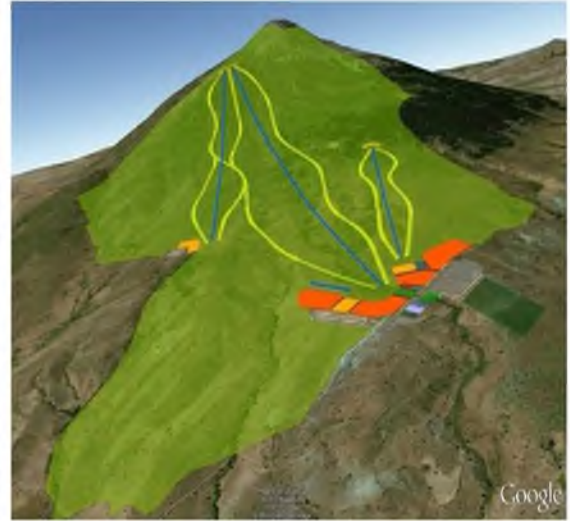

AŞIK VEYSEL MÜZESİ ÇALIŞMALARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	HARCAMA	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	PROJEDE GELİNEREN AŞAMA
Aşık Veyssel Müzesi Ek Bina Teşhir tanzim uygulama projesi	13.08.2012	167.549,00	188.800	%100	Şarkışla KHGB. den ihalesi yapılmış ve proje çalışmaları tamamlanmıştır.



Aşık Veysel Müzesi ek bina inşaat çalışması

ZİYABEY KÜTÜPHANESİ ÇALIŞMALARI



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖDENEĞİ İLE YAPILAN ÇALIŞMALARI

HİZMET TÜRÜ	ÖDENEK	HARCAMA	PARASAL GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖDENEKLİ HİZMETLER	3.797.930	339.893	9	20

2012 yılı yatırım programında yer alan 5 adet projeden 1 adedi tamamlanmış, 2 adet proje devam etmekte olup, 2 adet projeye ise başlanılmamıştır.



Zara İlçesi Hükümet
Konağı Projesi

ULAŞ HÜKÜMET KONAĞI YAPIMI ÇALIŞMALARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	HARCAMA	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	PROJEDE GELİNE N AŞAMA
ULAŞ HÜKÜMET KONAĞI YAPIMI İŞİ	07.02.2011	1.764.100	1.662.823	%100	BİTTİ
ZARA HÜKÜMET KONAĞI PROJE YAPIMI İŞİ	2012	118.000		%1	Devam Ediyor
ZARA HÜKÜMET KONAĞI YAPIMI İŞİ	2012	682.000		0	BAŞLAMADI



Ulaş İlçesi Hükümet Konağı İnşaatı Çalışmaları

112 ÇAGRI MERKEZİ PROJESİ YAPIMI ÇALIŞMALARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	HARCAMA	FİZİKİ GERÇEKLEŞME	PROJEDE GELİNE AŞAMA
112 ÇAGRI MERKEZİ PROJE ALIMI İŞİ	23.08.2012	48.305		%90	Proje çizim işi tamamlanmış olup, arsa ile ilgili belediye işlemleri devam ediyor
112 ÇAGRI MERKEZİ YAPIM İŞİ	2012	1.628.000			Projesi tamamlanıp yaklaşık maliyetin hazırlanmasına müteakip ihalesi yapılacaktır.



2012 yılı yatırım programında yer alan 4 adet projeden 3 adedi tamamlanmış, 1 adet proje devam etmektedir.


HİZMET TÜRÜ	ÖDENEK	HARCAMA	PARASAL GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
ÖZEL İDARE ÖDEĞİ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR	662.132	387.939	58	75



**Bina bakım onarım
çalışmaları**

SOSYAL HİZMETLER

İhramcızade Huzur Evi Onarımı Tamamlandı

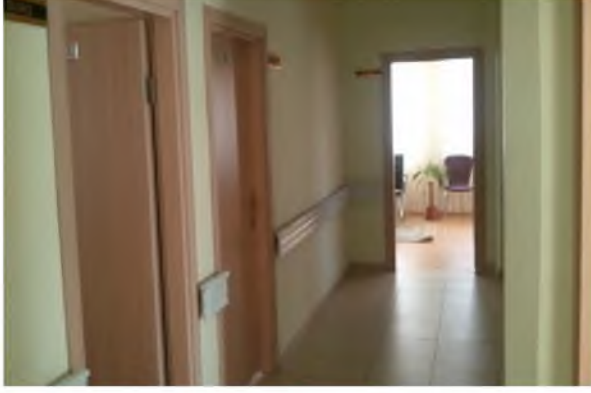

- Bunlara ilave olarak 2012 yılında müdürlüğümüze toplam 2731 adet resmi evrak gelmiş olup; hepsine işlem yapılmıştır.
- Müdürlüğümüzce 2012 yılında 223 adet doğrudan temin yoluyla ihale yapılmış olup toplam 886.734,53 TL harcama yapılmıştır.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI (GENEL)

HİZMET TÜRÜ	ÖDENEK	HARCAMA	PARASAL GERÇEKLEŞME %	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
YATIRIMLAR (GENEL)	112.870.311	36.159.666	32	57

HİZMET MÜDÜRLÜKLERİMİZ

İMAR VE KENTSEL İYİLESTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 04.03.2005 tarihine kadar belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda, imarla ilgili faaliyetler, Mülga Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerince yürütülmekte idi. Ancak, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6-b maddesi uyarınca, imar hizmetleri İl Özel İdaresine geçmiştir. İl Özel İdaresi Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yapı kullanma izni ve yapı ruhsatı düzenlenmesine ait işlemler de dahil olmak üzere, imarla ilgili; **İmar Planı Hizmetleri, İnşaat Ruhsatı ve Yapı Denetim Hizmetleri, Yapı Kullanma İzni, İl Çevre Düzeni Planı, KUDEB ve Kültür Hizmetleri, TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Hizmetleri, Emlak ve İstimlak Hizmetleri, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa İlişkin Hizmetler, 442 sayılı Köy Kanununa 3367 sayılı kanunla eklenen maddeler gereği Köy Gelişme Alanlarının Tefriki, 3853 Sayılı Bulgar Göçmenleri ile İlgili Arşiv Kayıtları** İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce yürütülmektedir.

MEVZİ İMAR-CİNS DEĞİŞİKLİĞİ- HİSSELİ SATIŞ

- Özel İdare görev alanı içerisinde yer alan işlerden 11 adet hali hazır harita, 12 adet ifraz, 19 adet tevhidten ifraz, 9 tevhid işlemleriyle ilgili toplam 51 adet arazi ve büro çalışmaları yapılmıştır.
- Ayrıca Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen köy yerleşik alan sınırları ve civarının tespiti ile ilgili 503 adet köyde yerleşim alan sınırı tespit çalışmaları yapılmış olup; bunlardan 236 köyün yerleşim alan sınırı İl Encümeninde Onaylanarak tamamlanmış, diğer 267 köyün ise büro çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşların talebi neticesinde gayrimenkullerden 81 adet cins değişikliği işlemleri ve 35 adet hisseli satış 83 adet İmar Durumuyla ilgili olmak üzere toplam 199 adet işlem yapılmıştır.

- Sivas İlinde 12 adet Köy Gelişme Alanı İmar Planı 8 adet mevzii imar planı ve 1 adet mevzii imar planı revizyonu yapılmıştır. Bunlar:

1adet Tarımsal İşletme, 2 adet HES, 1 adet Akaryakıt İstasyonu, , 1 adet köy yerleşim alan


İmar planı yapım kararı, 1 adet Konut amaçlı İmar Planı, 1 Jeotermal Tesisin İmar Planı Yıldızdağı Kış Turizm Alanı İmar Planı ve 1 adet İmar Planı Revizyonu yapılmıştır.



Zara Kümbet köyü yerleşim alanı İmar planı



Sivas İmranlı Kasaplar köy yerleşim alanı

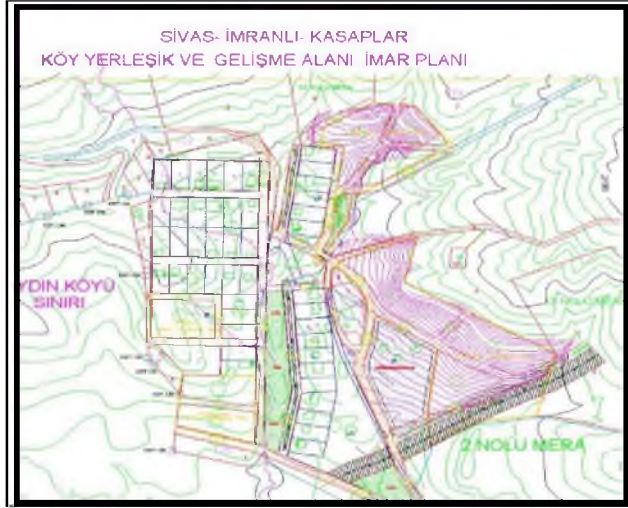

Sivas İmranlı Kasaplar köyü imar planı



Sivas İmranlı Kasaplar köy yerleşim ve gelişme alanı uydu görüntüsü



Zara Akyazı köyü
Köy yerleşik ve gelişim imar planı



Zara Akyazı köyü
köy yerleşim ve gelişim alanı uydu görüntüsü



İmranlı Boğazören köyü imar planı



İmranlı Boğazören köyü uydu görüntüsü

İNŞAAT RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ

- Köydeki yapılaşmaların fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılmaları sağlamak amacıyla 53 adet İnşaat Ruhsatı ve 29 adet yapı kullanma İzni verilmiştir. Bu ruhsatların 38 adeti ahır (besi çiftliği) olarak düzenlenmiştir. Verilen ruhsatlardan ruhsat hizmet bedeli olarak **TOPLAM: 162.960,90 TL** İl Özel İdaresi hesabına gelir olarak yatırılmıştır.
- Köylerde kanun gereği ruhsattan muaf olan vatandaşların yaptırmış oldukları konut inşaatlarından tamamlanan ve elektrik aboneliği için İdaremizden izin almak için talepte bulunan 850 adet dilekçeye cevap verilmiştir. Tüm il genelinde yaklaşık 760 adet inşaata iskana uygun cevabı verilmiştir. Yapı kontrol ve denetimler sonucu kaçak yapıldığı tespit edilen 53 adet kaçak yapının mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.
- Yapı kontrol ve denetimler sonucu 14 adet kaçak binanın mevzuata uygunluğu bulunmadığından İl Encümenince yıkımına karar verilmiştir. Bunlardan 2 adet bina sahibine yıktırılmıştır.
- 3194 Sayılı İmar Kanununa ve Plansız Alanlar Yönetmeliğine aykırı olarak yapılan 3 adet inşaata İl Encümen Kararı ile **TOPLAM: 10.500,00 TL** para cezası verilmiştir.

4753 TOPRAK VE TEVZİİ UYGULAMALARI

4753 sayılı kanun gereği evvelce dağıtılan arazilerle ilgili olarak mahkemelerce istenilen 89 adet müzekkereye cevap verilerek, istenilmiş olan kayıtlar çıkartılarak ilgili mahkemelere gönderilmiştir. Ayrıca aynı kanunla ilgili olarak, 40 adet şahıs kaydı, 39 adet isim tashihi, 10 adet şerh terkinin olmak üzere toplam 178 adet işlem yapılmıştır.

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Divriği Ulucamii ve Darüşşifasının Çevresinin Kamulaştırılması:

- Divriği Ulucamii ve Darüşşifasının çevre düzenlenmesi kapsamında; I.Etap yer alan 31 adet taşınmazın kamulaştırması yapılmış, 21 adet taşınmazın hukuki süreci devam etmektedir. II. Etapta yer alan 115 adet taşınmazın kamulaştırması yapılmış, 24 adet taşınmazın hukuki süreci devam etmektedir.
- II. etapta kamulaştırması tamamlanan 115 parselin (Toplam 200 ev ve müştemilatın) yıkımı gerçekleşmiştir.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Divriği Ulucamii ve Darüşşifasının çevre düzenlenmesi kapsamında toplam ödeneği: 12.400.000,00TL'dir. Bu ödenekten ve 11.357.839,00TL. kamulaştırma bedeli, 56.111,00 TL'si basın ilan ve ihale ilan gideri olmak üzere Toplam: 11.413.950,00 TL ödeneği harcanmış olup; 986.050,00 TL ödeneği kalmıştır. Hukuki sürecin sonuçlanacağı göz önüne alınarak 3.000.000,00 TL ek ödeneye ihtiyaç olacağı öngörülmüş olup; Kültür ve Turizm Bakanlığından ilave ödenek talebinde bulunulmuştur.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası çevresinin kamulaştırmadan önceki görüntüsü



Divriği Ulu Camii çevresinin kamulaştırma sonra yıkım çalışmalarından görüntüler





Divriği Ulu Camii Çevresi Yıkım Çalışmalarından Sonraki Hâlihazır Görüntüsü



Divriği Ulu Camii Çevresinin Kamulaştırması Tamamlandıktan Sonraki Görüntüsü



Diğer Kamulaştırmalar;

- Kanuni İlköğretim Okulu ve Danişment İlköğretim Okulunun kamulaştırma çalışmalarına devam edilmektedir.
- İkizler Konağı'nın kamulaştırma işlemlerine başlandı.
- Aşık Veysel Müzesi'nin kamulaştırma işlemlerine devam edilmektedir.
- Havaalanı elektrik hattı kamulaştırma işlemlerine devam edilmektedir.

KUDEB VE KÜLTÜR HİZMETLERİ KAPSAMINDA; TARİHİ YAPILARIN RESTORASYONU

1. Ahmet Kemal Köksal Vakfına ait Sivas il merkezinde yer alan konağın onarımı.



2. Şarkışla ilçe merkezinde yer alan Şemsi Efendi Konağının onarımı



3. Sivas merkezde yer alan Buruciye Medresesinin onarımı



4. Divriği Kutlu Özen Evi onarım



5. Divriği ilçe merkezinde yer alan Şeyhoğlu Konağı onarımı



6. Divriği ilçe merkezinde yer alan Sancaktar Konağı onarımı



7. Mühürdarzade Konağının onarım çalışmasından önceki ve onarım çalışması fotoğrafları



8. Divriği ilçe merkezinde yer alan Demiralay Konağının onarım çalışmasından önceki ve onarım çalışması fotoğrafları.



- 2012 yılında Divriği Kentsel sit alanı içerisinde yer alan ve restorasyonu devam eden Mühürdarzade, Demiralay, Şeyhoğlu ve Sancaktar Konakları 2013 yılı içerisinde onarımı tamamlanarak İlçenin turizme yönelik konaklama sorununu çözmek amacıyla değerlendirilebilecektir.
- 2012 yılı içerisinde restorasyonları tamamlanan Şarkışla Şemsi Efendi Konağı hizmete sunulmuştur. Sivas merkezde bulunan Buruciye Medresesinin çatı örtüsü kurşunları ve eyvanların içerisinde basit onarımları yapılmıştır.
- 2012 yılı içerisinde 9 adet basit onarım ön izin belgesi düzenlenmiş yapılan onarımlar büromuz tarafından denetlenmiştir.
- 2012 yılı içerisinde KUDEB Ekipleri tarafından ilçelerde yapılan rutin kontrollerde taşınmaz kültür varlıkları ve bunların koruma alanlarında ilke kararları ve koruma kurulu kararlarına aykırı ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar tespit edilmiştir. Bunlar arasında; Divriği Ninni Kaler, Divriği Kültür ve Sosyal Tesisler, Divriği Ahmet Cengiz Evi, Divriği Ulu Camii Koruma Alanı Büfe İnşaatı, Konak Restoran, Divriği Birlik, Ali Şimşek, Yakup ve Ömer Arslanburç tarafından yapılan izinsiz uygulamalar KUDEB tarafından durdurularak Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kuruluna bildirilmiştir.

2012 yılı Katkı Payları Ödenekleri

- İl Valimiz başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından aşağıdaki projelere ödenek verilmesi uygun bulunmuştur.
- Gürün Kilisesi projelerinin yapım işi için 70.000,00 TL,
- Selçuk Anadolu Lisesinin çevre düzenlemesi uygulama yardımı işi için 45.000,00 TL ödenek verilmiş olup; inşaatı ödeneği kadar imalat yapılmıştır.
- Ulaş İlçesi, Baharözü Topakkaya Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Planı yapım işi için 19.000,00 TL,
- Divriği İlçesi Arasta Bölge Sokak Sağlıklaştırma projesi için 159.600,00 TL,
- Şarkışla Mirza Mercan Konağı proje işi için 15.000,00 TL ödenek sağlanmıştır.



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2012 yılı içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde toplam 178 adet ihale ilana çıkmış olup; bu işlerin 4 adedi kısmi teklife açıktır.

- 2012 yılı içinde Destek Hizmetleri Biriminde toplam 178 adet ihale yapılmıştır.
- Yapılan İhalelerin 139 adedi sonuçlanmıştır.
- 2 adedi sözleşme aşamasındadır.
- İhalesi devam eden işler 1 adettir.
- İhalesi yapılacak olan işler ise 6 adettir.
- Bu ihalelerden 37 adedi çeşitli nedenlerle iptal edilmiştir.

Yapılan ihalelerin toplam sözleşme bedelleri : **45.369.906,71 TL.** dir. (KDV Hariç)



Destek Hizmetleri Müdürlüğü Doğrudan Temin İşleri:

4734-22/d maddesi kapsamında 2012 yılı içerisinde toplam 1284 adet harcama yapılmış ve bu harcamaların toplamı **4.110.302,21 TL.** dir.

- Destek Hizmetleri Müdürlüğü 520 adet 2.122.396,16 TL.
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 797 adet 1.779.802,44 TL.
- Özel Kalem Müdürlüğü 106 adet 208.103,61 TL.dir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü harcama kaleminden 2012 yılı içerisinde yakacak alımları ve telefon abonelik ve kullanım ücretleri ile diğer harcama tutarlarının toplam miktarı 419.802,08 TL. dir.

Sivas Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. İşleri:

Özel kalem Müdürlüğünün temsil, tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. giderleri kaleminden 2012 yılı içerisinde toplam 68 adet harcama yapılmış ve bu harcamaların toplam tutarı **206.433,86 TL.** dir.

İŞİN ADI	2012 YILINDA YAPILAN	TUTARI
İHALE	178	45.369.906,71
DOĞRUDAN TEMİN	1423	4.110.302,21
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	520	2.122.396,16
İşletme İştirakler Müdürlüğü	797	1.779.802,44
Sivas Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü	106	208.103,61
TOPLAM	1601	49.480.208,92

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
2012 YILI DOĞRUDAN TEMİN İLE ALIM (4734 / 22-d)

BİRİM ADI	YAPILAN İŞ SAYISI	TUTARI (KDV Dahil)
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	18	60.750,52
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	84	269.118,50
GENEL SEKRETERLİK	52	209.047,43
İNSAN KAY.ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	17	35.897,91
İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	797	1.779.802,44
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	2	1.144,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	7	3.013,10
SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29	211.179,11
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	10	18.120,14
PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	185	844.884,19
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11	6.533,75
YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	77	379.272,07
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1	4.668,18
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	11	41.090,95
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	16	37.676,31

Bakanlık Bütçesi ve Diğer Kurumlar

BİRİM ADI	YAPILAN İŞ SAYISI	TUTARI (KDV Dahil)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	106	208.103,61

BİRİM ADI	YAPILAN İŞ SAYISI	TUTARI (KDV Dahil)
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	9	80.425,37

BİRİM ADI	YAPILAN İŞ SAYISI	TUTARI (KDV Dahil)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	124	517.126,76

BİRİM ADI	YAPILAN İŞ SAYISI	TUTARI (KDV Dahil)
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	6	47.015,92

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
2012 YILI DEVLET MALZEME OFİSİNDEN ALIM Ve
50. YIL YETİŞTİRME YURDU DÖNER SERMAYE İŞL. MÜD.
(4734 - 3/e)

BİRİM ADI	YAPILAN İŞ SAYISI	TUTARI (KDV Dahil)
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	7	400.164,11
GENEL SEKRETERLİK	2	126.252,44
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	38.062,79
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	411.835,00
SİVAS AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	1	271.815,55

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Alımlar

İHALE ŞEKLİ	3-i madde	19. madde	20. madde	21 - f madde	22 a-b madde	22 - c madde	22 - d madde	Sözleşme Bedeli
2009	66.988,64	15.412.885,69	-	-	6.609,93	35.430,75	1.933.355,32	15.479.874,33
2010	-	39.653.452,14	-	-	5.200,00	2.318,92	2.504.343,88	39.653.452,14
2011	-	29.145.464,05	-	80.000	56.220,22	55.856,24	2.701.478,58	29.225.464,05
2012	398.670,00	44.971.236,71	-	-	221.656,34	160.069,53	3.728.576,34	45.369.906,71
TOPLAM	465.658,64	129.183.038,59	-	80.000	289.686,49	253.675,44	10.867.754,12	129.728.697,23

TERÖR BİLGİ NOTU

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılansması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca;

Komisyon Başkanlığına 337 adet müracaat yapılmış, İlgisi nedeniyle 118 adedi başka illere gönderilmiştir. İlimiz sınırları içerisinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak dilekçe sayısı 219 adettir.

66 adedi için tazminat ödenmesi kararlaştırılarak, 1.015.534,00 TL. ilgililere ödenmiştir.

153 adet dilekçe sahibinin talebi ise yasa kapsamına girmemesi veya değişik nedenlerle reddedilmiştir.

17/07/2004 kanunun yayımlandığı tarihten bugüne kadar 9 adet dava açılmıştır. 5 adedi Komisyonumuz lehimize sonuçlanmış, 4 adet dava ise henüz sonuçlanmamıştır.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI İÇERİSİNDE VERİLEN RUHSATLAR;

RUHSAT ADI	2012 YILINDA VERİLEN RUHSAT SAYISI (Adet)
I(a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı	6
Hammadde Üretim İzni	65
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Gayri Sıhhi Müessese)	76
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Sıhhi Müessese)	2
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı	4
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı	1
TOPLAM	154

2012 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLER

I(a) GRUBU MADENLER KİRALAMA BEDELİ	Tahakkuk (TL)	527.142,41		
	Tahsil (TL)	67.150,00 (Taksitlendirilen miktar Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bildirilmiştir.)		
RUHSAT HARCİ	Gayri Sıhhi Müesseseler (TL)	148.020,00		
	Jeotermal Kaynaklar (TL)	8.730,00		
KESİLEN CEZALAR	I(a) Grubu Madenler (20 Adet)	169.450,62	TAHSİL EDİLEN	40.311,15
			TAHSİL EDİLEMEYEN	129.139,47
	Taş Ocakları (6 Adet)	15.731,10	TAHSİL EDİLEN	2.475,00
			TAHSİL EDİLEMEYEN	13.256,10
	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları(5 Adet)	4.144,00	TAHSİL EDİLEN	2.072,00
			TAHSİL EDİLEMEYEN	2.072,00
SEVK FİŞİ	Satılan (TL) (716 Adet)	7.160,00		
2012 Yılı İçin Madenlerden yatan Devlet Hakkı Özel İdare Payları Toplamı		1.907.173,15		

2012 YILINDA YAPILAN DENETİMLER VE KESİLEN CEZALAR;

2012 YILINDA YAPILAN DENETİM VE CEZALAR	
DENETİM SAYISI	372
YAPILAN DENETİMLERDE KESİLEN CEZA SAYISI	31

2012 YILI GİDERLERİ

İLAN GİDERLERİ (TL)	3.871,92
YOLLUKLAR (TL)	10.285,51
TOPLAM	14.157,43

HUKUK MÜSAVİRLİĞİ

2012 FAALİYETLERİ

DERDEST	335	Devam eden Dava ve İcra Dosyası
TEMYİZ	60	
KARAR	77	
LEHE KARAR	58	İdaremiz lehine sonuçlanan
KISMEN KABUL KISMEN RED	7	
ALEYHE KARAR	12	İdaremiz aleyhine sonuçlanan

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ				
Kurumsal	Finans	Ayrıntı Adı	Toplam Ö.	Harcanan
44.58.01.24.00	5	İdari mahkeme hizmetleri	3.000,00	695,25
44.58.01.24.00	5	İdari mahkeme hizmetleri	273.404,27	73.404,27
		TOPLAM	276.404,27	74.099,52

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet Konuları:

- ✓ Coğrafi Bilgi Sistemi
- ✓ Bilgi İşlem,
- ✓ e-İşleri,
- ✓ Stratejik Plan, Performans Programı , Yatırım Programı ve Faaliyet Raporu hazırlanması,
- ✓ İzleme-Değerlendirme, İstatistiki Bilgi ve Rapor Hazırlama,
- ✓ Envanter Çalışmaları,
- ✓ KÖYDES Koordinatörlüğü
- ✓ Brifing, Sunum, Dergi ve Tasarım Çalışmaları



- ✓ Kurumumuzun e-devlet kapsamındaki iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, bilgisayar bakım ve onarımlarının yapılması sağlanmıştır.
- ✓ Kurumumuzun birimleri ve ek hizmet binası arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulumu yapılarak, ağ sisteminde oluşan arızalar giderilmiş ve sistemin çalışır durumda tutulması sağlanmıştır.

- ✓ Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programların kurulumları yapılmıştır.
- ✓ www.sivasilözelidaresi.gov.tr adresli sitemizde meclis kararları, gündem, encümen kararları, İl Özel İdaresi faaliyet raporlarının yayınlanması, ihale ve günlük duyuruları olmak üzere 2012 yılı içerisinde 689 adet dijital veri girişinin yapılması sağlanmıştır.
- ✓ İdaremiz web sitesine 2012 yılı içerisinde 240 adet e-posta gelmiş olup, e-postalar ilgili birim müdürlüklerine iletilmiş, ya da müdürlüğümüzce cevaplanmıştır.
- ✓ Toplu mesajlaşma hizmeti kullanılarak 2012 yılı içerisinde 93 adet (cenaze, bayram vb.) mesaj gönderilerek kurum personelimiz bilgilendirilmiştir.

PLAN,PROGRAM ve RAPOR HAZIRLANMASI

- ✓ 2012 yılı Performans Programı,
- ✓ 2013 yılı Yatırım Programı,
- ✓ 2011 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

ENVANTER ÇALIŞMALARI

- ✓ İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından istenilen kurumumuz kırsal altyapı çalışmalarını içeren 2012 yıl sonu envanter tabloları hazırlanarak gönderilmiştir.
- ✓ Köy İç Yolları Köy Yolu Ağına dahil edilmiştir.
- ✓ Tüm yerleşim birimlerindeki içme suyu tesislerinin sistem debisi envanter kayıtlarına girilmiştir.
- ✓ Kanalizasyonu olan yerleşim birimlerinin atık su miktarları envanter kayıtlarına dahil edilmiştir.

e-İçişleri Çalışmaları

- ✓ e-Devlet projesi kapsamında iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi sağlanmıştır,
- ✓ Personelin e-İçişleri sisteminde işlemlerini elektronik imza ile gerçekleştirmeleri için Akıllı Kart kurulumları yapılmıştır,
- ✓ e-İçişleri kapsamında kullanıcılara gerektiğinde yerinde yardımcı olunarak, oluşan aksaklıklar giderilmiştir.

Brifing ve Sunum Hazırlanması

- ✓ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı için 4 adet kurumumuza ait sunum hazırlanmıştır.
- ✓ Valilik makamına sunulmak üzere kurumumuza ait 2 adet brifing dosyası ve 1 adet sunum hazırlanmıştır.
- ✓ İl Genel Meclisi toplantısı için kurumumuzun 2012 yılı çalışmalarının anlatıldığı genel bir sunum hazırlanmıştır.

- ✓ Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı (İKİS) İl koordinasyon ve izleme bilgi sistemi veri girişleri yapılmıştır. (4 defa)
- ✓ Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yerel bilgi sistemine veri girişleri yapılmıştır. (4 defa)
- ✓ Kurumumuzun 2012 yılı yatırım programı ve uygulamalarının yer aldığı aylık faaliyet raporları her ay Genel Sekreterlik Makamına sunulmuştur.

Grafik & Tasarım Faaliyetleri

Dergi, Afiş , Sunu, iç yayınların kapakları, Logo, bloknot, kimlik kartları, teşekkür ve sertifika, davetiye ve bayrak tebrik kartları, Valilik için yapılan tasarımlar olmak üzere 154 adet tasarım yapılmıştır.

S.No	İşin Adı	Adedi
1.	Özel İdare Haber Dergisi	3 Sayı
2.	Özel İdare web sayfası tasarımı	1
3.	Özel İdare sunu kapak ve arka plan tasarımları	77
4.	Özel İdare iç yayınları kapak tasarımları	8
5.	Afiş, Logo, kartvizit, bloknot, kimlik kartı tasarımları	7
6.	Ek bina ışıklı tabela tasarımı	1
7.	Teşekkür ve Sertifika tasarımı ve baskısı	17
8.	İftar Davetiye ve Bayram Tebrik kartları tasarımı	4
9.	Sivas Valiliği web sayfası ve AB Bürosu için tasarımlar	4
10.	Sivas Valiliği 4 Eylül etkinlikleri İstiklal Gazetesi tasarım	18 Sayfa

COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

- ✓ Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi kapsamında gerekli teknik araştırma yapılmış, C.Ü. Harita Mühendisliği Bölümünden KHGB aracılığıyla danışmanlık hizmeti satın alınmıştır.
- ✓ Sivas İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İdareimiz arasında düzenlenen protokol ile Sivas'a ait uydu görüntüleri temin edilmiştir.
- ✓ Coğrafi Bilgi Sistemi Projesinin teknik şartnamesi hazırlanarak Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine ihalesi yapılmak üzere gönderilmiştir.

KÖYDES ÇALIŞMALARI

2012 YILI KÖYDES YATIRIM PROJELERİ

İlimize 2012 yılında Köylerin Altyapısını Destekleme (KÖYDES) projeleri kapsamında, 2012/3 nolu YPK kararı ile 11.363.000,00 ödenek tahsis edilmiştir.

Bu ödenek kapsamında kırsal altyapı olarak 110 adet köy yolları, 165 adet içme suyu, projesi planlanmış ve il tahsisat komisyonu tarafından 30.04.2012 tarihinde karar altına alınmıştır.

KÖYDES projeleri kapsamında ilimize tahsis edilen 11.363.000,00 TL'nin 31.12.2012 tarihi itibarıyla program değişiklikleri sonucunda köy yollarına ayrılan ödenek 7.202.295,00 TL dir. Bu kapsamda içme suları ödeneği 2.311.671,00 TL, olarak neticelenmiştir.

2012 yılı ortak alım dağılımı ise 31.12.2012 tarihi itibarıyla 144.584,00 TL KHGB'leri yönetim giderleri, 328.820,00TL boru alımı, 583.101,00 TL asfalt alımı, 290.610,00TL akaryakıt alımı, 200.000,00TL sayısal harita çalışmaları, 193.501,00 TL trafik işaret ve levhaları alımı, 108.418,00 TL ise müşavirlik hizmetleri olarak ayrılmıştır.

KÖYDES Eylül ayı değerlendirme toplantısı İlimiz Valisi Zübeyir KEMELEK'in Başkanlığında gerçekleştirildi. İl Encümen Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Zübeyir KEMELEK'in yanı sıra Vali Yardımcısı Vefa KAYA, KÖYDES Koordinatörü Vali Yardımcısı Salih AYHAN, ilçe kaymakamları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ve ORAN il temsilcisi katılmıştır.



KÖYDES EYLÜL AYI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Köylerin altyapılarını destekleme projeleri kapsamında ilimizde 2012 yılında, program değişiklikleri ve ek programlar neticesinde köy yolları sektöründe 155 km stabilize kaplama, 38 km I. kat asfalt kaplama, 29 km II. kat asfalt kaplama, 55.466 m2 kilitli parke taşı döşenmesi ve 38 adet sanat yapıları projesi tamamlanmış olup 6.681.647,00 TL harcanmıştır. Bu alanda 6 adet projemiz devam etmektedir.



ULAŞ İLÇESİ KAYAPINAR KÖYÜ ASFALT ÇALIŞMASI



YILDIZELİ İLÇESİ ÇOBANSARAY KÖYÜ KİLİTLİ PARKE ÇALIŞMASI

2012 yılı KÖYDES ortak alım olarak, 328.820,00TL ile boru alımı 510.501,00 TL ile asfalt alımı, 290.610,00TL TL ,ile akaryakıt alımı ve 193.501,00 TL lik trafik işaret ve levhaları alımı ve 109.697,00 TL KHGB'leri yönetim giderleri ve müşavirlik harcaması gerçekleştirilmiştir. 31.12.2012 tarihi itibariyle teknik kontrollük hizmetlerinde ise 108.418,00 TL harcama yapılmıştır.



TRAFİK İŞARET VE LEHVA ÇALIŞMASI



İçme suları projelerinde ise 102 adet iş tamamlanmış olup harcanan ödenek miktarı 1.631.753,00 TL' dir. Bu kapsamda 62 adet proje devam etmekte olup 25.465 kişi biten projelerden faydalanmışlardır.



MERKEZ İLÇE BAŞSÖĞÜT KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ

Sonuç olarak ilimize tahsis edilen 2012 yılı ödeneği olan 11.363.000,00 TL'den 9.912.237,00 TL harcama yapılmıştır.

31.12.2012 tarihi itibarıyla ek program ile program değişiklikleri neticesinde uygulama ve harcama grafiği aşağıda gösterilmiştir.

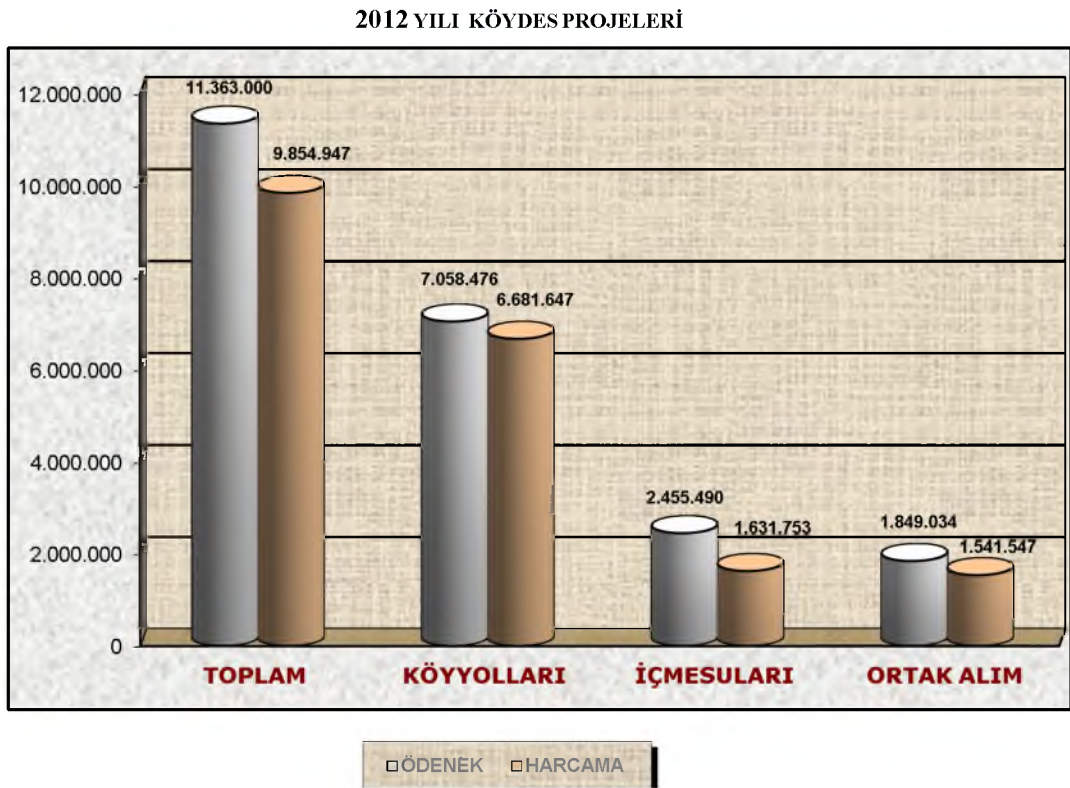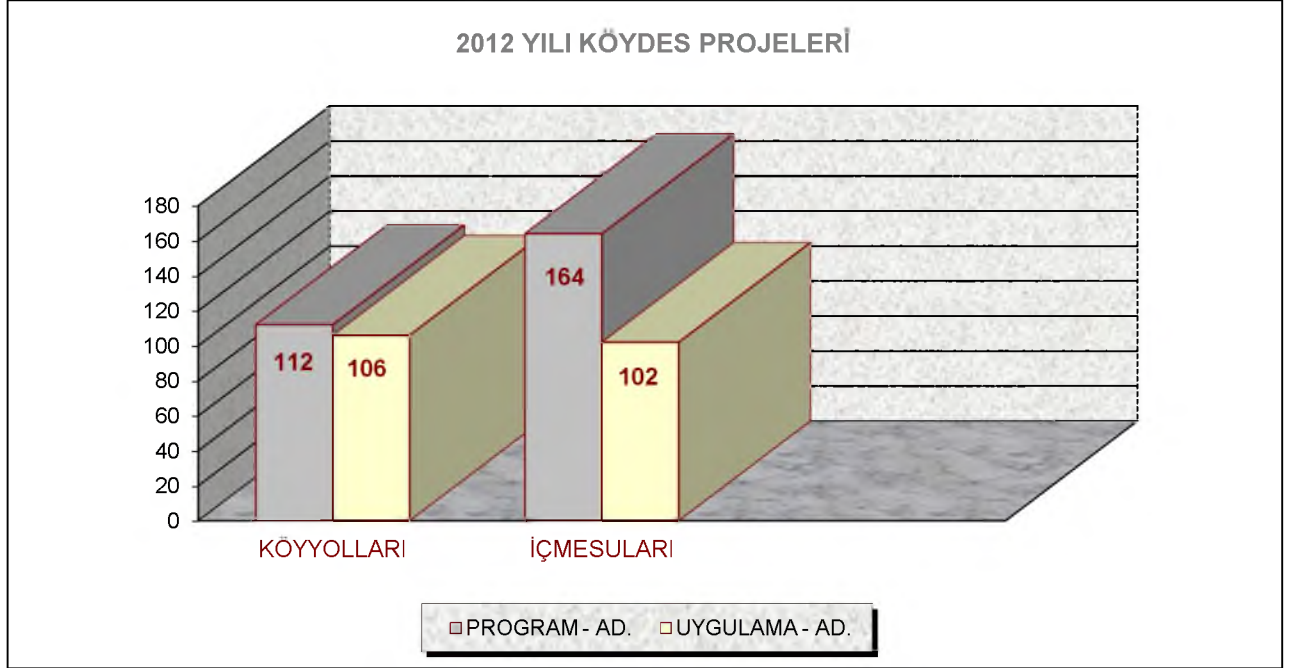

KÖYDES 2012 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ - 31.12.2012						TL	
S i V A S	İŞLERİN NİTELİĞİ		SENE BAŞI ÖDENEĞİ	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU	GÖNDERİLEN ÖDENEK	YAPILAN HARCAMA	KALAN ÖDENEK
	İÇMESUYU		2.455.490	2.311.671	2.455.490	1.631.753	823.737
	YOL		7.058.476	7.202.295	7.058.476	6.681.647	376.829
	ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERLERİ	95.574	95.574	95.574	82.737	12.837
		MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	49.010	49.010	49.010	26.960	22.050
		BORU ALIMI	350.000	328.820	328.820	328.820	0
		ASFALT	0	583.101	583.101	510.501	72.600
		AKARYAKIT	804.450	290.610	290.610	290.610	0
		SAYISAL HARİTA	200.000	200.000	200.000	0	200.000
		TRAFİK İŞARETLERİ	200.000	193.501	193.501	193.501	0
		TEKNİK KONTROLLÜK	150.000	108.418	108.418	108.418	0
	TOPLAM		11.363.000	11.363.000	11.363.000	9.854.947	1.508.053

III - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A - Üstünlükler

B - Zayıflıklar

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER

A - Öneriler

B - Tedbirler

III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

- İl Yönetiminin (Vali)desteği
- Karar alma ve icra yetkisi
- Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması
- İl de üniversitenin bulunması ve öğrenci nüfusu
- İl Özel İdaresinin eğitim ve öğretime desteği
- İl Özel İdaresince desteklenen mobil sağlık hizmetlerinin başarı ile yürütülmesi
- Sivas halkının yardımsever oluşu
- Zengin tarihi, kültür ve tabiat varlıkları
- Sedef hastalığının tedavi edildiği Kangal Balıklı Kaplıcasının varlığı
- Sivas İlinin ağaçlandırma bakımından pilot il seçilmesinin hükümet düzeyinde desteklenmesi
- Endemik bitki ve hayvan varlığı
- Hayvancılık potansiyelinin ve yem bitkileri üretimi için elverişli tarım alanlarının tarımsal sanayi için uygun ortam hazırlaması
- Büyükbaş hayvan sayısının fazla olması
- Kırsal Altyapıya yönelik yatırımlara KÖYDES Projesi ile büyük destek sağlanması
- Kamusal altyapı yatırımları için gerekli yeterli makine ve ekipmana sahip olunması

B-ZAYIFLIKLAR

- İl coğrafyasının geniş olması, yerleşim yeri sayısının fazlalığı, buna karşın nüfus yoğunluğunun az olması
- Eğitim ve sağlıkta kalitenin düşüklüğü
- Okul öncesi eğitimde istenilen orana ulaşamaması
- Kış mevsiminin uzun ve ağır geçmesi
- Halkın yeterli çevre bilincine sahip olmaması
- Kirli hava tabakasının çanak şeklindeki topoğrafik yapı nedeni ile kolay dağılmaması

- Orman varlığının yetersizliği
- İklim ve coğrafi yapının üretim ve ürün çeşitliliğini kısıtlaması
- Ürün deseninin basit olması ve sektörel çeşitlenmenin görülmemesi
- Topoğrafik yapının çok engebeli olması nedeni ile yol güzergahlarında heyelan, akma, kayma gibi kitle hareketlerinin meydana gelmesi
- Su erozyonunun fazlalığı
- Arazinin büyük bir kısmında hakim olan jipslerde gözlenen erimeler ve çökmeler yeryüzü şekillerinin süratle değişmesine neden olmakta bu da yapılan hizmetleri olumsuz yönde etkilemektedir.
- Kültür varlıklarının yeterince tanıtılamaması.

IV- ÖNERİ VE TEDBİRLER

A- ÖNERİLER

- T.B.M.M gündeminde bulunan İl Özel İdareleri ve Belediye Gelir Kanunu taslağının çıkarılarak verilen görev, yetki ve sorumluluklar doğrultusunda gelir yönüyle desteklenmesi.
- Sürekli değişen mevzuat karşısında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yetkili kişiler tarafından personelin hizmet içi eğitime tabii tutulması ve bakanlıkça hizmet içi eğitimlerin organize edilmesi.

A- TEDBİRLER

- Stratejik Plana uygun bütçe hazırlanarak , kurumların plan doğrultusunda hareket etmeleri sağlanacaktır.
- Stratejik plandaki hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır.
- Sektörel amaçlara ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir.
- Kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecek, kamusal kaynaklar İl'in önceliklerine ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi için kullanılacaktır.
- Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır.
- Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır.

V- GÜVENCE BEYANLARI

- Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı**
- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı**
- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı**

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Sivas .../02/2013

İl Özel İdare Üst Yöneticisi


Zübeyir KEMELEK

Sivas Valisi

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;


Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Sivas02/2013


Asım YÜCEKAYA
Bilgi İşl.Müd.


Ahmet YİĞİT
Destek Hiz.Müd.



Yasemin Durgun
Hukuk Müş.



Emrullah TOPRAK
İmar ve Kent.İyi.Müd.


İsmail BİYİK
İns.Kay.ve Eği.Hiz.Müd.



Sami TOKMAK
İşl.ve İst.Müd.



İsmail BİYİK
Kül.ve Sos.İşl.Müd.


Göksel YERLİKAYA
Pln.Pro.Yat.ve İnş.Müd.


Erdoğan ALTINKÜPE
Ruh.Den.Müd.



Özcan DUMAN
Su ve Kan.Hiz.Müd.



Fahri KESKİN
Tarım Hiz. Müd.


Cengiz SARUHAN
Yazı İşl.Müd.


İsmail GÜNER
Yol.ve Ulaş.Hiz.Müd.


Alpaslan CEYHAN
Genel sek.Yard.


Mevlüt SOYSAL
Genel Sek.Yard.


Salih AYHAN
Genel Sekreter

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “II-A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Sivas02/2013

İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Birim Yöneticisi


Ülke ÇELİK
Mali Hizmetler Müdürü



SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Akdeğirmen Mah. M. Akif Ersoy Cad. 58040
Telefon: 0(346) 223 01 16 Faks: 0(346)224 79 80
SİVAS
